

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	29 sep D
1		Plan de trabajo monto mínimo	20 días	mar 01-10-24	lun 28-10-24			
2		Análisis y diseño de los cambios a realizar	1 día	mar 01-10-24	mar 01-10-24			
3		BOF	3 días	mié 02-10-24	vie 04-10-24			
4		Agregar campo Setup a la tabla P_MONTO_MINIMO	1 día	mié 02-10-24	mié 02-10-24	2		
5		Quitar filtro en listado del monitor de pedidos por anulación por monto mínimo	2 días	jue 03-10-24	vie 04-10-24	4		
6		PDA	12 días	lun 07-10-24	mar 22-10-24			
7		Agregar campo Setup a la tabla P_MONTO_MINIMO	4 horas	lun 07-10-24	lun 07-10-24	5		
8		Modificar proceso de importación de datos	4 horas	lun 07-10-24	lun 07-10-24	7		
9		Modificar funcionalidad de monto mínimo	11 días	mar 08-10-24	mar 22-10-24			
10		Cuando la configuración de monto mínimo sea Warning, solo dar mensaje de advertencia, pedido debe guardarse y	3 días	mar 08-10-24	jue 10-10-24	8		
11		Cuando la configuración de monto mínimo sea Bloqueado, el pedido no	2 días	vie 11-10-24	lun 14-10-24	10		
12		Quitar funcionalidad de pedido anulado en el fin de día	2 días	mar 15-10-24	mié 16-10-24	11		

Proyecto: PDT_Monto_Minimo_
Fecha: mié 18-09-24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso


Progreso manual





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	29 sep D
13			Quitar funcionalidad de sumatoria de pedidos al finalizar un pedido	2 días	jue 17-10-24	vie 18-10-24	12		
14			Quitar campos que indiquen que un pedido esté anulado por monto mínimo	1 día	lun 21-10-24	lun 21-10-24	13		
15			Modificar proceso de envío de datos	1 día	mar 22-10-24	mar 22-10-24	14		
16			Pruebas	4 días	mié 23-10-24	lun 28-10-24			
17			Generar script de pruebas integrales	4 horas	mié 23-10-24	mié 23-10-24	15		
18			Pruebas en BOF	1 día	mié 23-10-24	jue 24-10-24	17		
19			Pruebas en PDA	2 días	jue 24-10-24	lun 28-10-24	18		
20			Generar release notes	1 hora	lun 28-10-24	lun 28-10-24	19		
21			Generar publicables	2 horas	lun 28-10-24	lun 28-10-24	20		
22			Publicar	1 hora	lun 28-10-24	lun 28-10-24	21		

Proyecto: PDT_Monto_Minimo_
Fecha: mié 18-09-24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

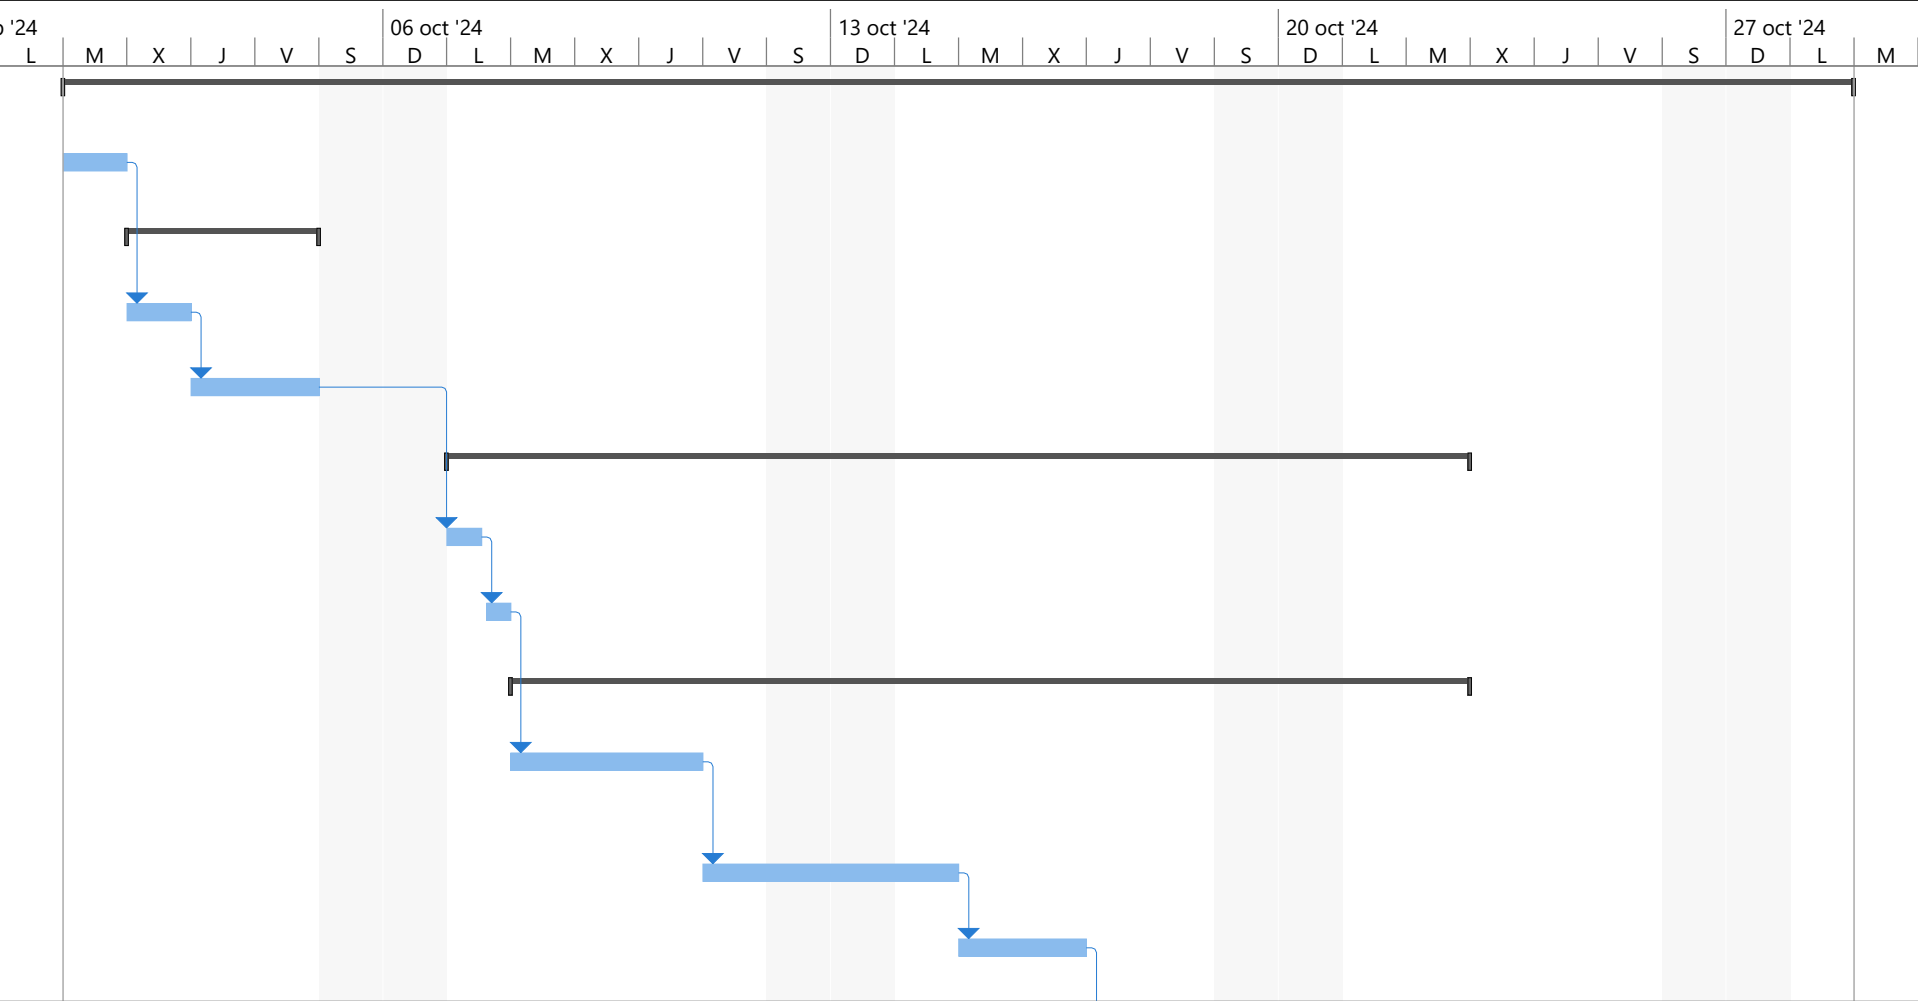

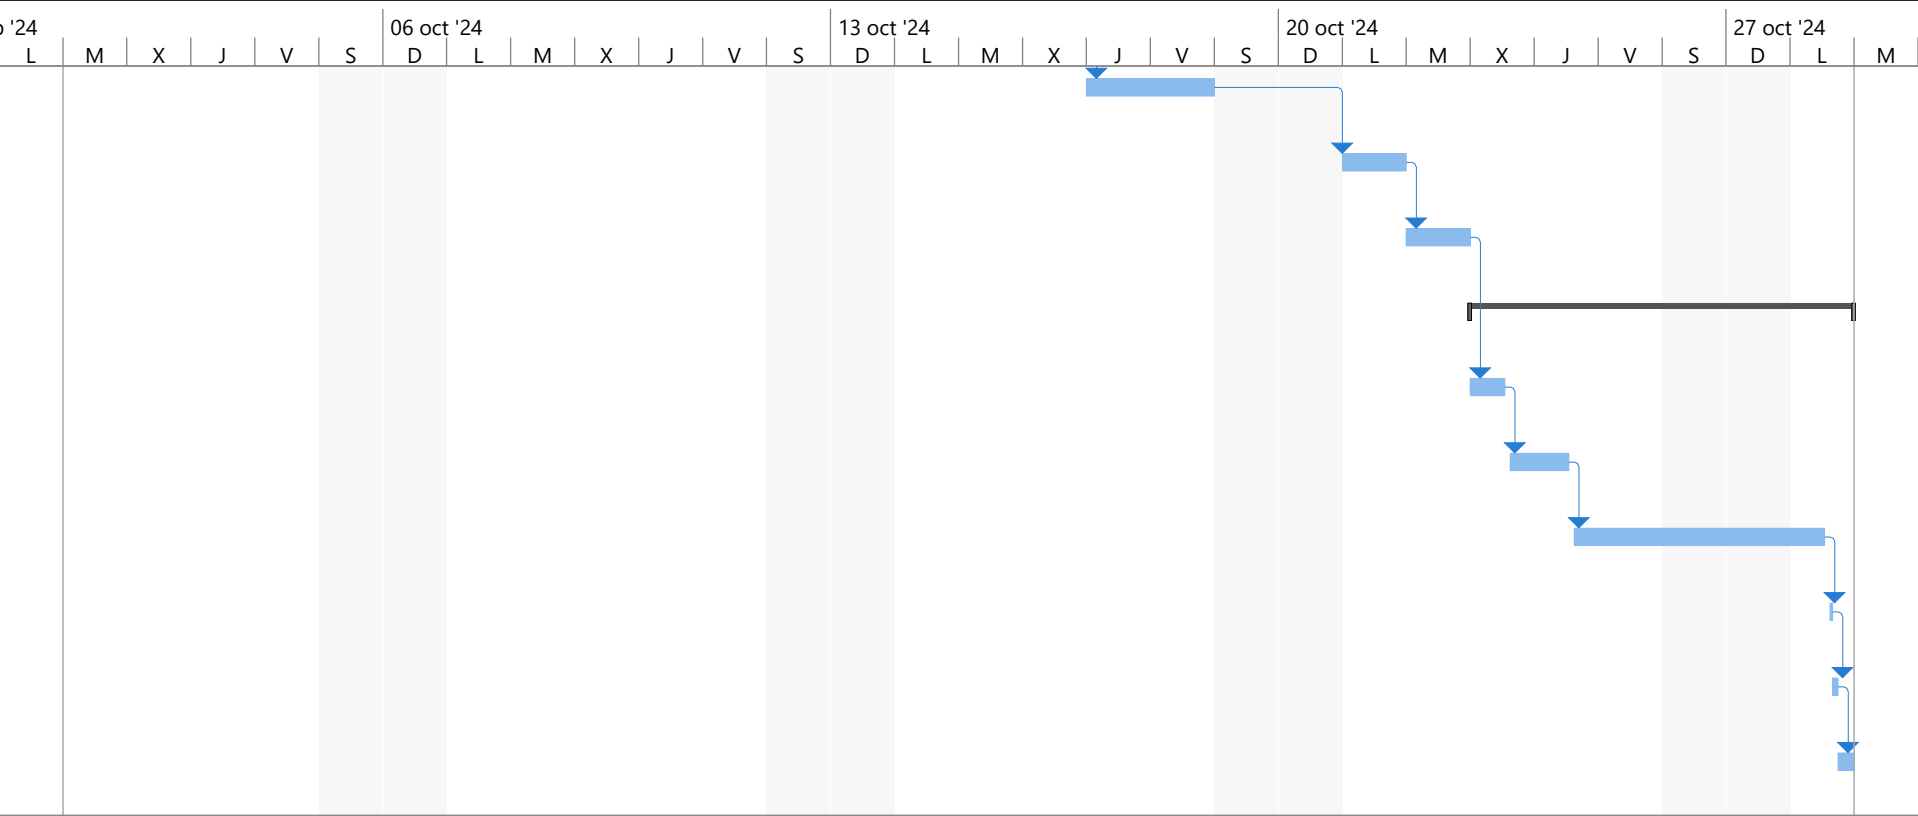

Proyecto: PDT_Monto_Minimo_ Fecha: mié 18-09-24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
