

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	S
1			Plan de trabajo monto mínimo	20 días	lun 14-10-24	vie 08-11-24			
2			Análisis y diseño de los cambios a realizar	1 día	lun 14-10-24	lun 14-10-24			
3			BOF	3 días	mar 15-10-24	jue 17-10-24			
4			Agregar campo Setup a la tabla P_MONTO_MINIMO	1 día	mar 15-10-24	mar 15-10-24	2		
5			Quitar filtro en listado del monitor de pedidos por anulación por monto mínimo	2 días	mié 16-10-24	jue 17-10-24	4		
6			PDA	12 días	vie 18-10-24	lun 04-11-24			
7			Agregar campo Setup a la tabla P_MONTO_MINIMO	4 horas	vie 18-10-24	vie 18-10-24	5		
8			Modificar proceso de importación de datos	4 horas	vie 18-10-24	vie 18-10-24	7		
9			Modificar funcionalidad de monto mínimo	11 días	lun 21-10-24	lun 04-11-24			
10			Cuando la configuración de monto mínimo sea Warning, solo dar mensaje de advertencia, pedido debe guardarse y	3 días	lun 21-10-24	mié 23-10-24	8		
11			Cuando la configuración de monto mínimo sea Bloqueado, el pedido no	2 días	jue 24-10-24	vie 25-10-24	10		
12			Quitar funcionalidad de pedido anulado en el fin de día	2 días	lun 28-10-24	mar 29-10-24	11		


Proyecto: PDT_Monto_Minimo_
Fecha: lun 23-09-24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	S
13			Quitar funcionalidad de sumatoria de pedidos al finalizar un pedido	2 días	mié 30-10-24	jue 31-10-24	12		
14			Quitar campos que indiquen que un pedido esté anulado por monto mínimo	1 día	vie 01-11-24	vie 01-11-24	13		
15			Modificar proceso de envío de datos	1 día	lun 04-11-24	lun 04-11-24	14		
16			Pruebas	4 días	mar 05-11-24	vie 08-11-24			
17			Generar script de pruebas integrales	4 horas	mar 05-11-24	mar 05-11-24	15		
18			Pruebas en BOF	1 día	mar 05-11-24	mié 06-11-24	17		
19			Pruebas en PDA	2 días	mié 06-11-24	vie 08-11-24	18		
20			Generar release notes	1 hora	vie 08-11-24	vie 08-11-24	19		
21			Generar publicables	2 horas	vie 08-11-24	vie 08-11-24	20		
22			Publicar	1 hora	vie 08-11-24	vie 08-11-24	21		


Proyecto: PDT_Monto_Minimo_
Fecha: lun 23-09-24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

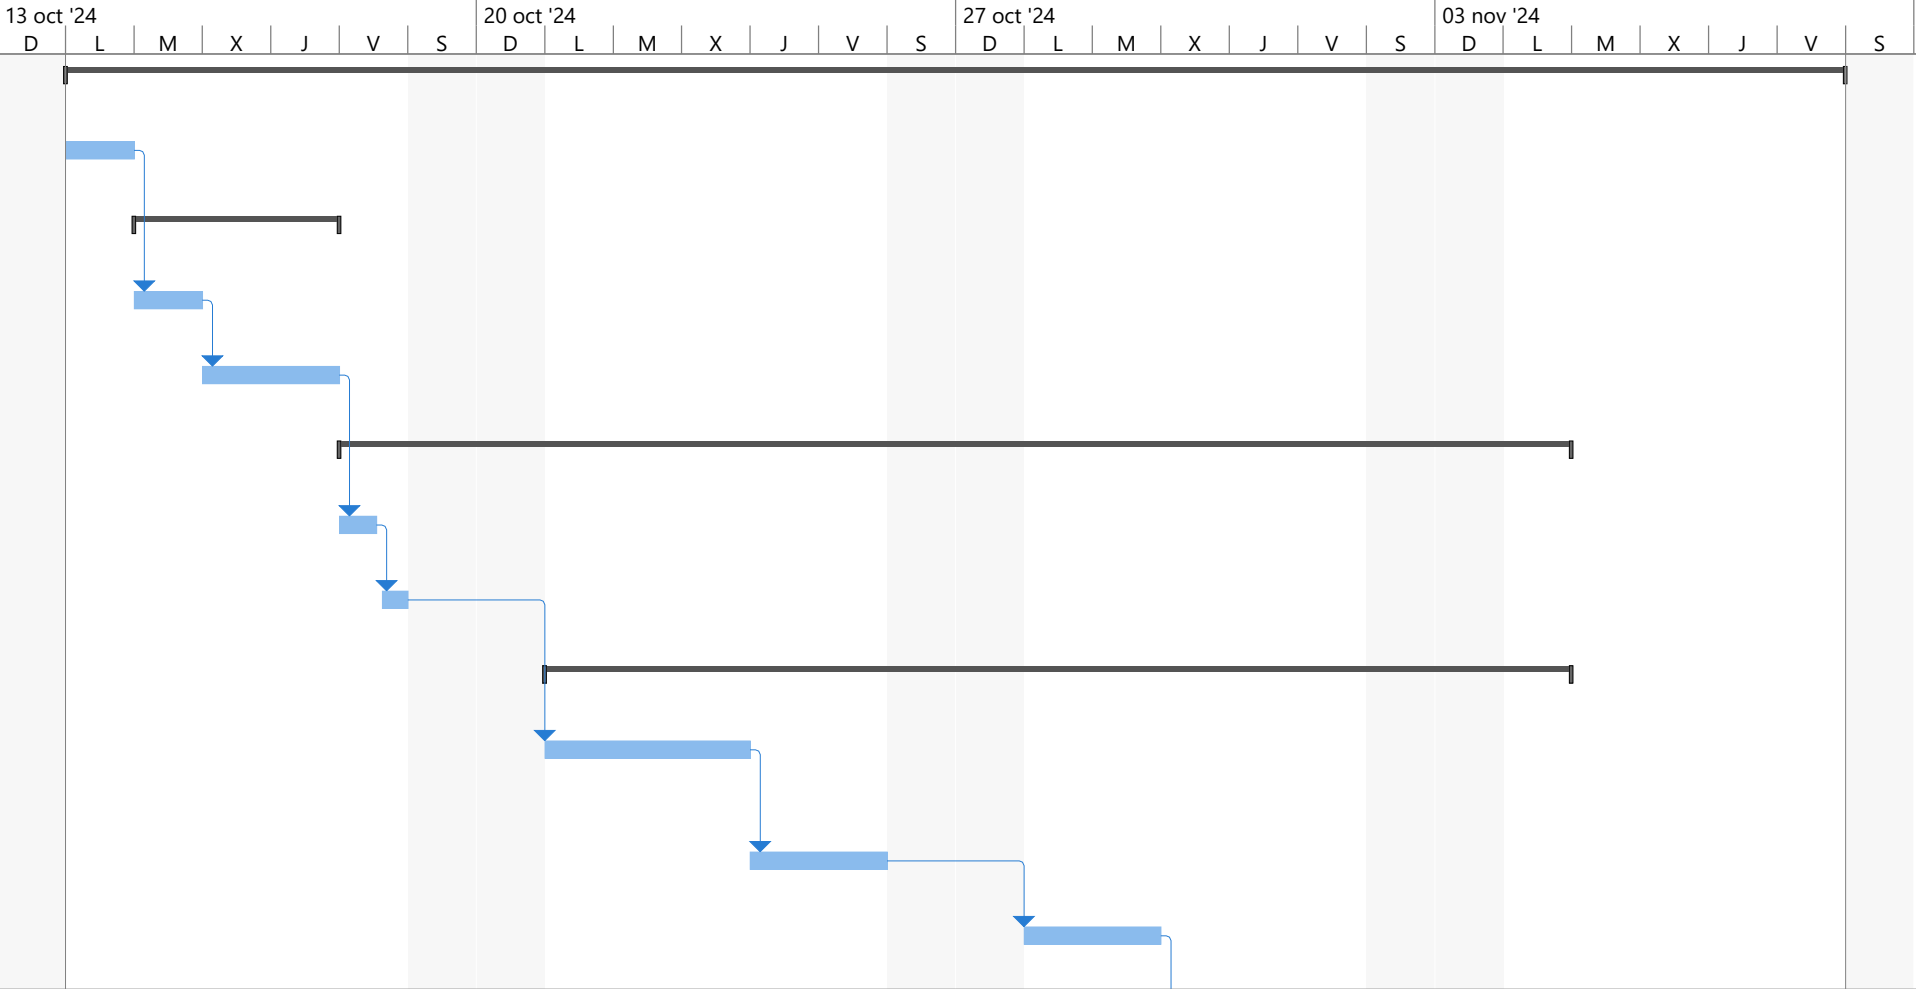

Proyecto: PDT_Monto_Minimo_
Fecha: lun 23-09-24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

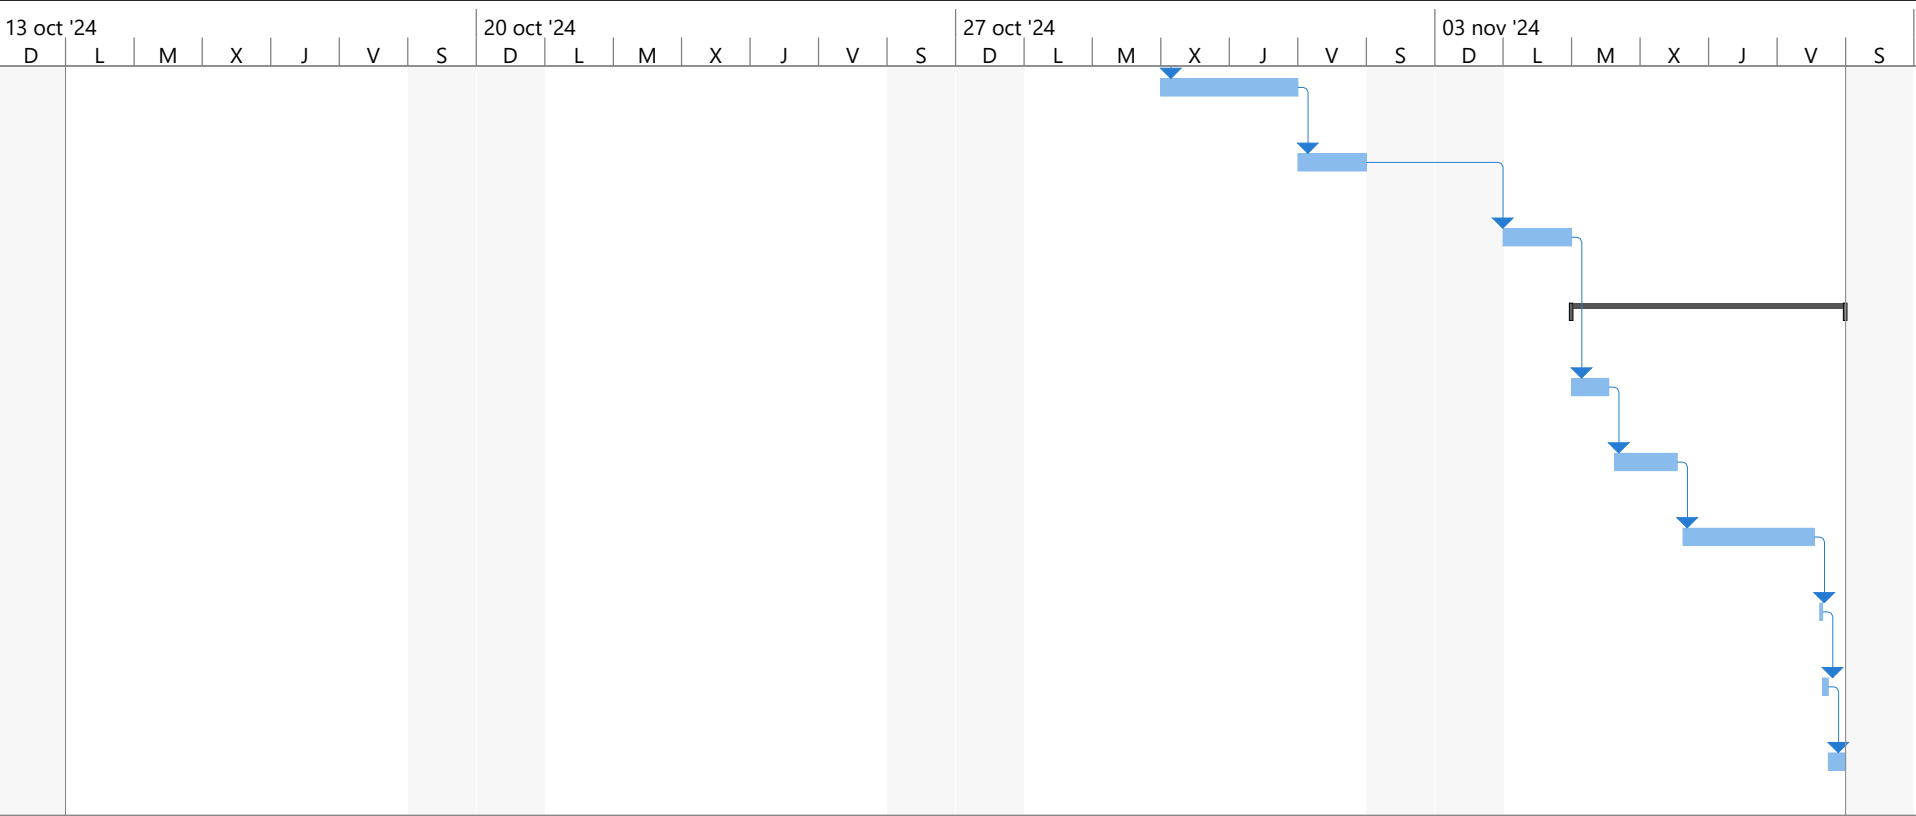

Proyecto: PDT_Monto_Minimo_ Fecha: lun 23-09-24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
