

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			PDT requerimientos Toledano	14.13 días	lun 24-03-25	vie 11-04-25	
2			Análisis y diseño de los cambios a realizar	1 día	lun 24-03-25	lun 24-03-25	
3			Manejo de un solo usuario por sucursal	1 día	mar 25-03-25	mar 25-03-25	
4			Crear tabla de usuarios por sucursal	1 hora	mar 25-03-25	mar 25-03-25	2
5			Modificar manejo de usuarios	3 horas	mar 25-03-25	mar 25-03-25	4
6			Modificar manejo de permisos	4 horas	mar 25-03-25	mar 25-03-25	5
7			Poder con combinación de teclas llamar al reporte de precios especiales	1 hora	mié 26-03-25	mié 26-03-25	6
8			Generar reporte que muestre la comunicación de los dispositivos	2 días	mié 26-03-25	vie 28-03-25	
9			Guardar la hora de la comunicación de la HH	2 días	mié 26-03-25	vie 28-03-25	
10			Hora de carga de datos	4 horas	mié 26-03-25	mié 26-03-25	7
11			Hora de fin de día	4 horas	mié 26-03-25	jue 27-03-25	10
12			Crear reporte para visualizar la información	1 día	jue 27-03-25	vie 28-03-25	11
13			Agregar bandera que indique si el pedido ya fue comunicado o no	1 día	vie 28-03-25	lun 31-03-25	12


Proyecto: PDT_Toledano_20250
Fecha: lun 24-03-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
14			Opción para visualizar la prefacturas en ROAD	2 días	lun 31-03-25	mié 02-04-25	13
15			Poder actualizar los clientes por ruta sin necesidad de hacer una carga completa de datos	2 días	mié 02-04-25	vie 04-04-25	14
16			Mostrar la hora en las notas de crédito impresas	1 día	vie 04-04-25	lun 07-04-25	
17			Agregar campo en la tabla de notas de crédito para almacenar esta información	4 horas	vie 04-04-25	vie 04-04-25	15
18			Modificar impresión	4 horas	vie 04-04-25	lun 07-04-25	17
19			En los cobros poder filtrar los bancos	1 día	lun 07-04-25	mar 08-04-25	18
20			Reimpresión del cierre Z	1 día	mar 08-04-25	mié 09-04-25	19
21			Pruebas completas	2 días	mié 09-04-25	vie 11-04-25	20


Proyecto: PDT_Toledano_20250
Fecha: lun 24-03-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

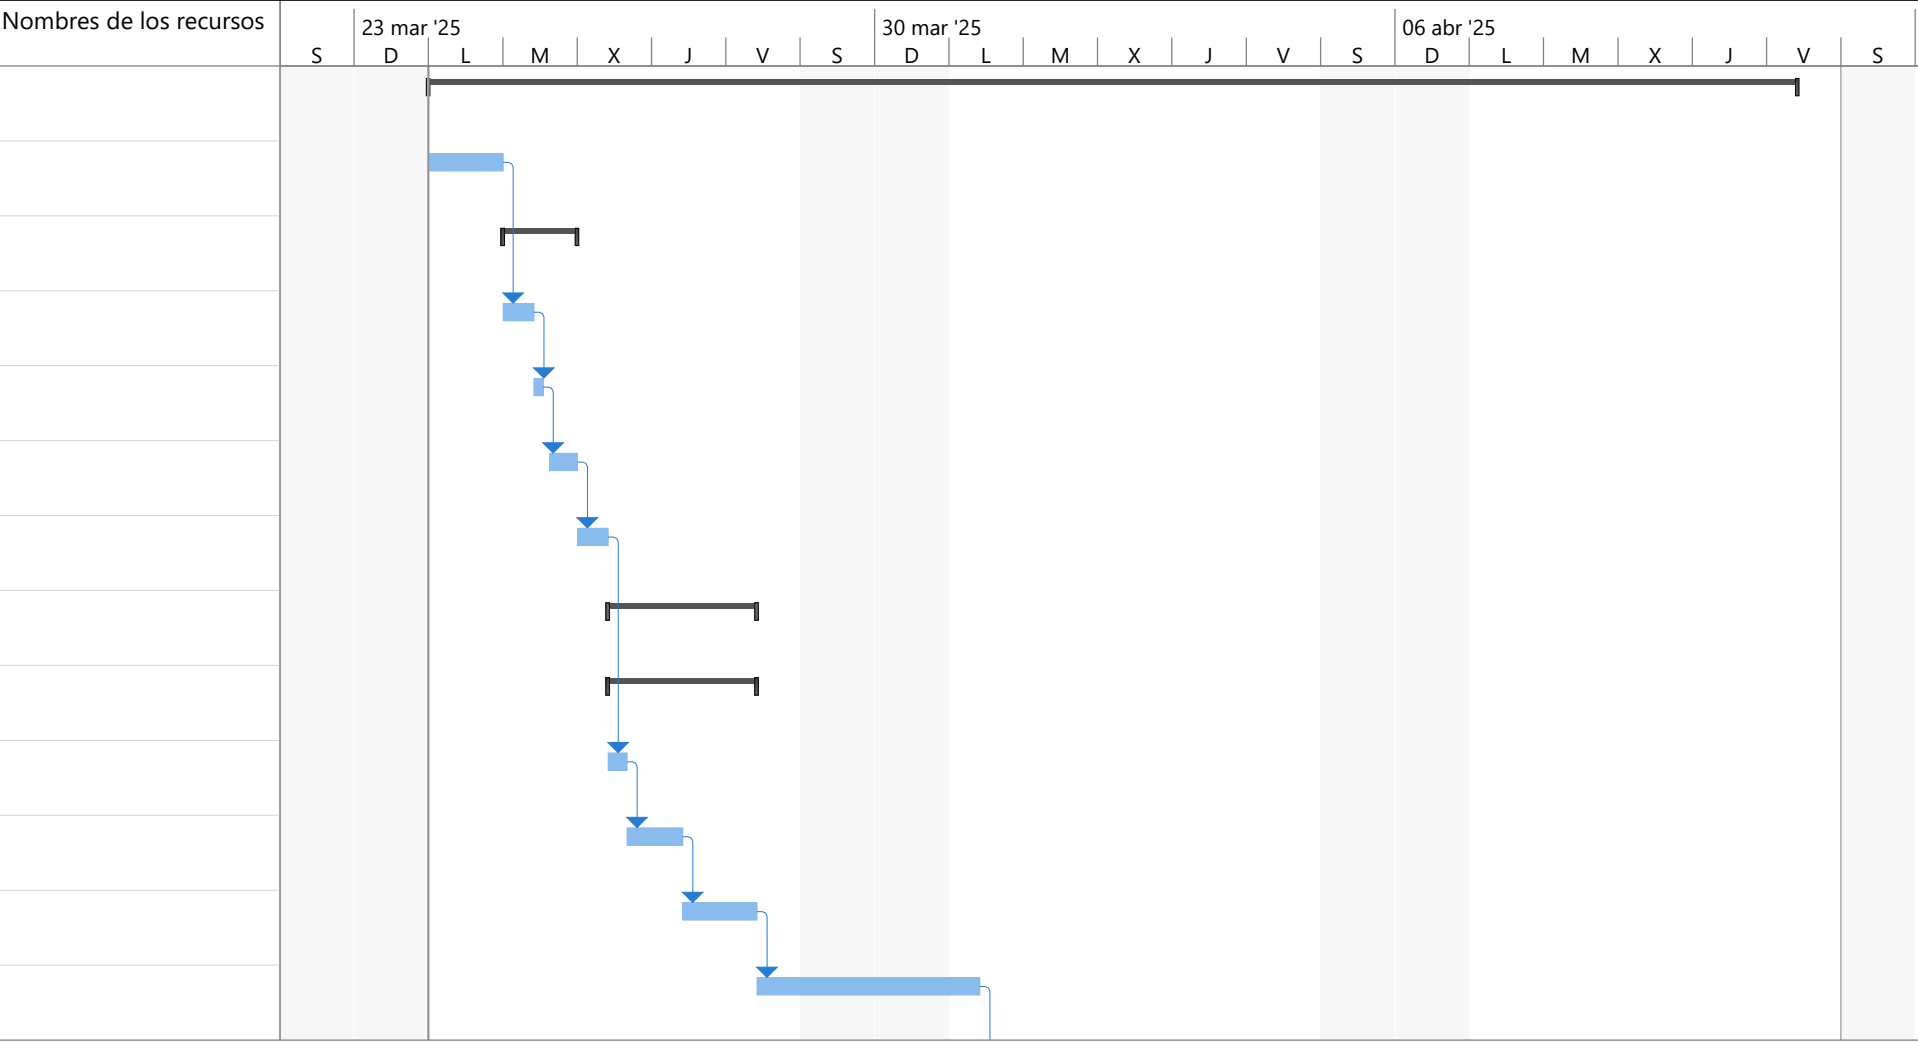

Proyecto: PDT_Toledano_20250 Fecha: lun 24-03-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

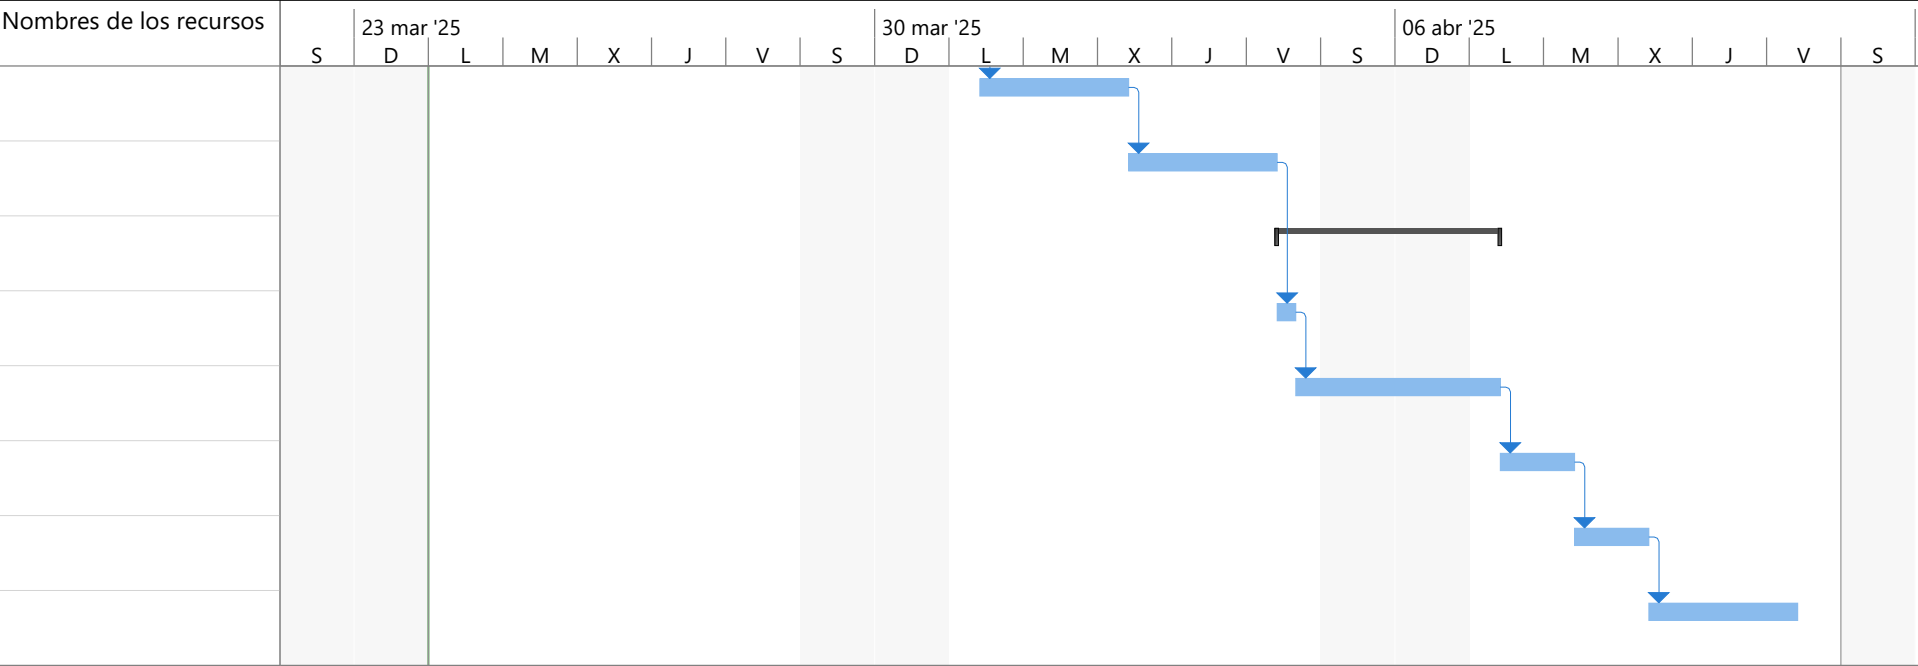

Proyecto: PDT_Toledano_20250 Fecha: lun 24-03-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
