

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			PDT Agregar tipología	13 días	lun 20/11/23	mié 6/12/23	
2			Análisis diseño	2 días	lun 20/11/23	mar 21/11/23	
3			BOF	3 días	mié 22/11/23	vie 24/11/23	
4			Agregar campo tipologia en la tabla D_CLINUEVOT y en la tabla P_CLIENTE, creación de clases	2 horas	mié 22/11/23	mié 22/11/23	2
5			Crear tabla P_TIPOLOGIA	2 horas	mié 22/11/23	mié 22/11/23	4
6			Crear la dependencia del campo tipologia con canal y subcanal	4 horas	mié 22/11/23	mié 22/11/23	5
7			Crear mantenimiento de tipología	1 día	jue 23/11/23	jue 23/11/23	6
8			Agregar el campo en el mantenimiento de cliente	4 horas	vie 24/11/23	vie 24/11/23	7
9			Agregar el campo en los datos que se muestran del cliente nuevo	4 horas	vie 24/11/23	vie 24/11/23	8
10			PDA	5 días	lun 27/11/23	vie 1/12/23	
11			Agregar campo tipologia en la tabla D_CLINUEVOT y en la tabla P_CLIENTE y modificación de clases	2 horas	lun 27/11/23	lun 27/11/23	9
12			Modificar el proceso de carga de datos	1 hora	lun 27/11/23	lun 27/11/23	11
13			Modificar el proceso de envío de datos	1 hora	lun 27/11/23	lun 27/11/23	12

Proyecto: PDT_Toledano_Client Fecha: jue 12/10/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
14			Modificar la creación de cliente nuevo	1 día	lun 27/11/23	mar 28/11/23	13	
15			Modificar la pantalla de detalle de clientes	4 horas	mar 28/11/23	mar 28/11/23	14	
16			Realizar validación del RUC del cliente	3 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23	15	
17			Pruebas y correcciones	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	16	

Proyecto: PDT_Toledano_Client
Fecha: jue 12/10/23

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin
















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual













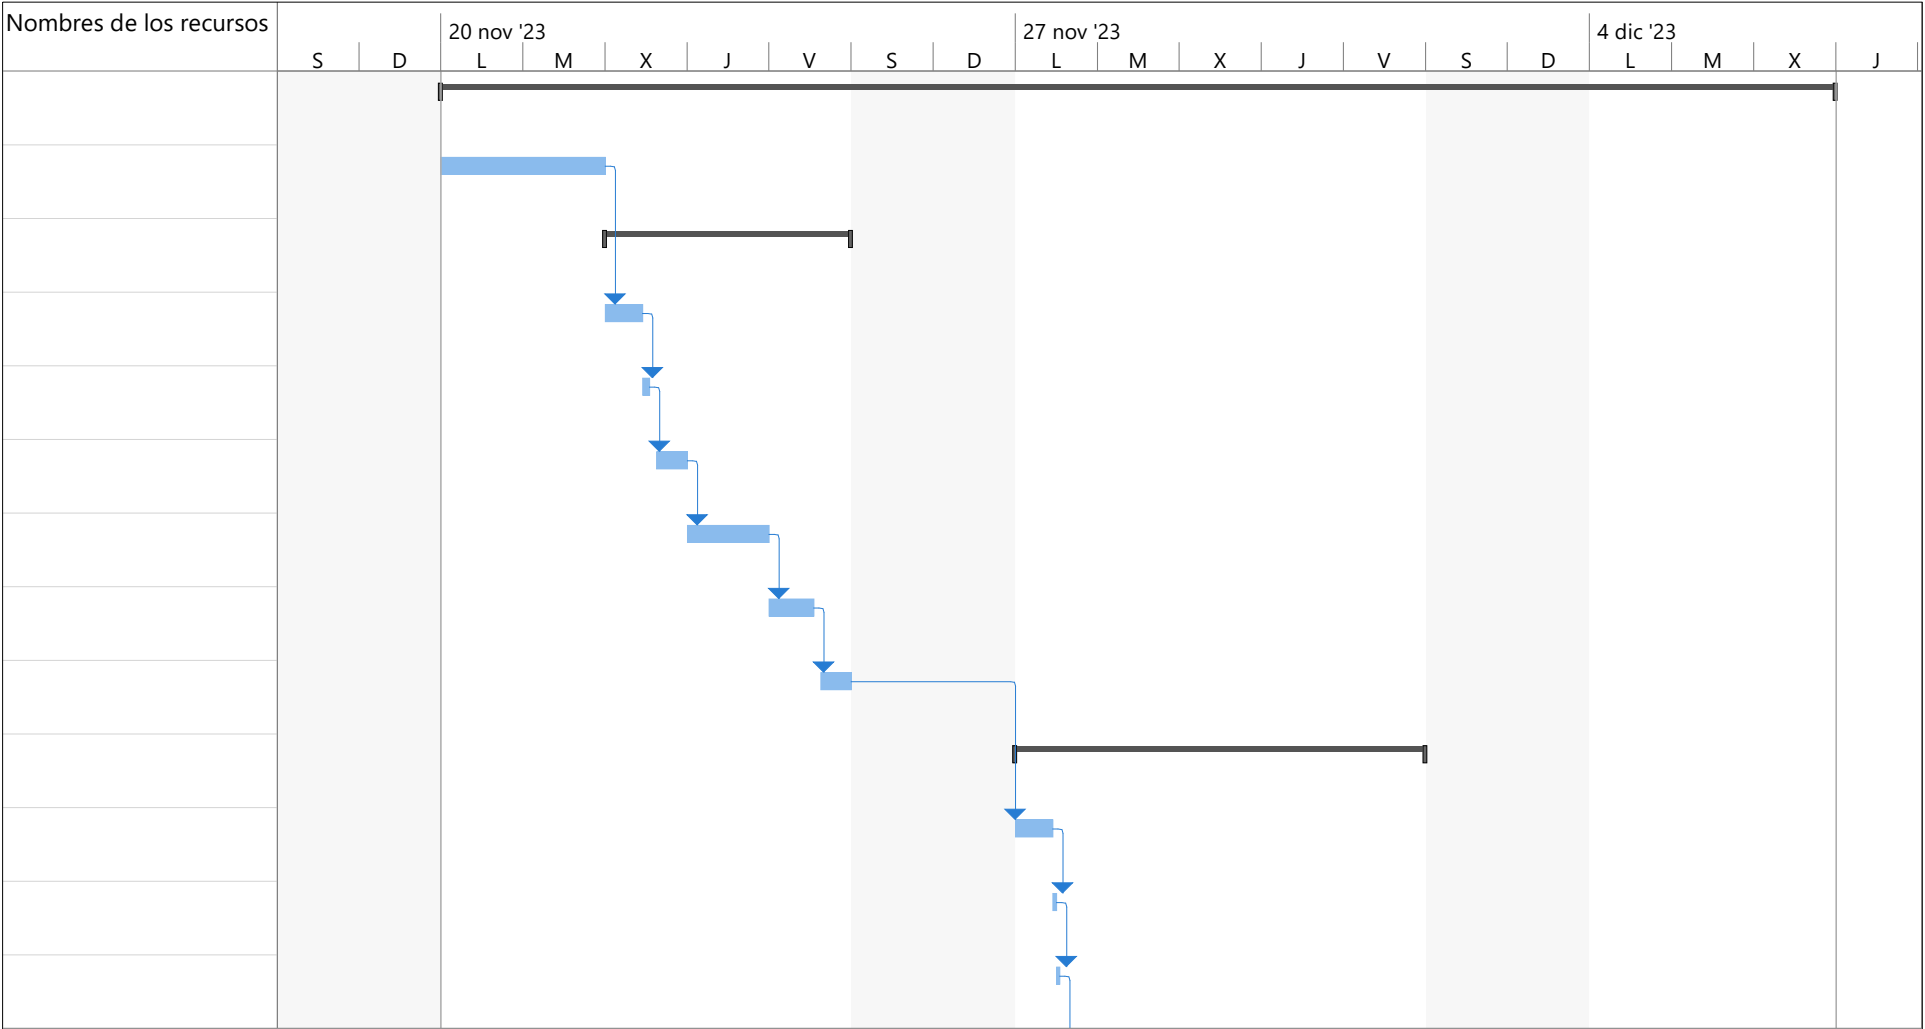

Proyecto: PDT_Toledano_Client Fecha: jue 12/10/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

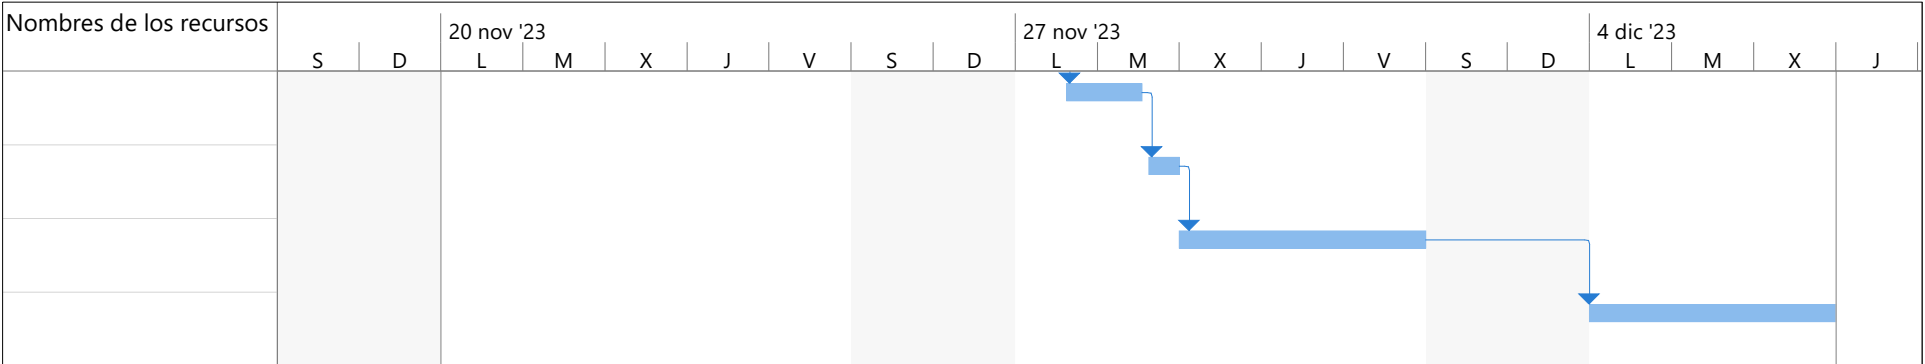

Proyecto: PDT_Toledano_Client Fecha: jue 12/10/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
