

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			Plan trabajo promociones Combos	17 días	lun 11-05-26	mar 02-06-26	
2			BOF y HH	17 días	lun 11-05-26	mar 02-06-26	
3			Análisis	2 días	lun 11-05-26	mar 12-05-26	
4			Analizar cambios a nivel de base de datos en BOF y PDA	1 día	lun 11-05-26	lun 11-05-26	
5			Análisis de cambios en BOF y PDA para aplicar descuentos por combos	1 día	mar 12-05-26	mar 12-05-26	4
6			Diseño	1 día	mié 13-05-26	mié 13-05-26	
7			Agregar métodos nuevos en BOF y PDA para calcular descuentos de combos	1 día	mié 13-05-26	mié 13-05-26	5
8			Base de datos BOF y HH	1 día	jue 14-05-26	jue 14-05-26	
9			Agregar tabla nueva para manejo de combos	1 día	jue 14-05-26	jue 14-05-26	7
10			BOF	7 días	vie 15-05-26	lun 25-05-26	
11			Modificar mantenimiento de descuentos	2 días	vie 15-05-26	lun 18-05-26	9
12			Modificar facturación	5 días	mar 19-05-26	lun 25-05-26	11
13			HH	6 días	mar 26-05-26	mar 02-06-26	

Proyecto: PDT_Toledano_Comb
Fecha: mié 06-05-26

Tarea



Resumen inactivo



Tareas externas



División



Tarea manual



Hito externo



Hito



solo duración



Fecha límite



Resumen



Informe de resumen manual



Progreso



Resumen del proyecto



Resumen manual



Progreso manual



Tarea inactiva



solo el comienzo



Hito inactivo




solo fin




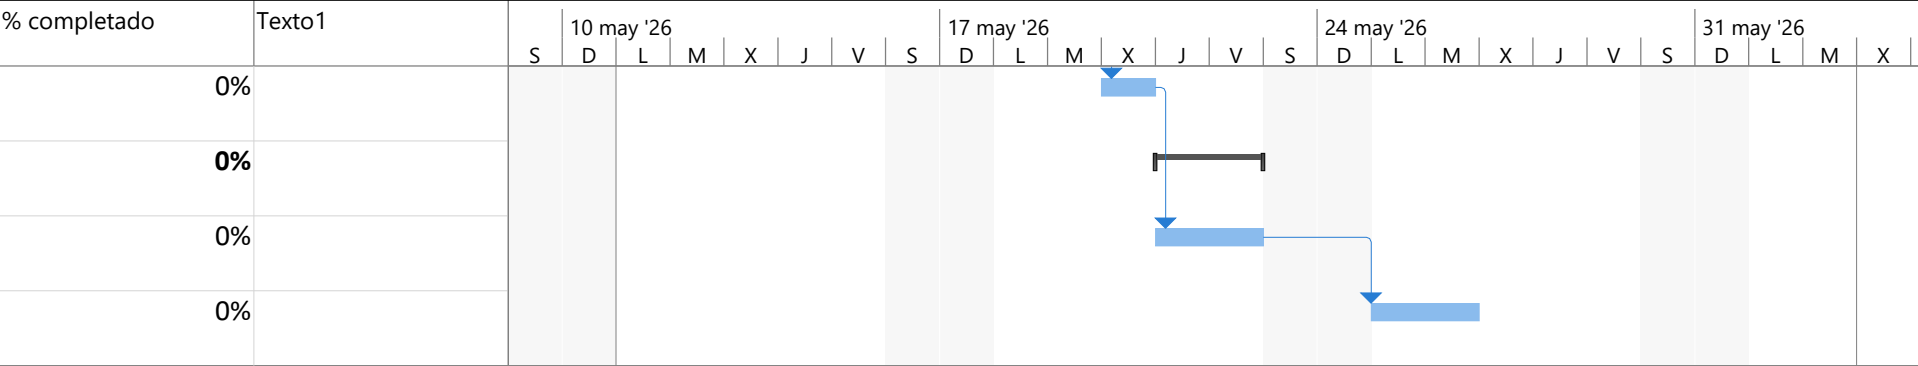
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
14			Modificar proceso de comunicación	1 día	mar 26-05-26	mar 26-05-26	12
15			Modificar facturación	5 días	mié 27-05-26	mar 02-06-26	14
16			Interface	10 días	lun 11-05-26	vie 22-05-26	
17			Transformación de datos en en WebApi de SAP hacia RO	10 días	lun 11-05-26	vie 22-05-26	
18			Definición reglas transformación	1 día	lun 11-05-26	lun 11-05-26	
19			Validaciones con negocio (combos/escalas)	1 día	mar 12-05-26	mar 12-05-26	18
20			Diseño técnico	2 días	mié 13-05-26	jue 14-05-26	
21			Diseño modelo datos ROAD	1 día	mié 13-05-26	mié 13-05-26	19
22			Diseño lógica transformación	1 día	jue 14-05-26	jue 14-05-26	21
23			Desarrollo	4 días	vie 15-05-26	mié 20-05-26	
24			Parser payload SAP	1 día	vie 15-05-26	vie 15-05-26	22
25			Transformación descuentos simples	1 día	lun 18-05-26	lun 18-05-26	24
26			Transformación escalas	1 día	mar 19-05-26	mar 19-05-26	25


Proyecto: PDT_Toledano_Comb
Fecha: mié 06-05-26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
27			Transformación combos	1 día	mié 20-05-26	mié 20-05-26	26
28			Pruebas	2 días	jue 21-05-26	vie 22-05-26	
29			Pruebas unitarias	2 días	jue 21-05-26	vie 22-05-26	27
30			Pruebas integrales	2 días	lun 25-05-26	mar 26-05-26	29

Proyecto: PDT_Toledano_Comb Fecha: mié 06-05-26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_Comb Fecha: mié 06-05-26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
