





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	D	L
1			Plan de trabajo Promociones ROAD	92 días	lun 05-01-26	mar 12-05-26				
2			Análisis y diseño de promociones	5 días	lun 05-01-26	vie 09-01-26				
3			Validaciones descuentos y bonificaciones actuales	10 días	lun 12-01-26	vie 23-01-26				
4			Validaciones al proceso actual de descuentos y bonificaciones que si son configurables en ROAD en la versión actual.	10 días	lun 12-01-26	vie 23-01-26	2			
5			Desarrollo de recargos en ROAD	11 días	lun 26-01-26	lun 09-02-26				
6			Agregar parámetro en las tablas de descuentos para definir si es un recargo o un descuento	1 día	lun 26-01-26	lun 26-01-26	4			
7			Agregar la funcionalidad de recargo por porcentaje en la venta,utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes	5 días	mar 27-01-26	lun 02-02-26	6			
8			Agregar la funcionalidad de recargo fijo en la venta, utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes	5 días	mar 03-02-26	lun 09-02-26	7			
9			Desarrollos para integración con SAP	50 días	mar 10-02-26	lun 20-04-26				
10			Sesión para definir mapeos entre las tablas de SAP y ROAD	5 días	mar 10-02-26	lun 16-02-26	8			
11			Modificaciones a las estructuras actuales de descuentos y bonificaciones para poder recibir las promociones desde SAP.	10 días	mar 17-02-26	lun 02-03-26	10			
12			Modificaciones a las tablas de inventario por manejo de las promociones.	10 días	mar 03-03-26	lun 16-03-26	11			
13			Modificaciones al proceso de toma de pedidos por el manejo de productos bonificados, en cuanto al manejo del inventario.	5 días	mar 17-03-26	lun 23-03-26	12			
14			Modificaciones al proceso actual de prefactura por la carga de las bonificaciones y el manejo del inventario	5 días	mar 24-03-26	lun 30-03-26	13			


Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: lun 29-09-25


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	D	L
15			Modificar la forma en que se calculan los descuentos en ROAD para hacerlo como se hace actualmente en SAP	5 días	mar 31-03-26	lun 06-04-26	14			
16			Envío de bonificaciones aplicados hacia SAP utilizando la tabla intermedia	10 días	mar 07-04-26	lun 20-04-26	15			
17			Pruebas interface	5 días	mar 21-04-26	lun 27-04-26	16			
18			Pruebas integrales	5 días	mar 28-04-26	lun 04-05-26	17			
19			Publicación	1 día	mar 05-05-26	mar 05-05-26	18			
20			Soporte posterior a implementación	5 días	mié 06-05-26	mar 12-05-26	19			



Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: lun 29-09-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

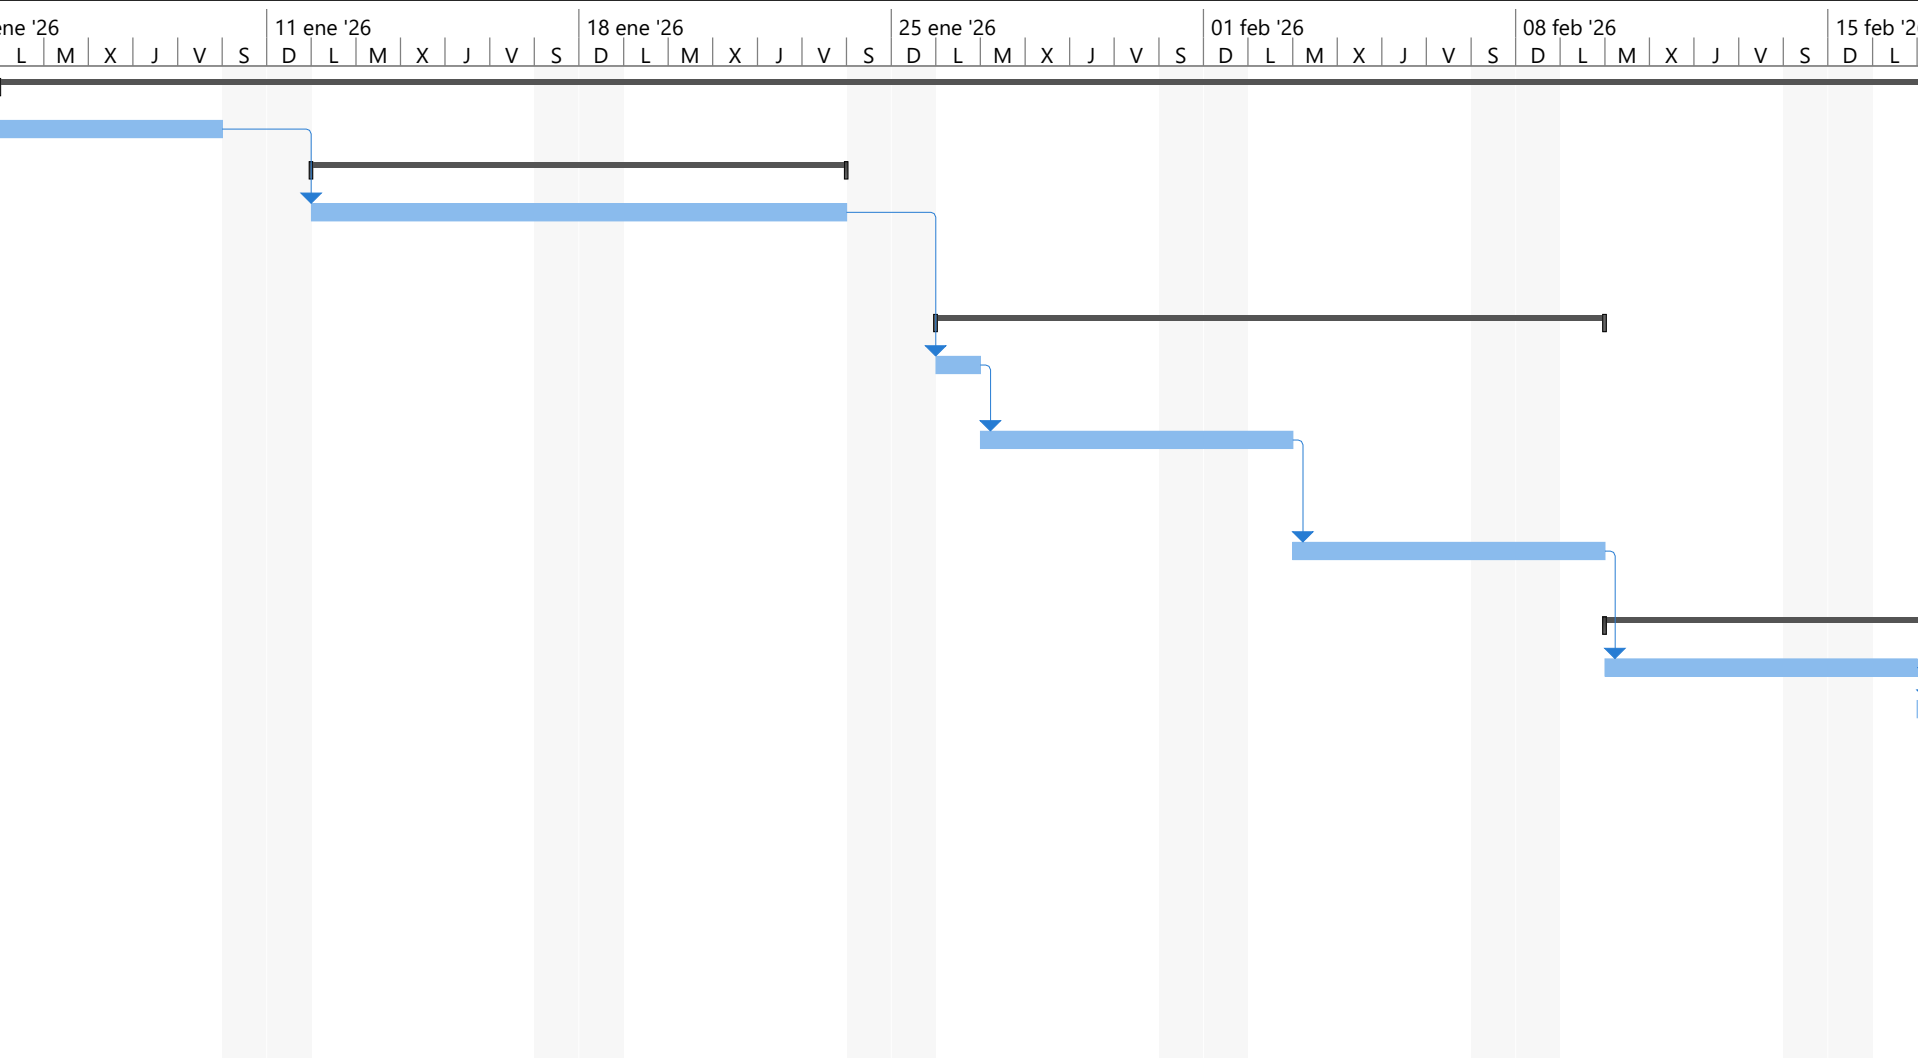

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: lun 29-09-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

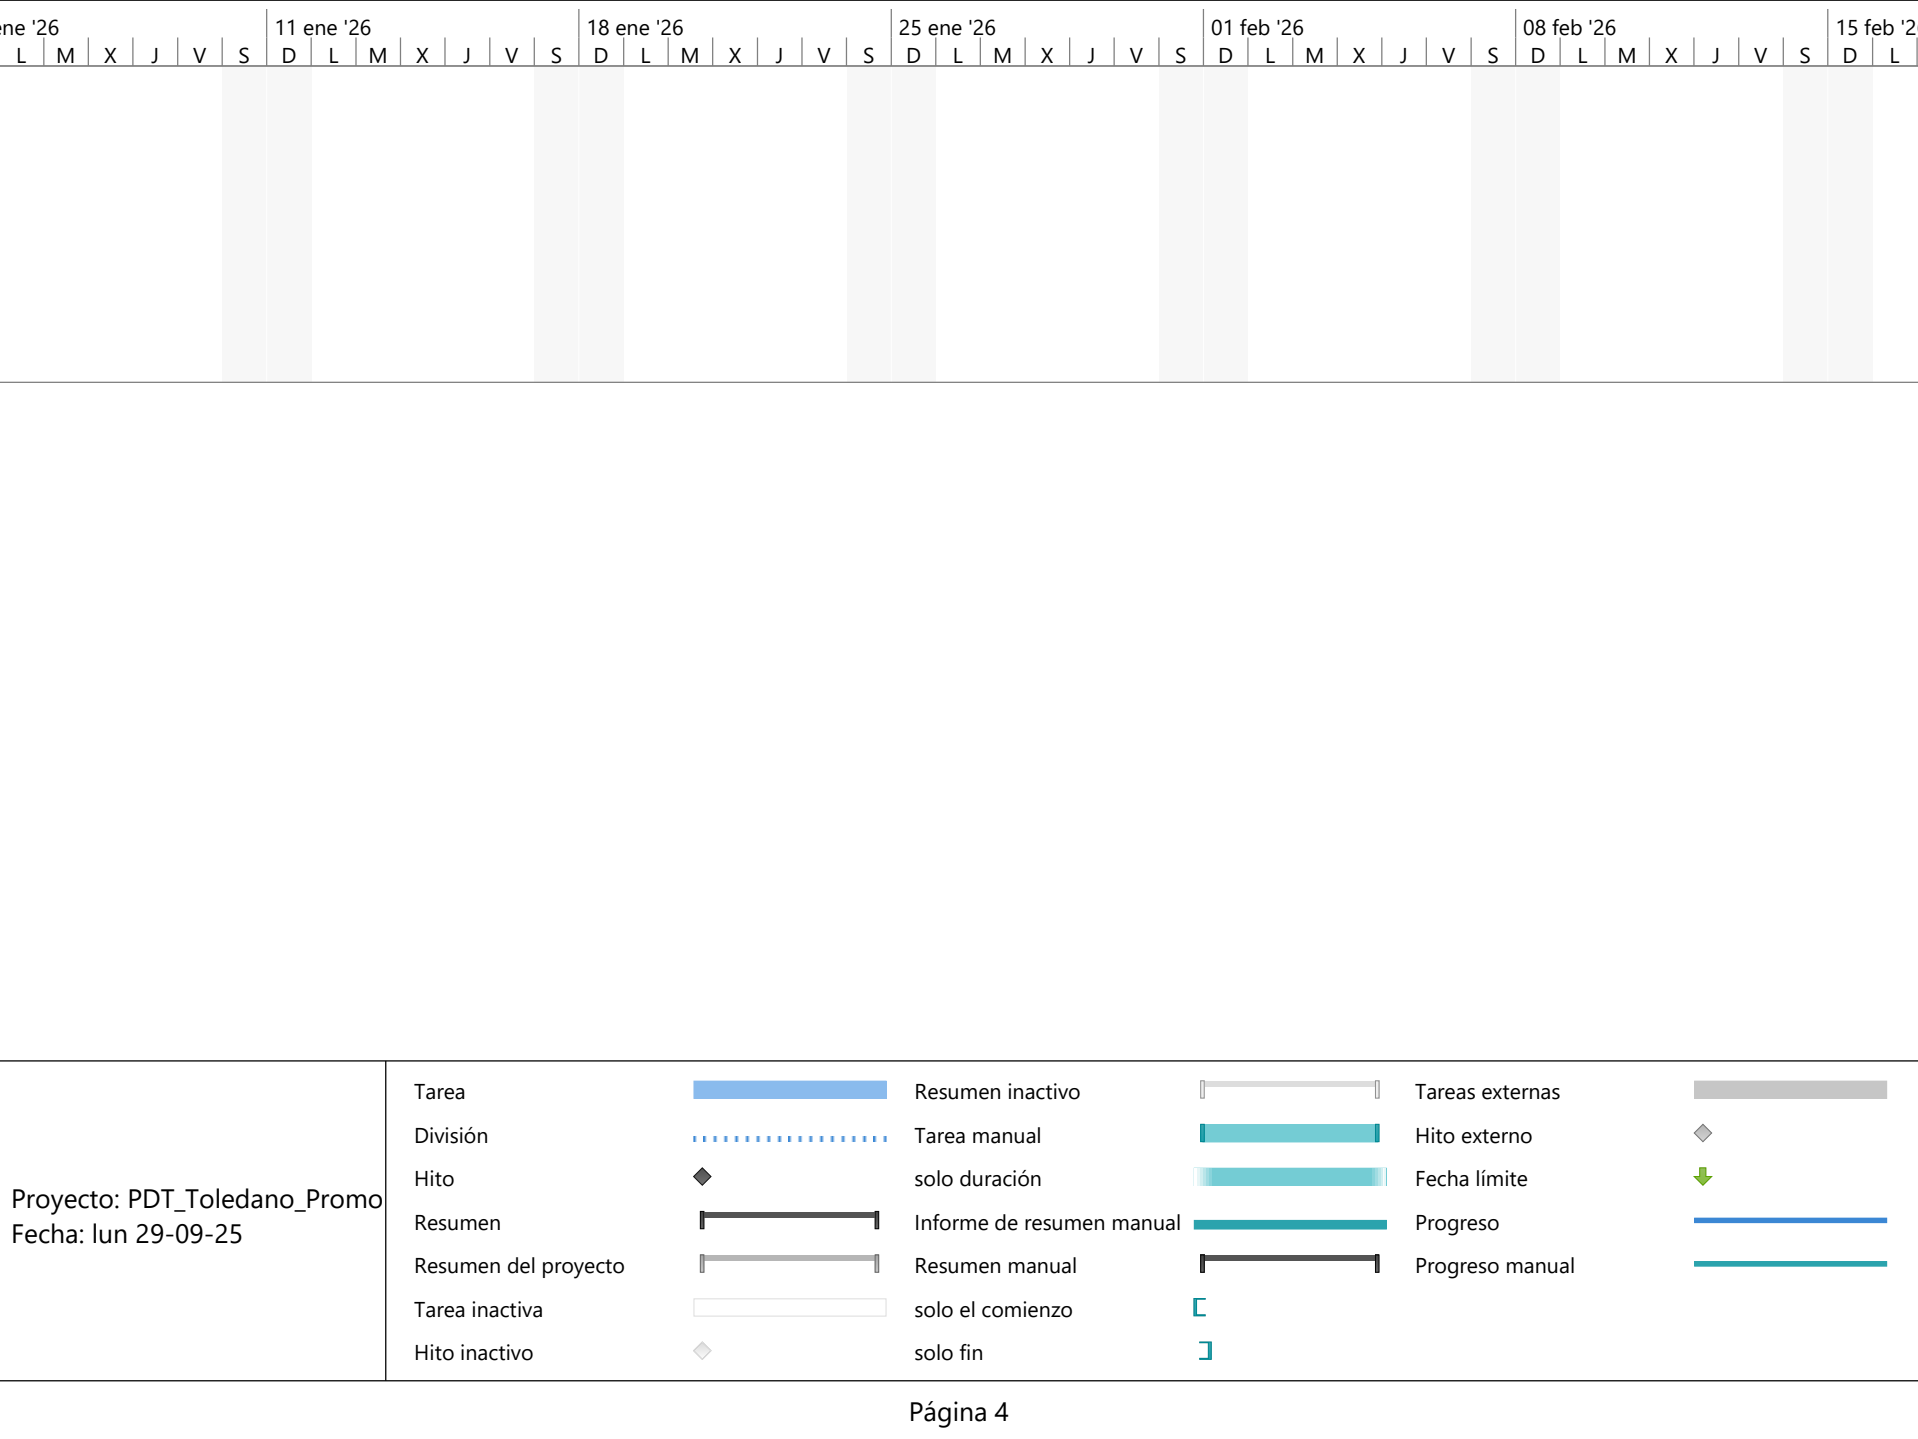

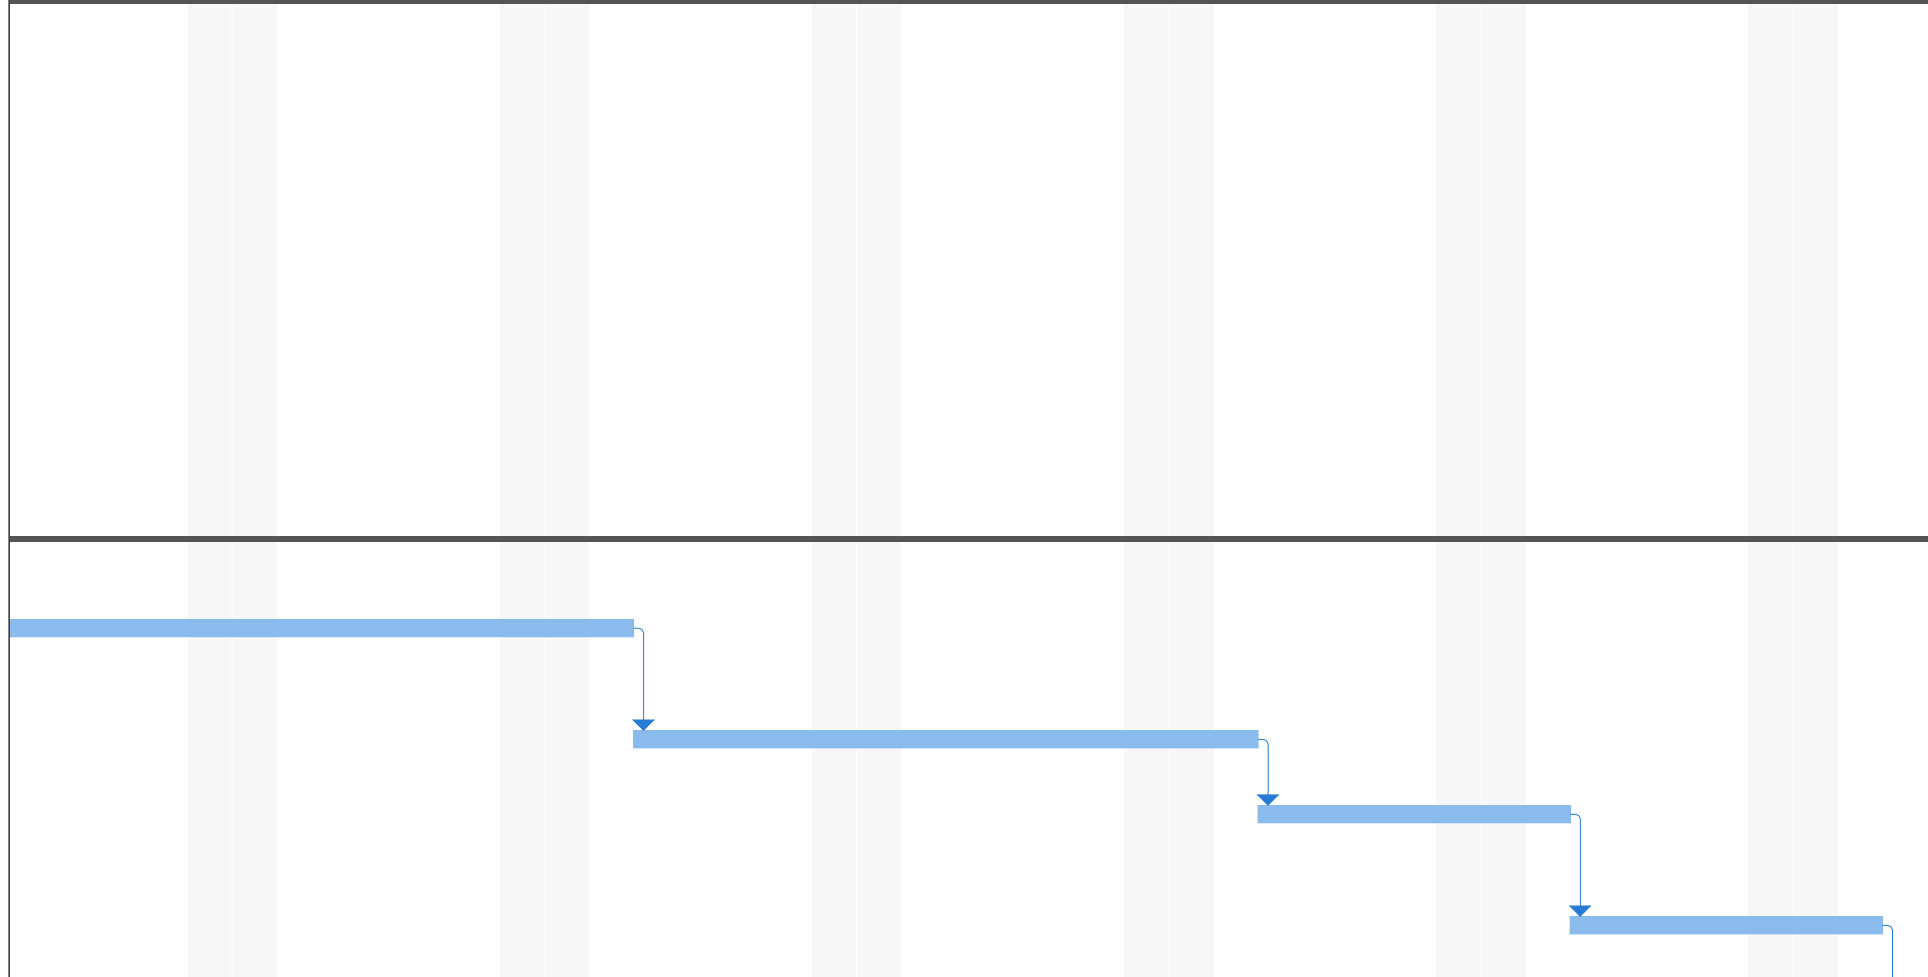

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: lun 29-09-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

6

M

X

J

V

S

22 feb '26

D

L

M

X

J

V

S

01 mar '26

D

L

M

X

J

V

S

08 mar '26

D

L

M

X

J

V

S

15 mar '26

D

L

M

X

J

V

S

22 mar '26

D

L

M

X

J

V

S

29 mar '26

D

L

M

Proyecto: PDT_Toledano_Promo

Fecha: lun 29-09-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso



Progreso manual

Página 6

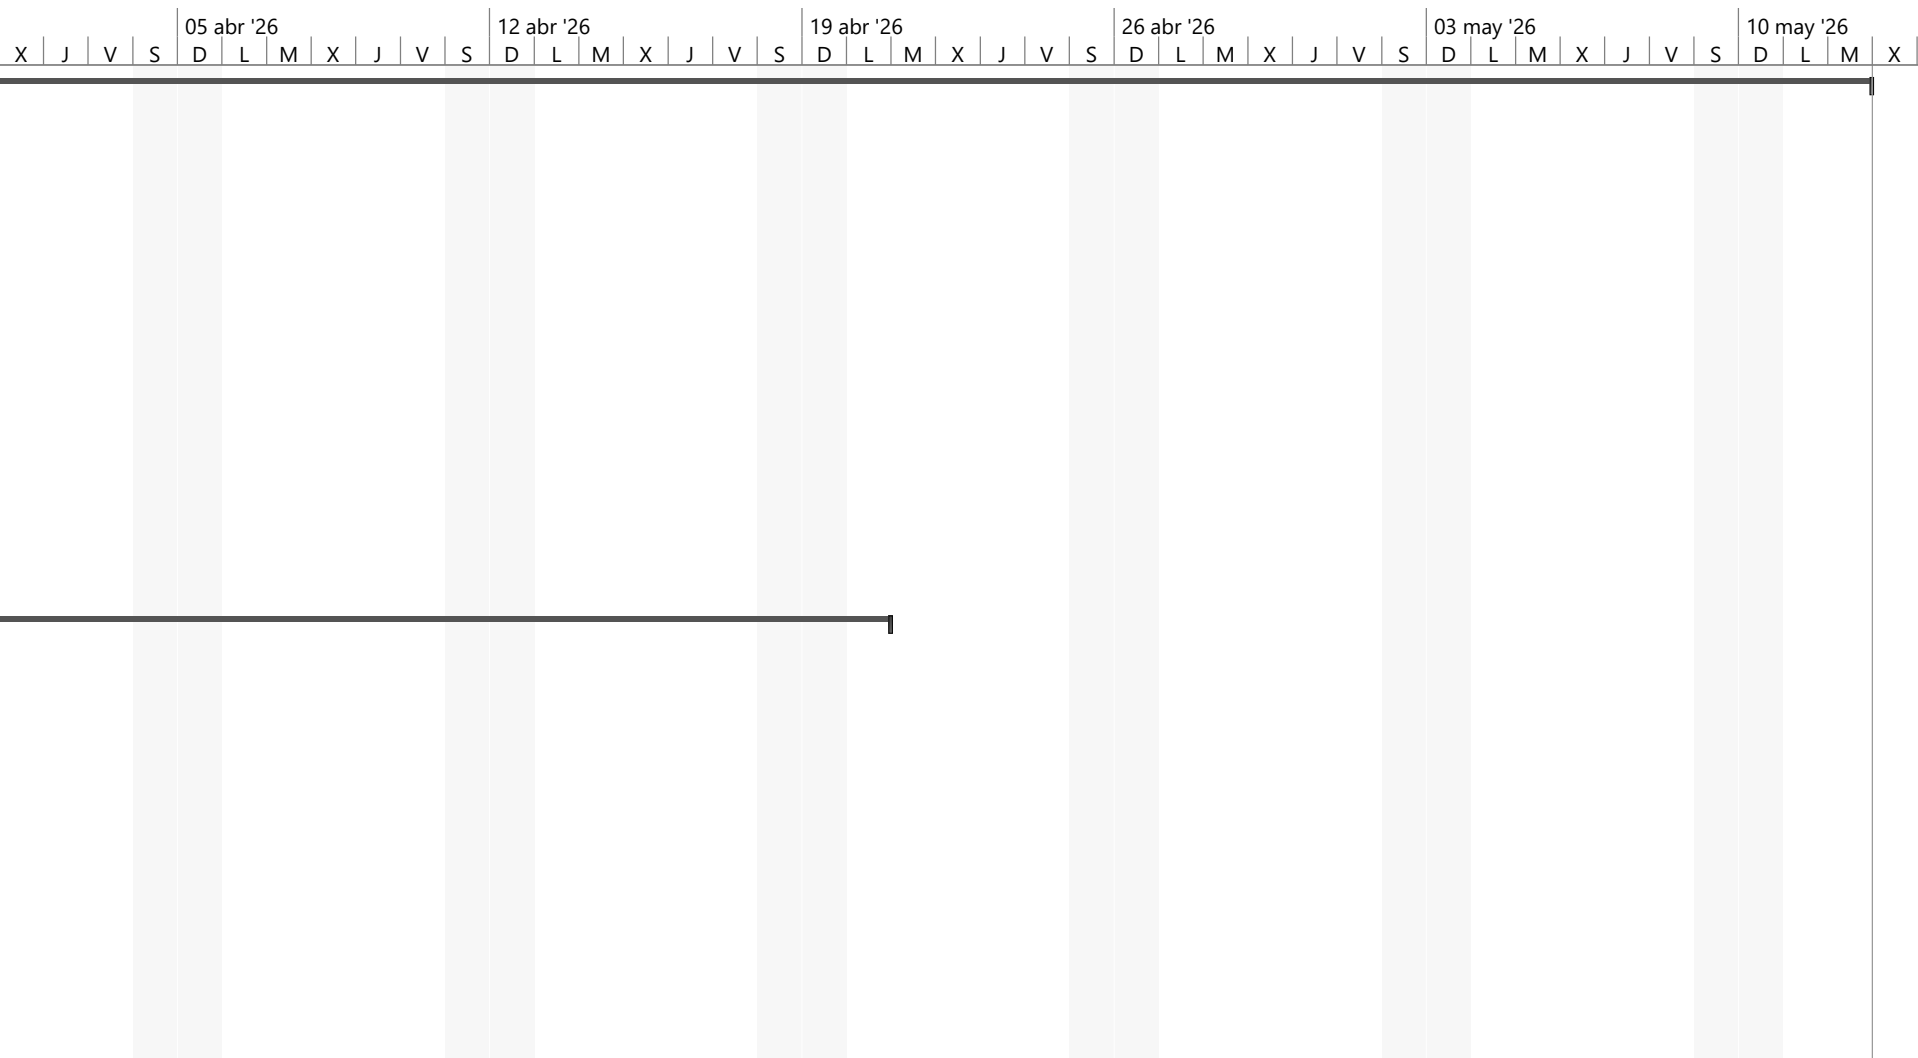

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: lun 29-09-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

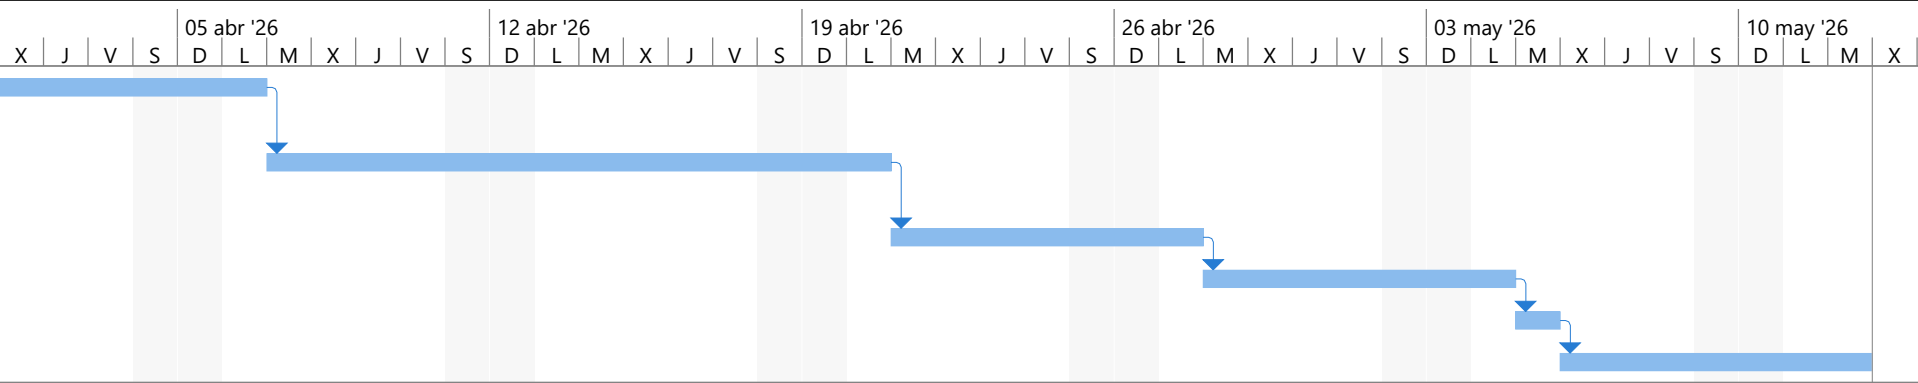

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: lun 29-09-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
