


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			Plan de trabajo Promociones ROAD Fase 1	78 días	lun 05-01-26	mié 22-04-26	
2			Análisis y diseño de promociones	5 días	lun 05-01-26	vie 09-01-26	
3			Validaciones descuentos y bonificaciones actuales	10 días	lun 12-01-26	vie 23-01-26	
4			Validaciones al proceso actual de descuentos y bonificaciones que si son configurables en ROAD en la versión actual.	10 días	lun 12-01-26	vie 23-01-26	2
5			Desarrollo de recargos en ROAD	11 días	lun 26-01-26	lun 09-02-26	
6			Agregar parámetro en las tablas de descuentos para definir si es un recargo o un descuento BOF	1 día	lun 26-01-26	lun 26-01-26	4
7			Agregar parámetro en las tablas de descuentos para definir si es un recargo o un descuento HH	1 día	lun 26-01-26	lun 26-01-26	4
8			Agregar la funcionalidad de recargo por porcentaje en la venta,utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes BOF	5 días	mar 27-01-26	lun 02-02-26	6
9			Agregar la funcionalidad de recargo por porcentaje en la venta,utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes HH	5 días	mar 27-01-26	lun 02-02-26	7
10			Agregar la funcionalidad de recargo fijo en la venta, utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes	5 días	mar 03-02-26	lun 09-02-26	8
11			Agregar la funcionalidad de recargo fijo en la venta, utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes	5 días	mar 03-02-26	lun 09-02-26	9
12			Desarrollos para integración de descuentos con SAP	36 días	mar 10-02-26	mar 31-03-26	
13			Sesión para definir mapeos entre las tablas de SAP y ROAD	5 días	mar 10-02-26	lun 16-02-26	10
14			Modificaciones a las estructuras actuales de descuentos para poder recibir las promociones desde SAP en BOF	5 días	mar 17-02-26	lun 23-02-26	13


Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: jue 16-10-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15			Modificaciones en HH a las estructuras actuales de descuentos	2 días	mar 17-02-26	mié 18-02-26	11,13
16			BOF	26 días	mar 24-02-26	mar 31-03-26	
17			Modificación al proceso de cálculo de precios en factura manual	5 días	mar 24-02-26	lun 02-03-26	14
18			Modificación al proceso de cálculo de precios en la nota de crédito con referencia manual	5 días	mar 03-03-26	lun 09-03-26	17
19			Modificación al proceso de cálculo de precios en la nota de crédito sin referencia manual	5 días	mar 10-03-26	lun 16-03-26	18
20			Modificación al cálculo de notas por error en precio	3 días	mar 17-03-26	jue 19-03-26	19
21			Modificación a los reportes de precio	3 días	vie 20-03-26	mar 24-03-26	20
22			Reportes BOF análisis y desarrollo	5 días	mié 25-03-26	mar 31-03-26	21
23			PDA	15 días	jue 19-02-26	mié 11-03-26	
24			Modificar la forma en que se calculan los descuentos en la facturación en ROAD en la HH para hacerlo como se hace actualmente en SAP	5 días	jue 19-02-26	mié 25-02-26	15
25			Modificar la forma en que se calculan los descuentos en las notas de crédito en ROAD en la HH para hacerlo como se hace actualmente en SAP	5 días	jue 26-02-26	mié 04-03-26	24
26			Reportes PDA análisis y desarrollo	5 días	jue 05-03-26	mié 11-03-26	25
27			Pruebas interface	5 días	mié 01-04-26	mar 07-04-26	26,22
28			Pruebas integrales	5 días	mié 08-04-26	mar 14-04-26	27
29			Publicación	1 día	mié 15-04-26	mié 15-04-26	28
30			Soporte posterior a implementación	5 días	jue 16-04-26	mié 22-04-26	29

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: jue 16-10-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

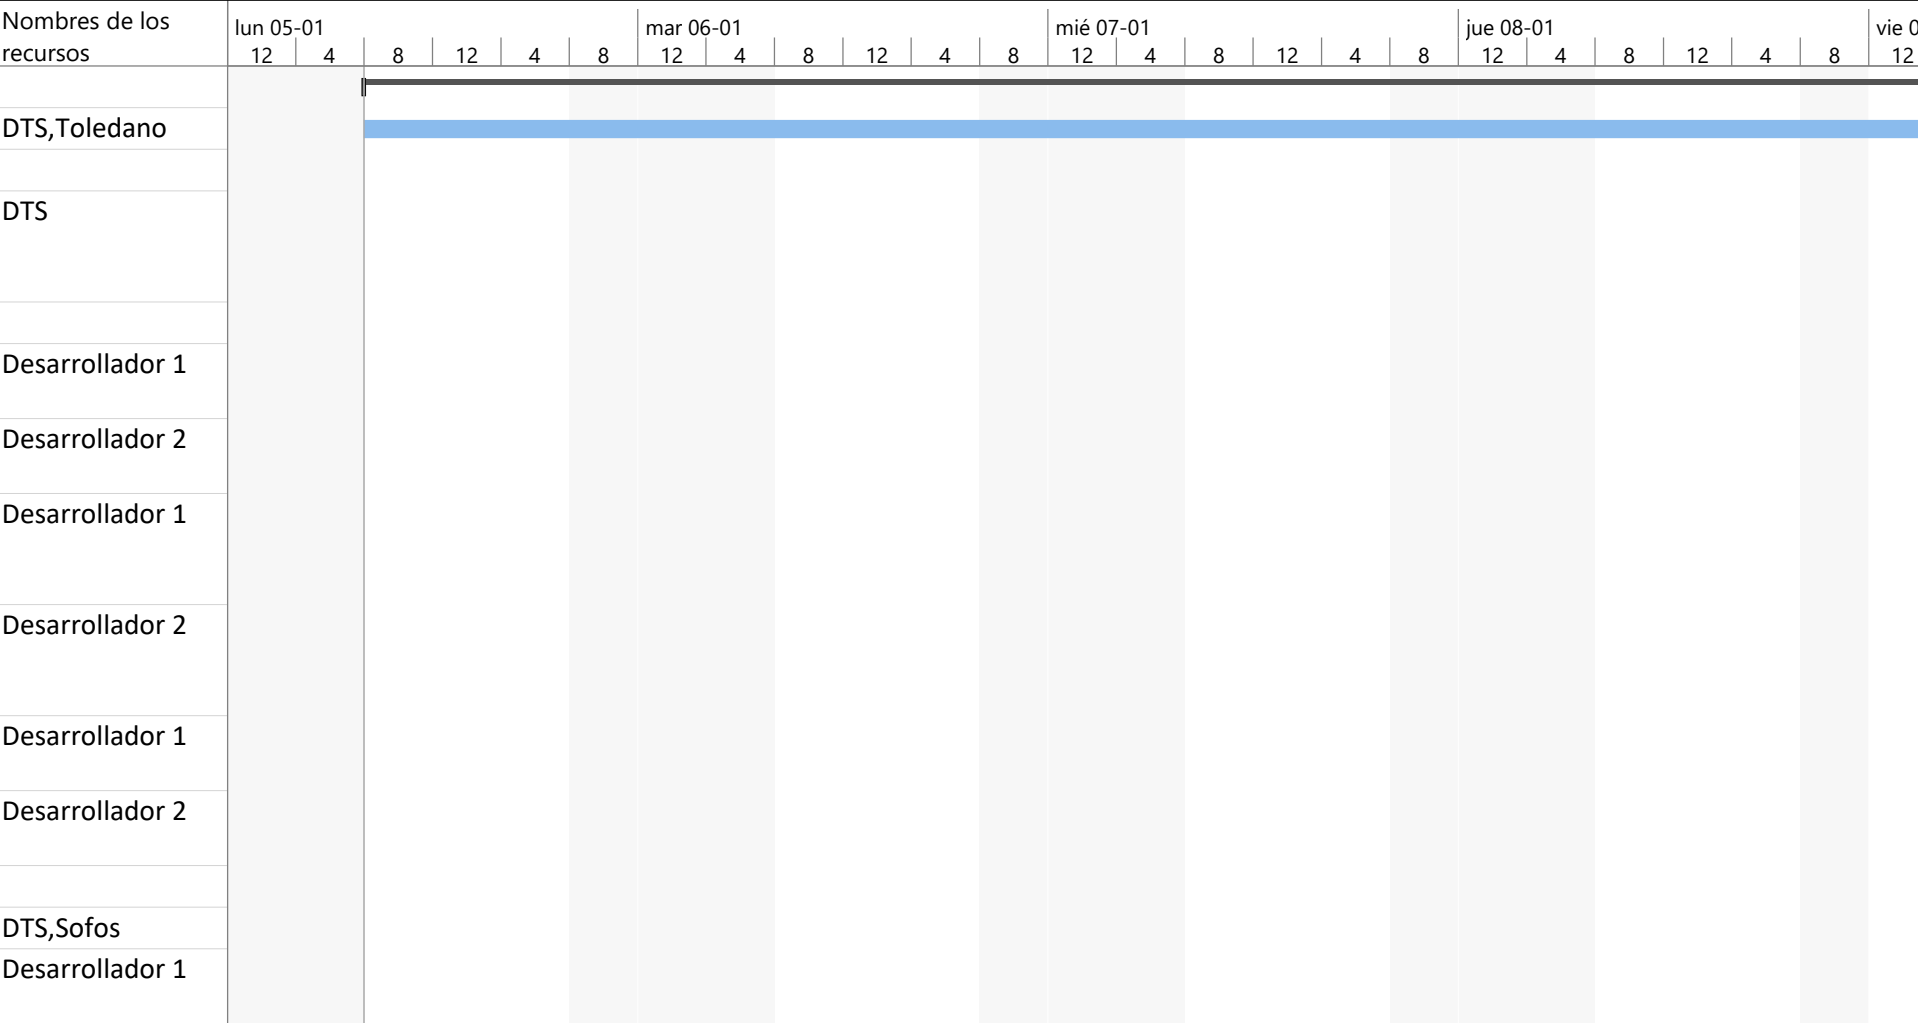

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: jue 16-10-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual


Nombres de los recursos	lun 05-01						mar 06-01						mié 07-01						jue 08-01						vie 0
	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12
Desarrollador 2																									
Desarrollador 1																									
Desarrollador 1																									
Desarrollador 1																									
Desarrollador 1																									
Desarrollador 1																									
Desarrollador 1																									
Desarrollador 2																									
Desarrollador 2																									
Desarrollador 2																									
Desarrollador 1,De																									
Desarrollador 1,De																									
DTS																									
DTS																									

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: jue 16-10-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

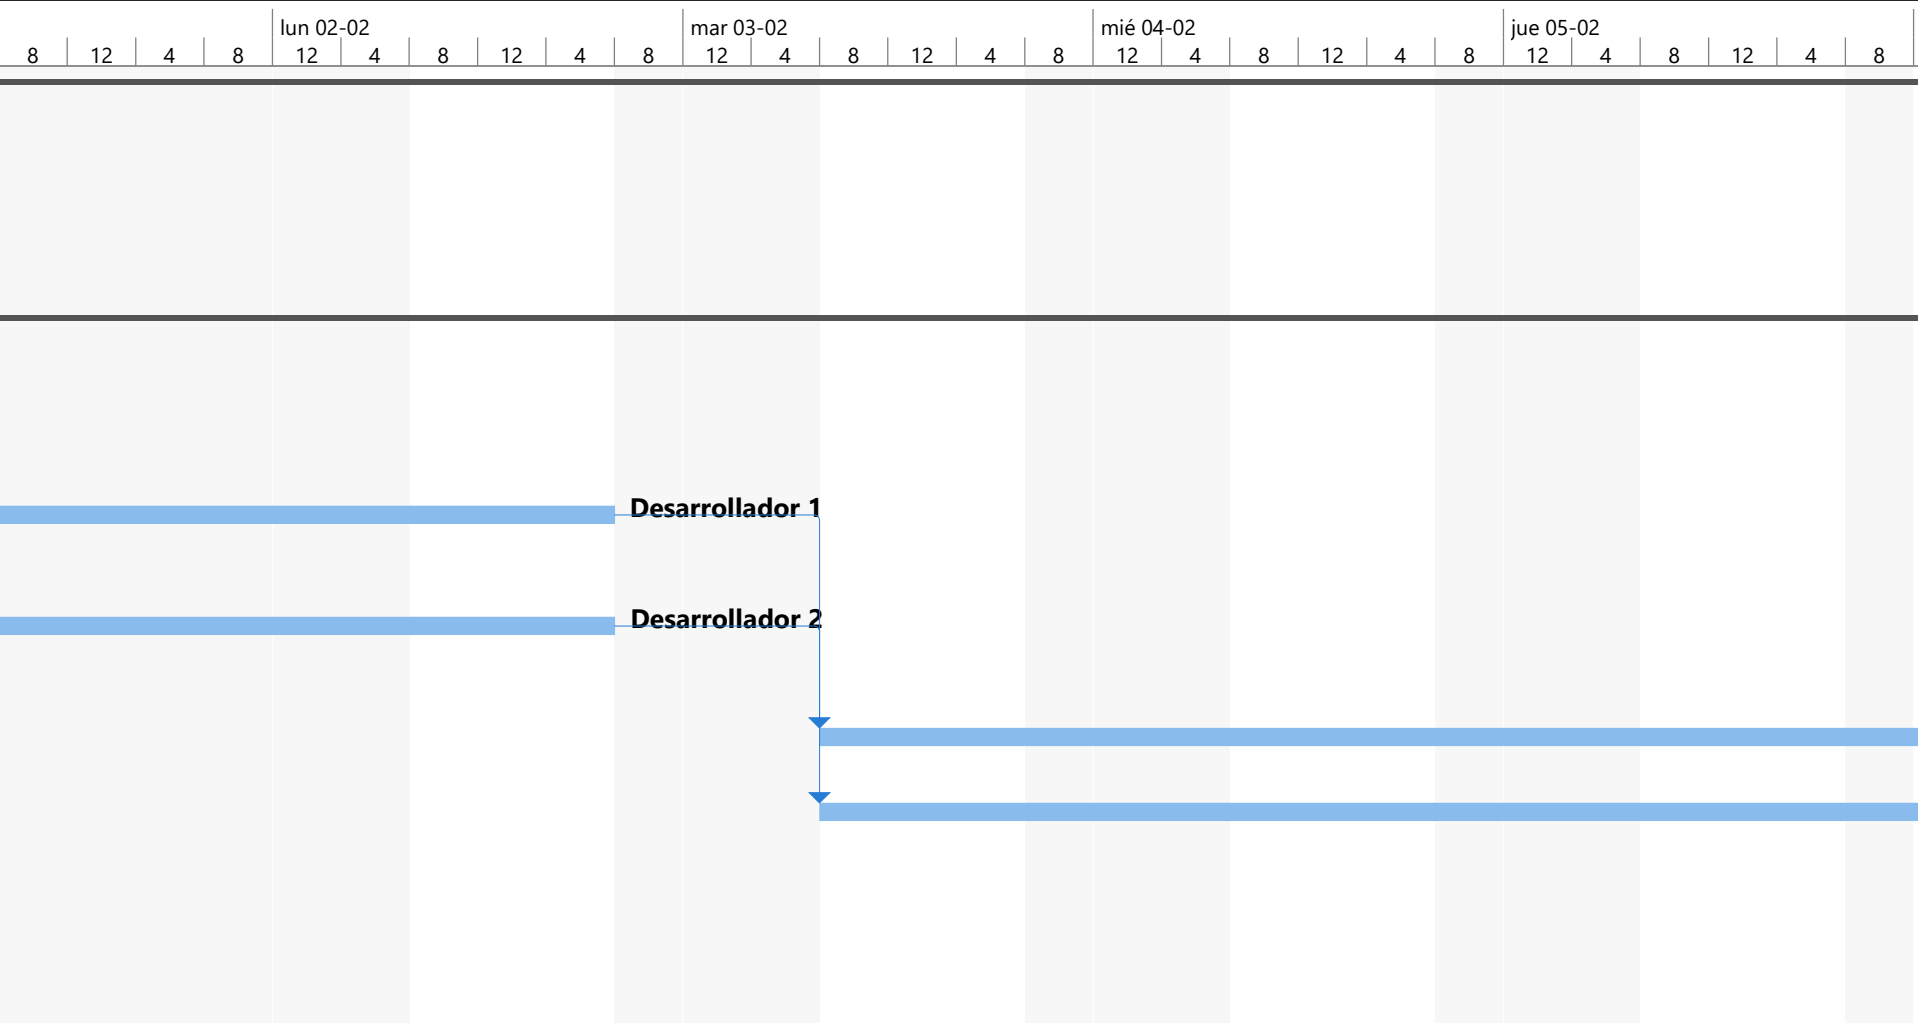


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

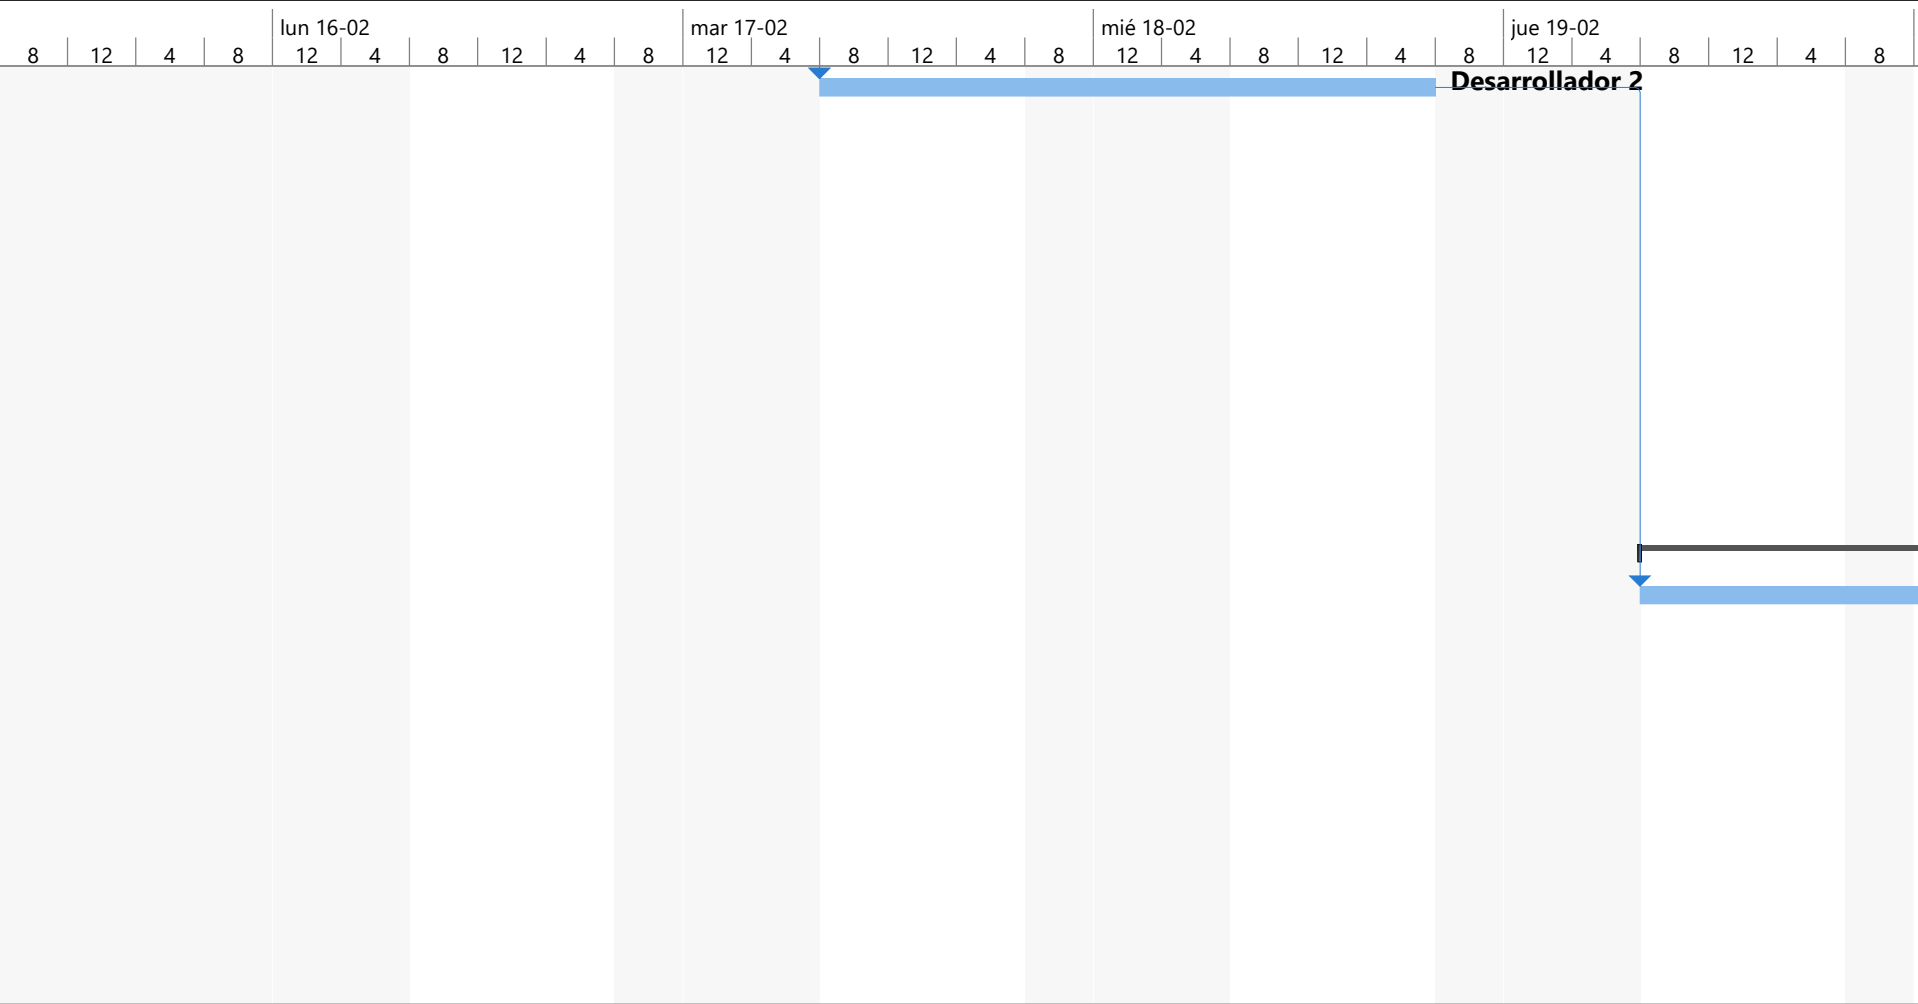

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

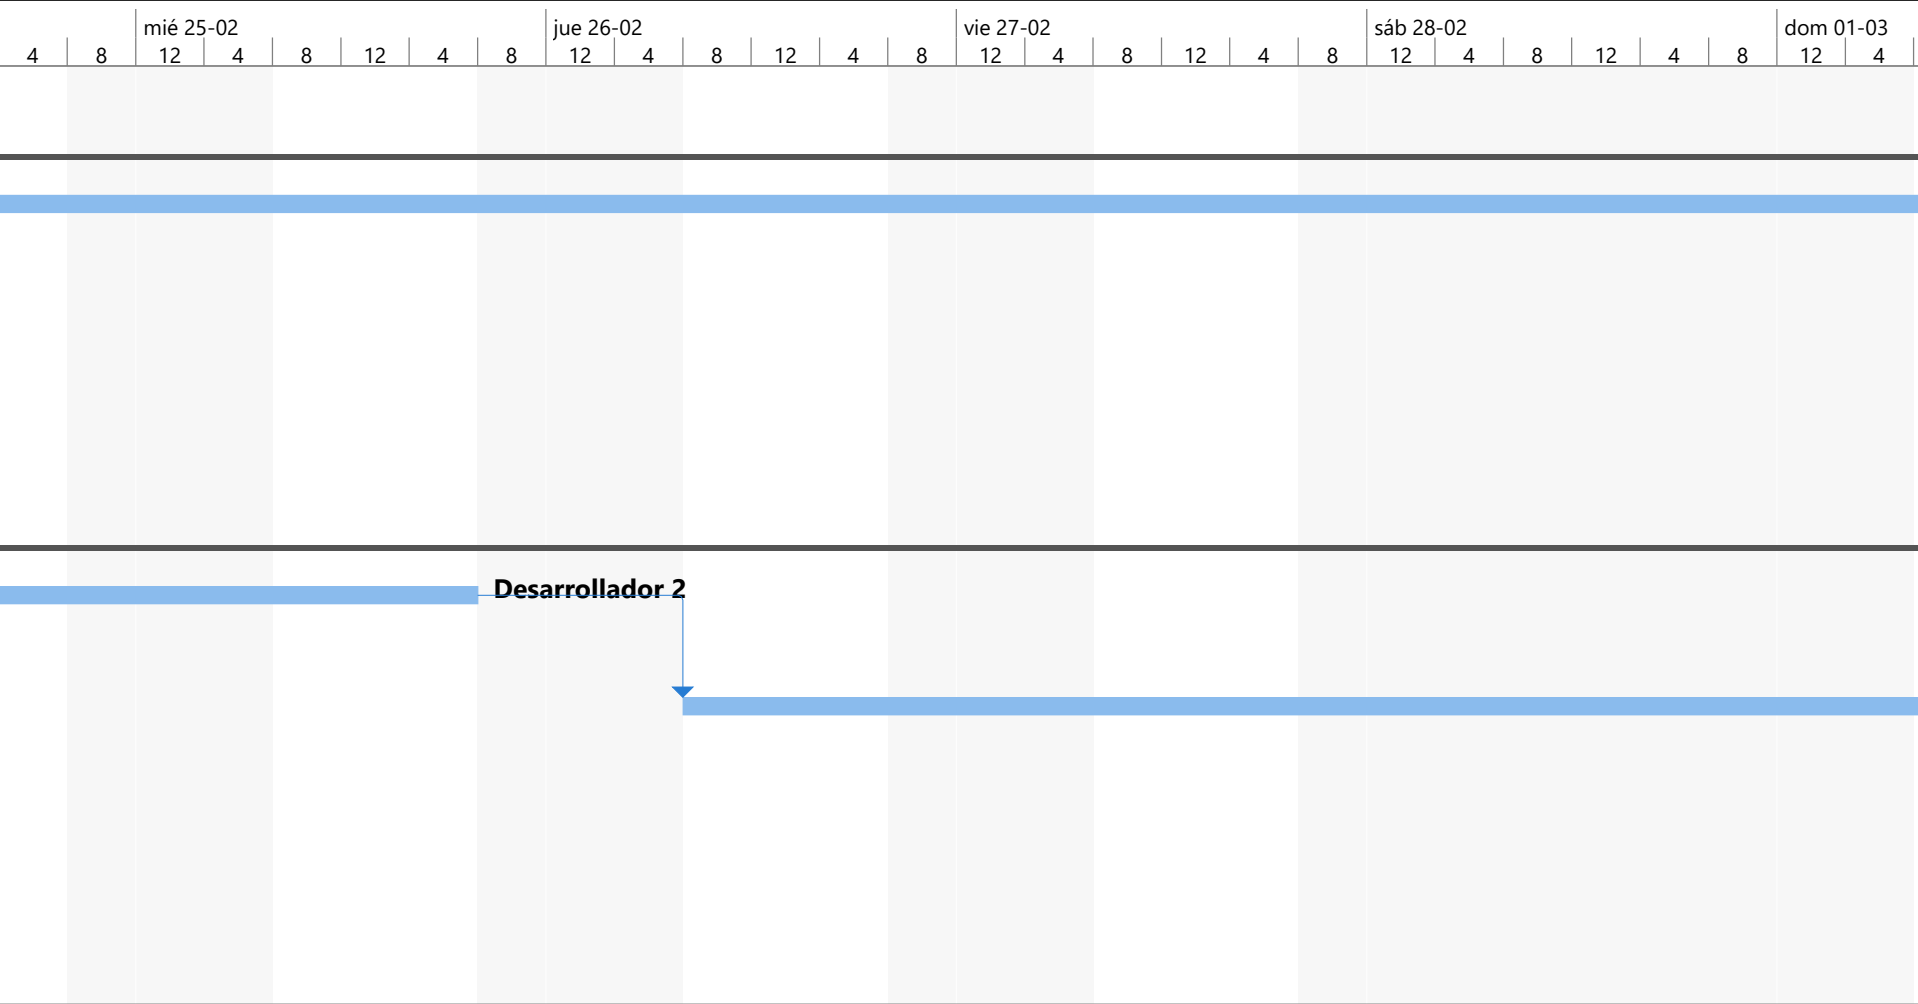


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

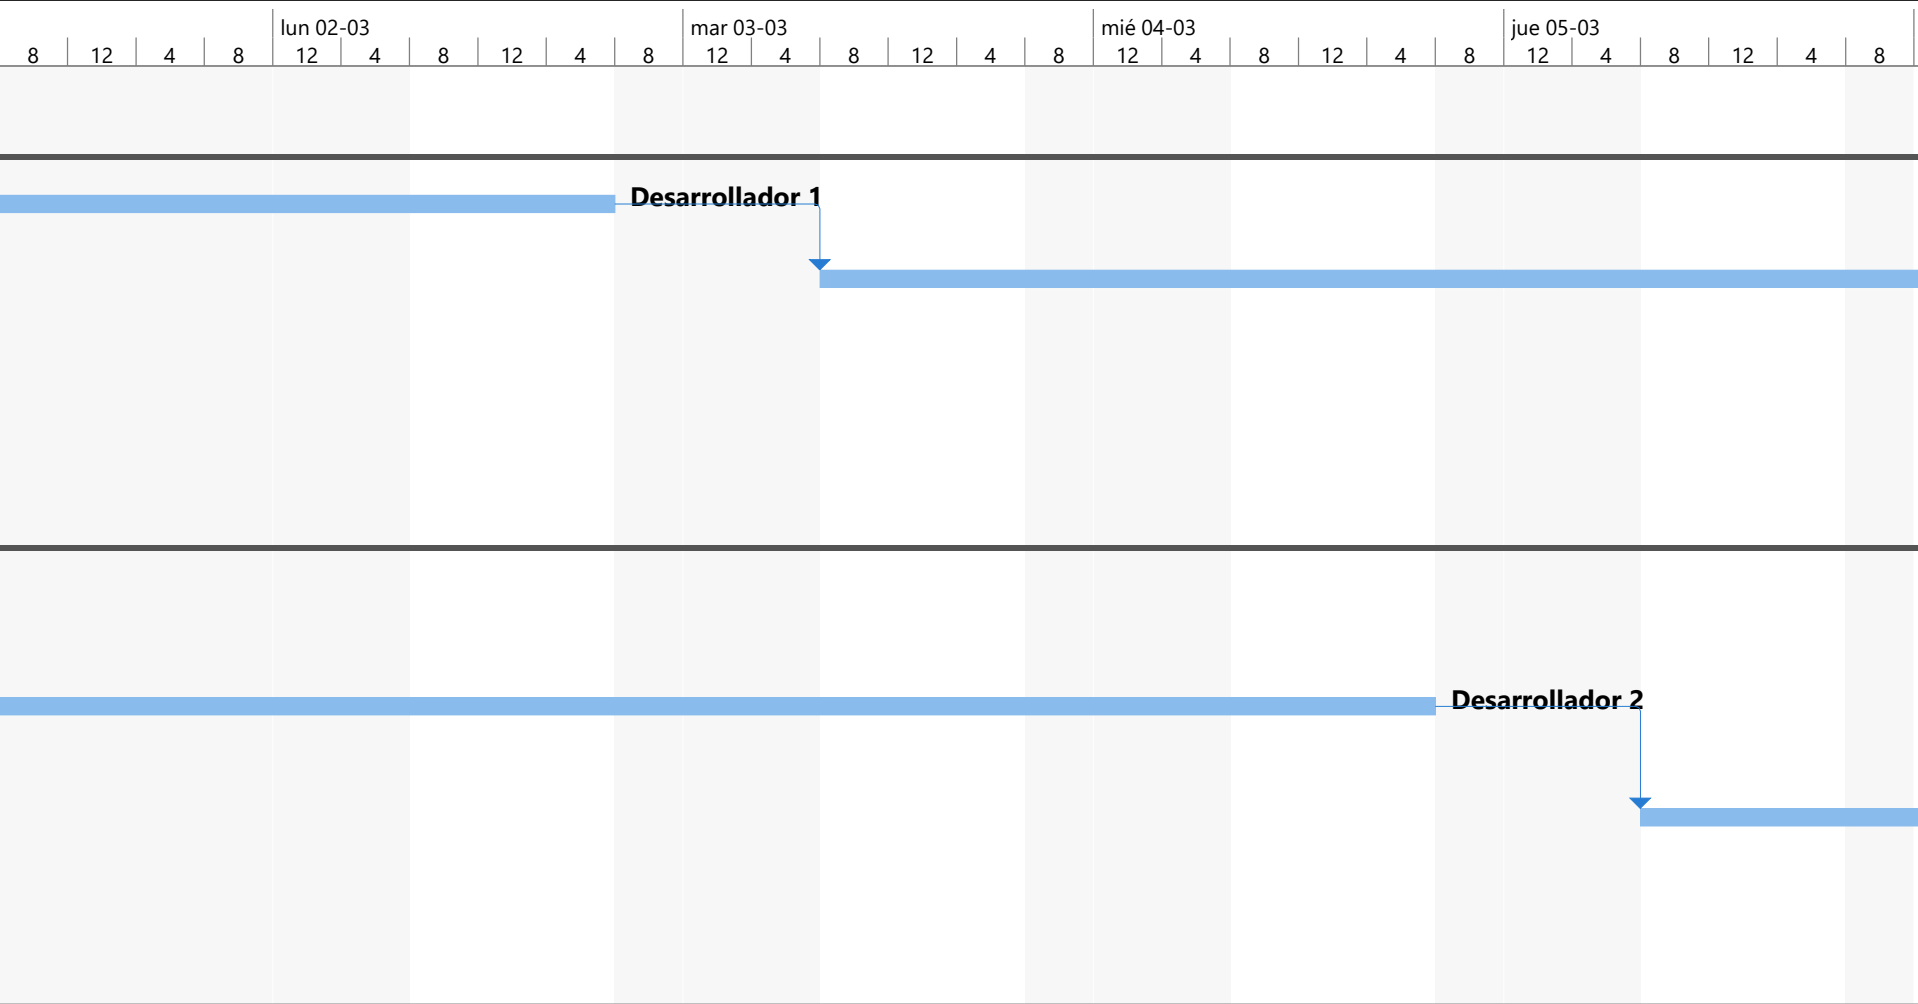


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: jue 16-10-25


Task Name	Start Date	End Date	Task Type	Duration	Progress
Tarea	2023-03-06 12:00	2023-03-06 16:00	Tarea manual	4h	100%
División	2023-03-06 16:00	2023-03-06 20:00	Tarea manual	4h	100%
Hito	2023-03-06 20:00	2023-03-06 20:00	Hito externo	0h	100%
Resumen	2023-03-06 20:00	2023-03-07 08:00	Resumen manual	12h	100%
Resumen del proyecto	2023-03-07 08:00	2023-03-07 12:00	Resumen manual	4h	100%
Tarea inactiva	2023-03-07 12:00	2023-03-07 16:00	Tarea manual	4h	0%
Hito inactivo	2023-03-07 16:00	2023-03-07 16:00	Hito externo	0h	0%
Tarea	2023-03-07 16:00	2023-03-07 20:00	Tarea manual	4h	100%
División	2023-03-07 20:00	2023-03-08 08:00	Tarea manual	12h	100%
Hito	2023-03-08 08:00	2023-03-08 08:00	Hito externo	0h	100%
Resumen	2023-03-08 08:00	2023-03-08 12:00	Resumen manual	4h	100%
Resumen del proyecto	2023-03-08 12:00	2023-03-08 16:00	Resumen manual	4h	100%
Tarea inactiva	2023-03-08 16:00	2023-03-08 20:00	Tarea manual	4h	0%
Hito inactivo	2023-03-08 20:00	2023-03-08 20:00	Hito externo	0h	0%
Tarea	2023-03-08 20:00	2023-03-09 08:00	Tarea manual	12h	100%
División	2023-03-09 08:00	2023-03-09 12:00	Tarea manual	4h	100%
Hito	2023-03-09 12:00	2023-03-09 12:00	Hito externo	0h	100%
Resumen	2023-03-09 12:00	2023-03-09 16:00	Resumen manual	4h	100%
Resumen del proyecto	2023-03-09 16:00	2023-03-09 20:00	Resumen manual	4h	100%
Tarea inactiva	2023-03-09 20:00	2023-03-10 08:00	Tarea manual	12h	0%
Hito inactivo	2023-03-10 08:00	2023-03-10 08:00	Hito externo	0h	0%
Tarea	2023-03-10 08:00	2023-03-10 12:00	Tarea manual	4h	100%
División	2023-03-10 12:00	2023-03-10 16:00	Tarea manual	4h	100%
Hito	2023-03-10 16:00	2023-03-10 16:00	Hito externo	0h	100%
Resumen	2023-03-10 16:00	2023-03-10 20:00	Resumen manual	4h	100%
Resumen del proyecto	2023-03-10 20:00	2023-03-11 08:00	Resumen manual	12h	100%
Tarea inactiva	2023-03-11 08:00	2023-03-11 12:00	Tarea manual	4h	0%
Hito inactivo	2023-03-11 12:00	2023-03-11 12:00	Hito externo	0h	0%

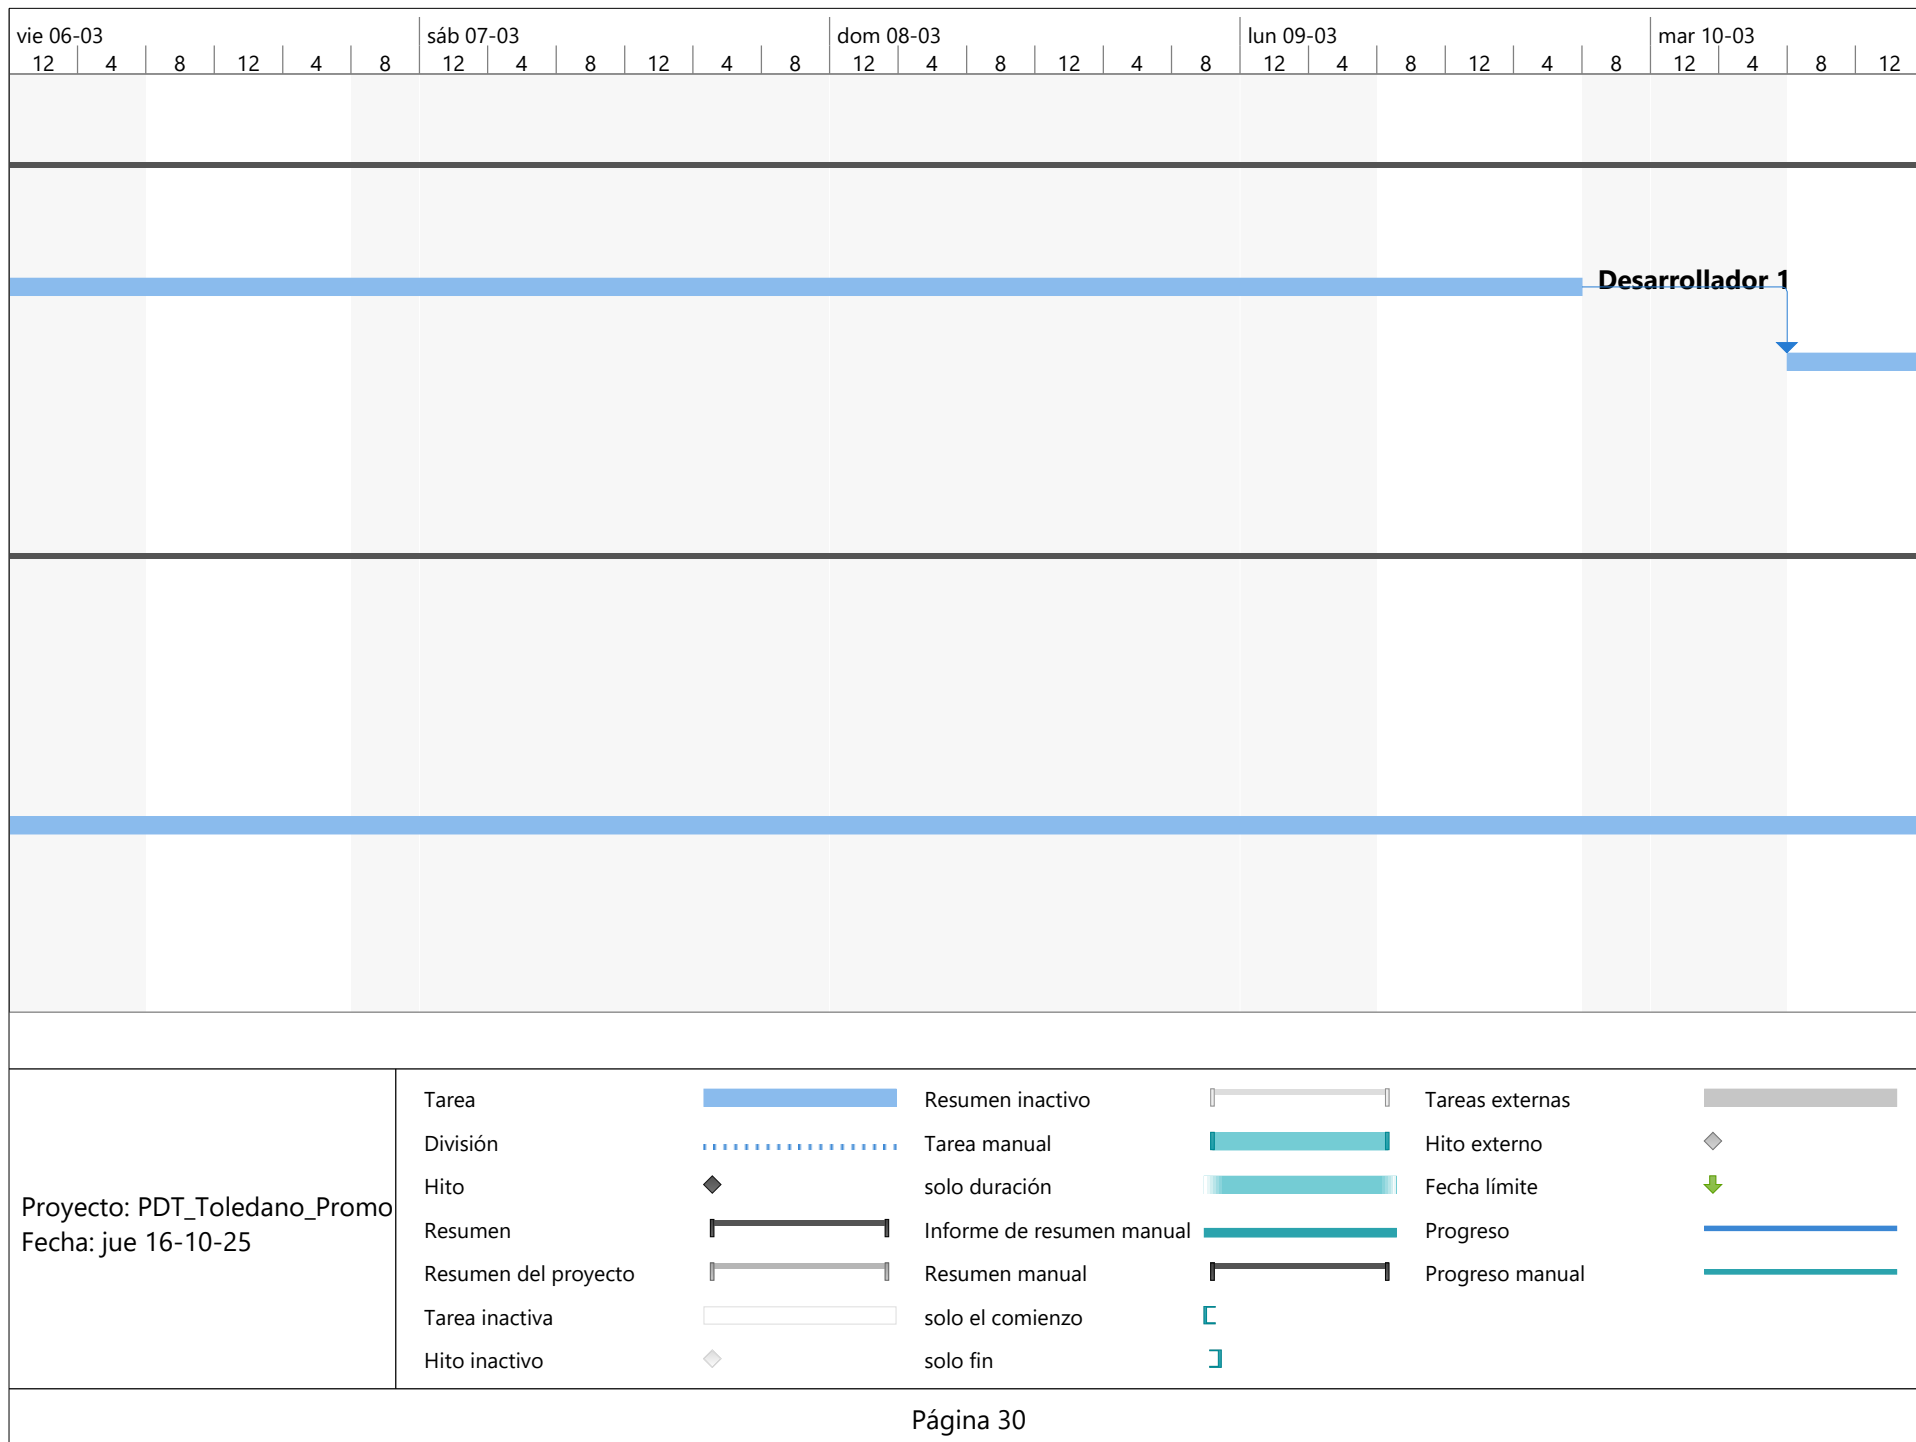


[illegible]

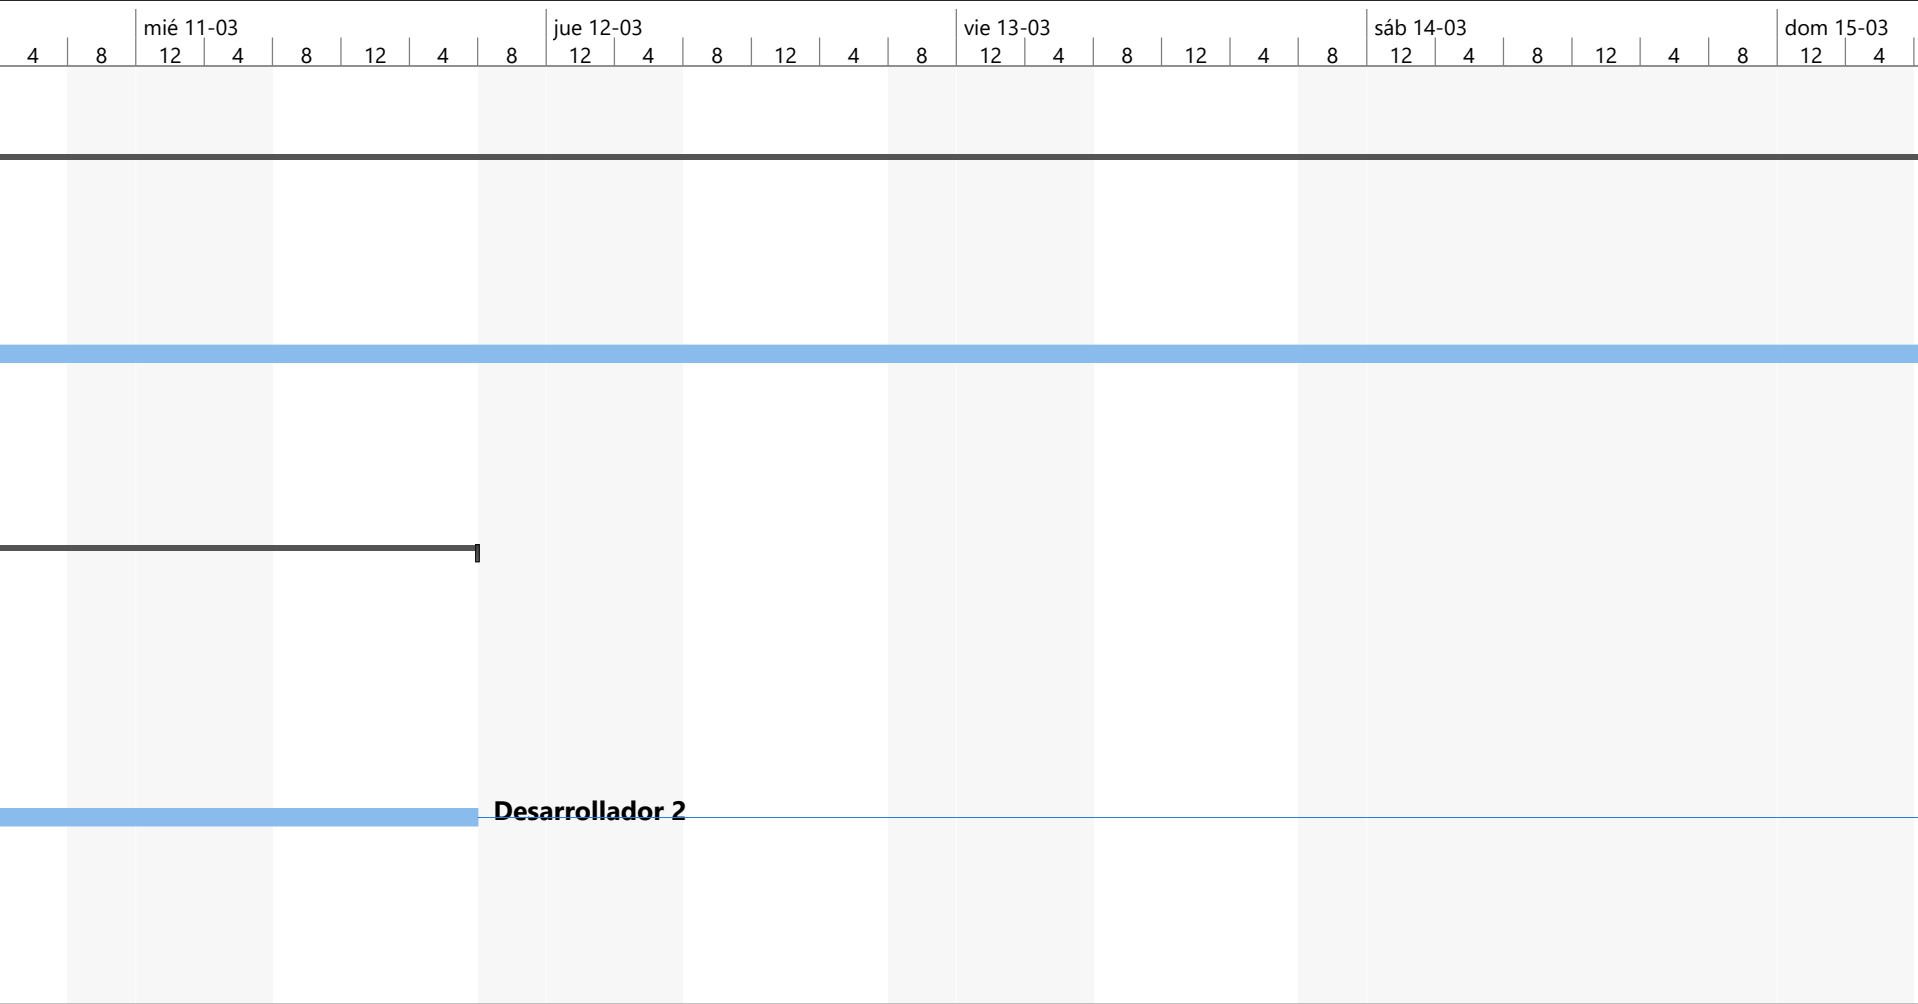


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

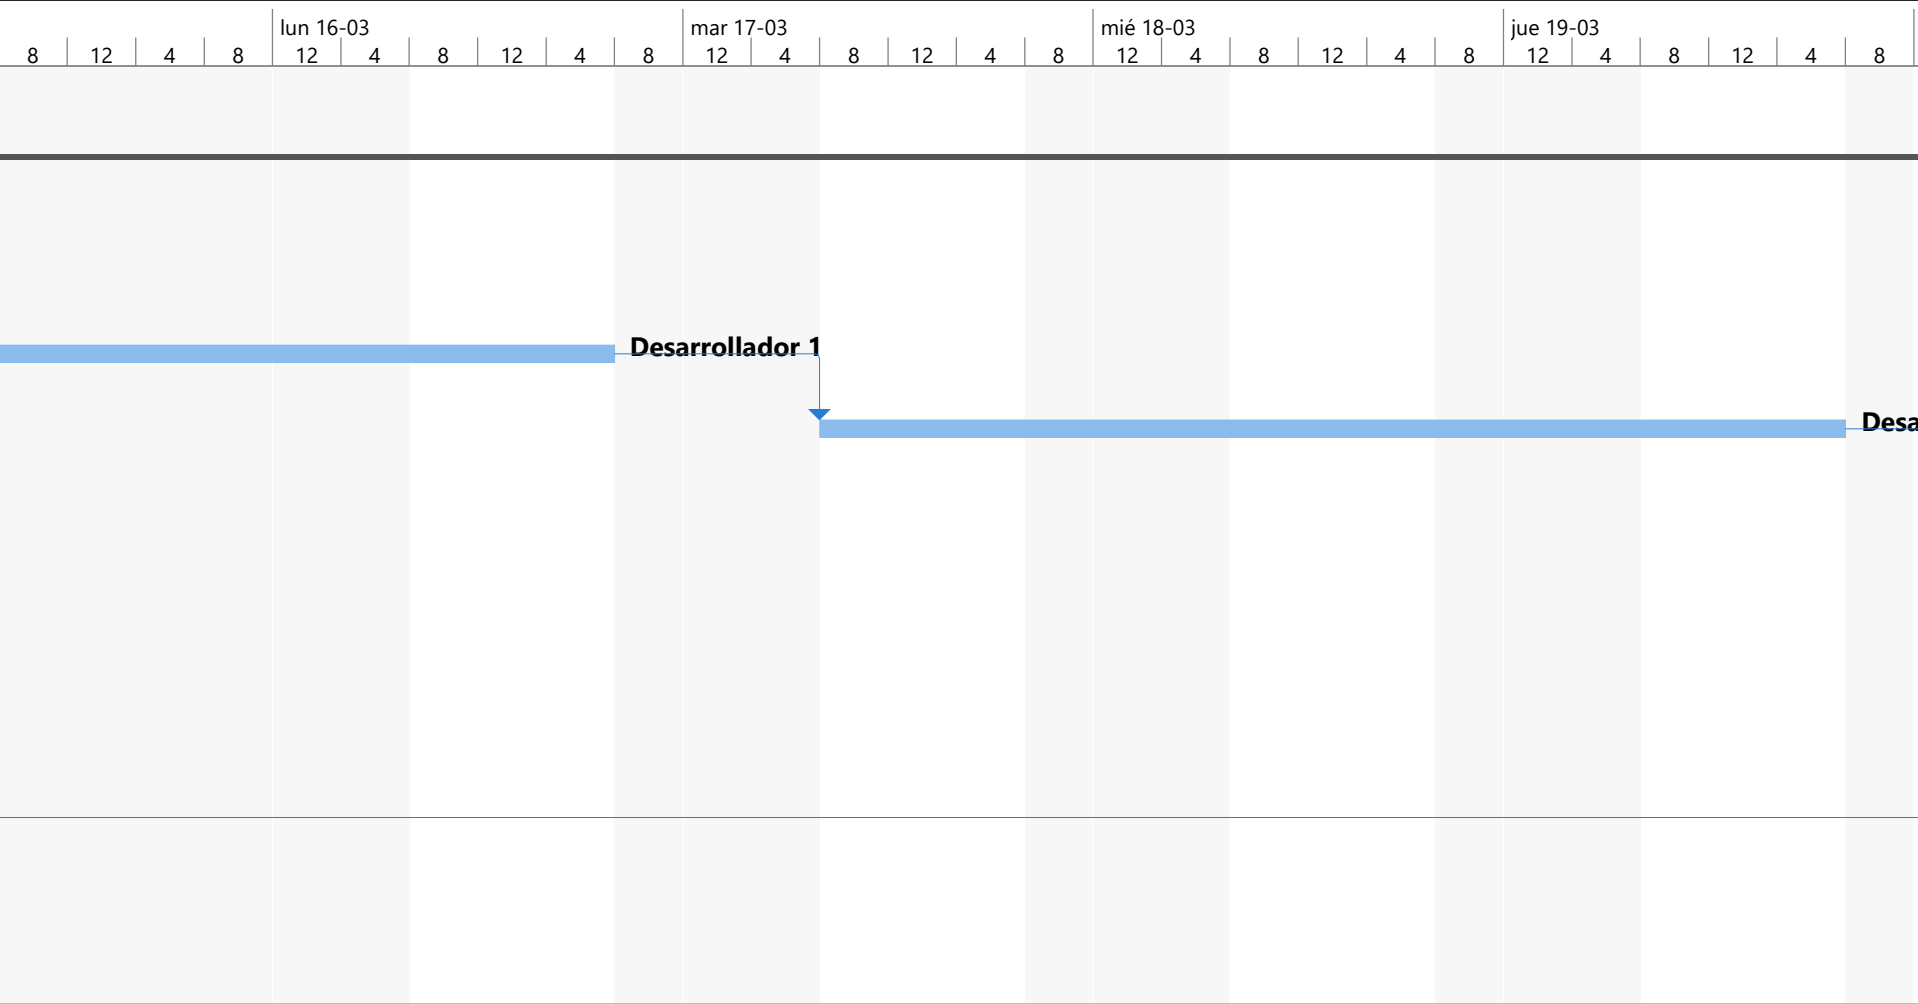


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

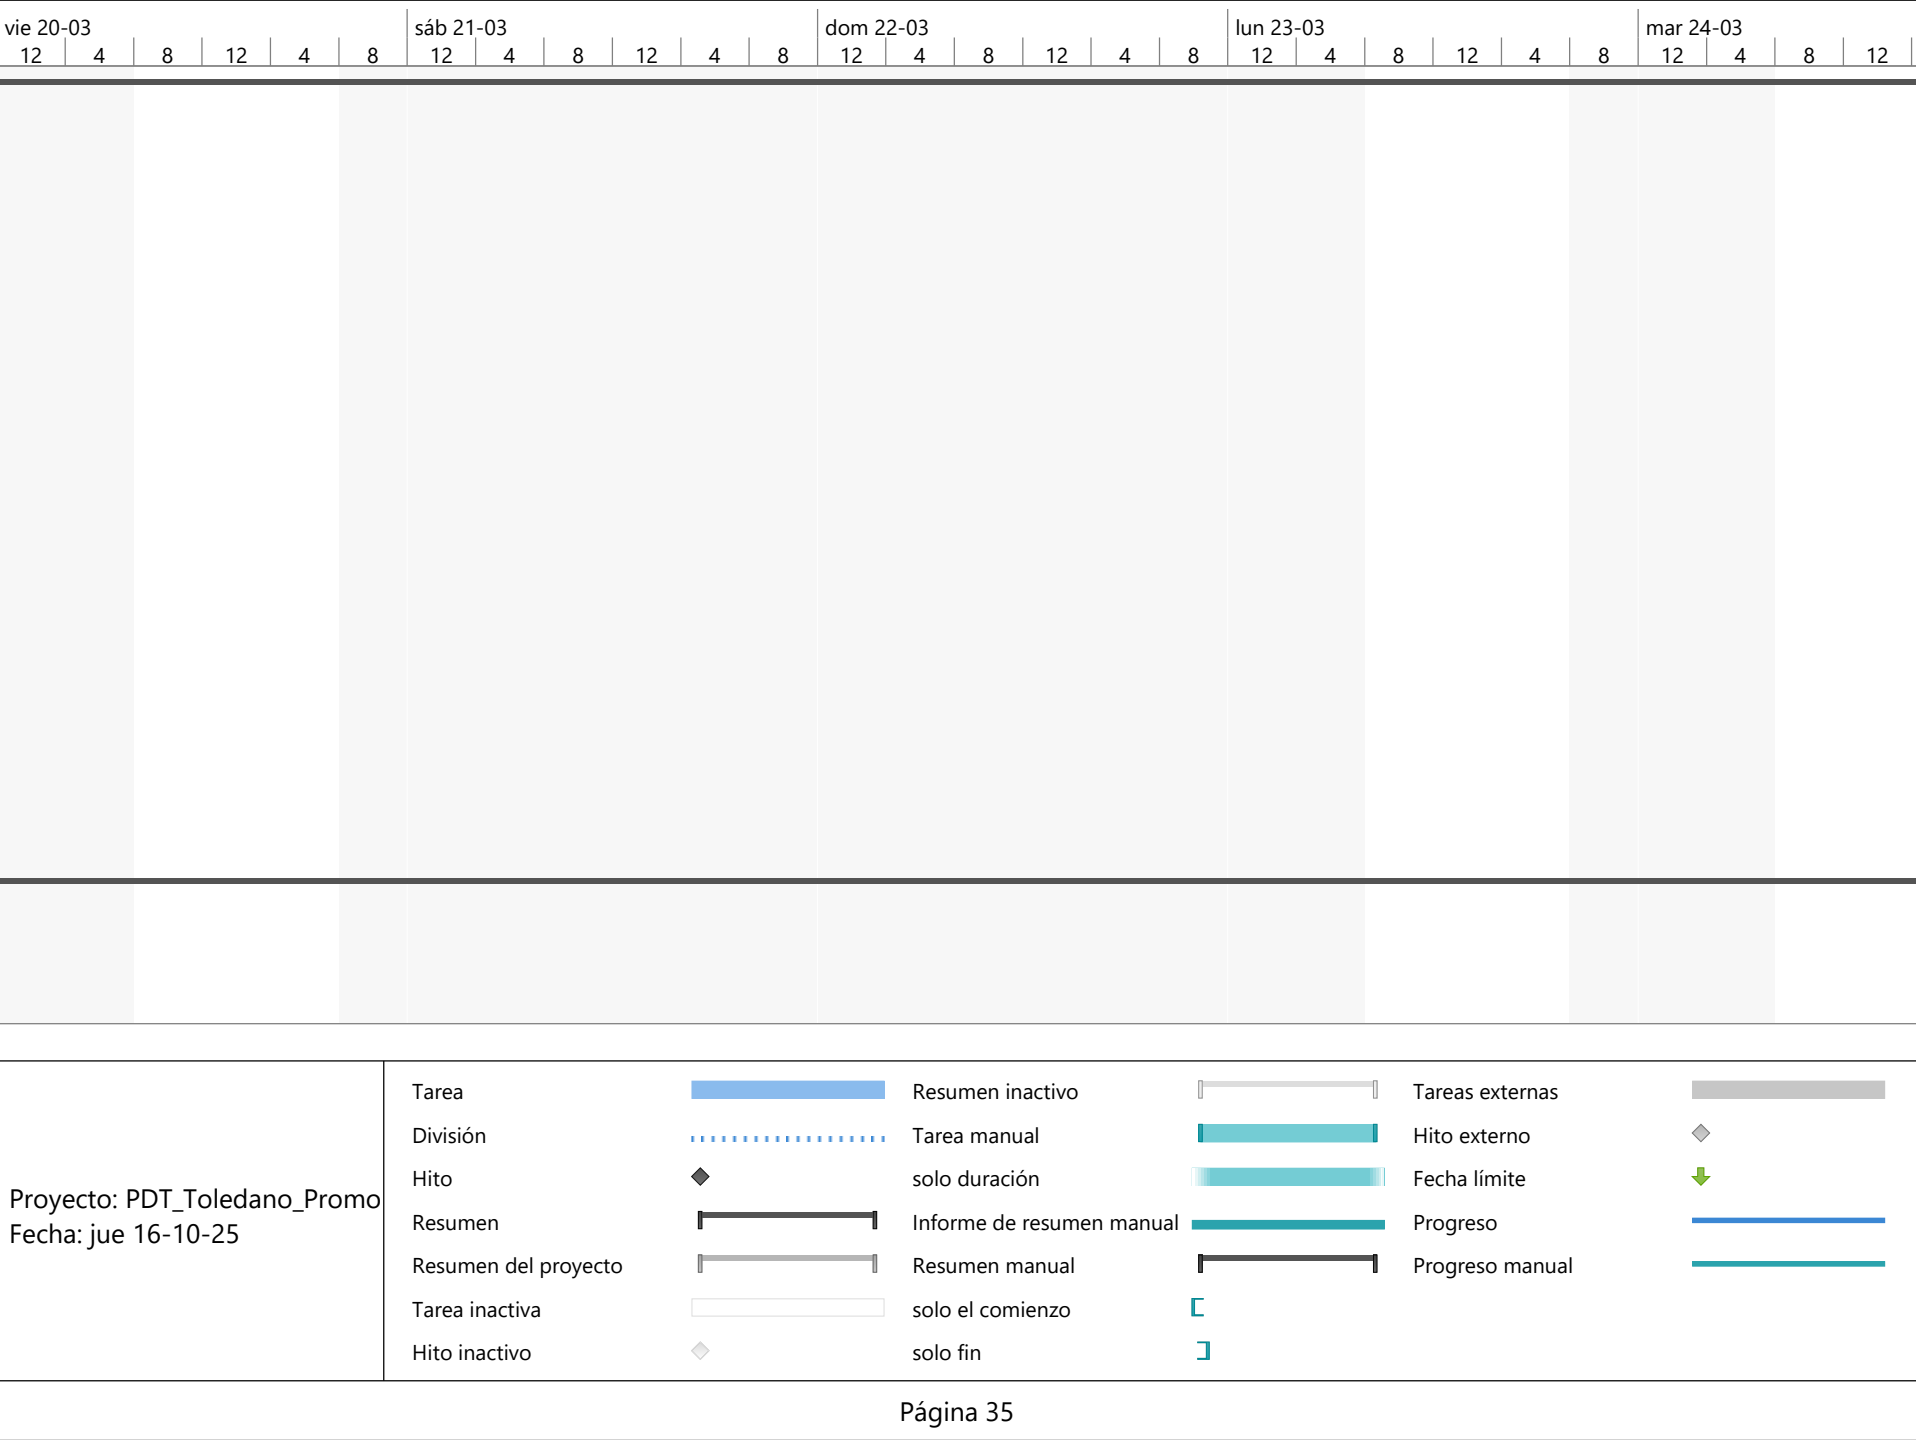

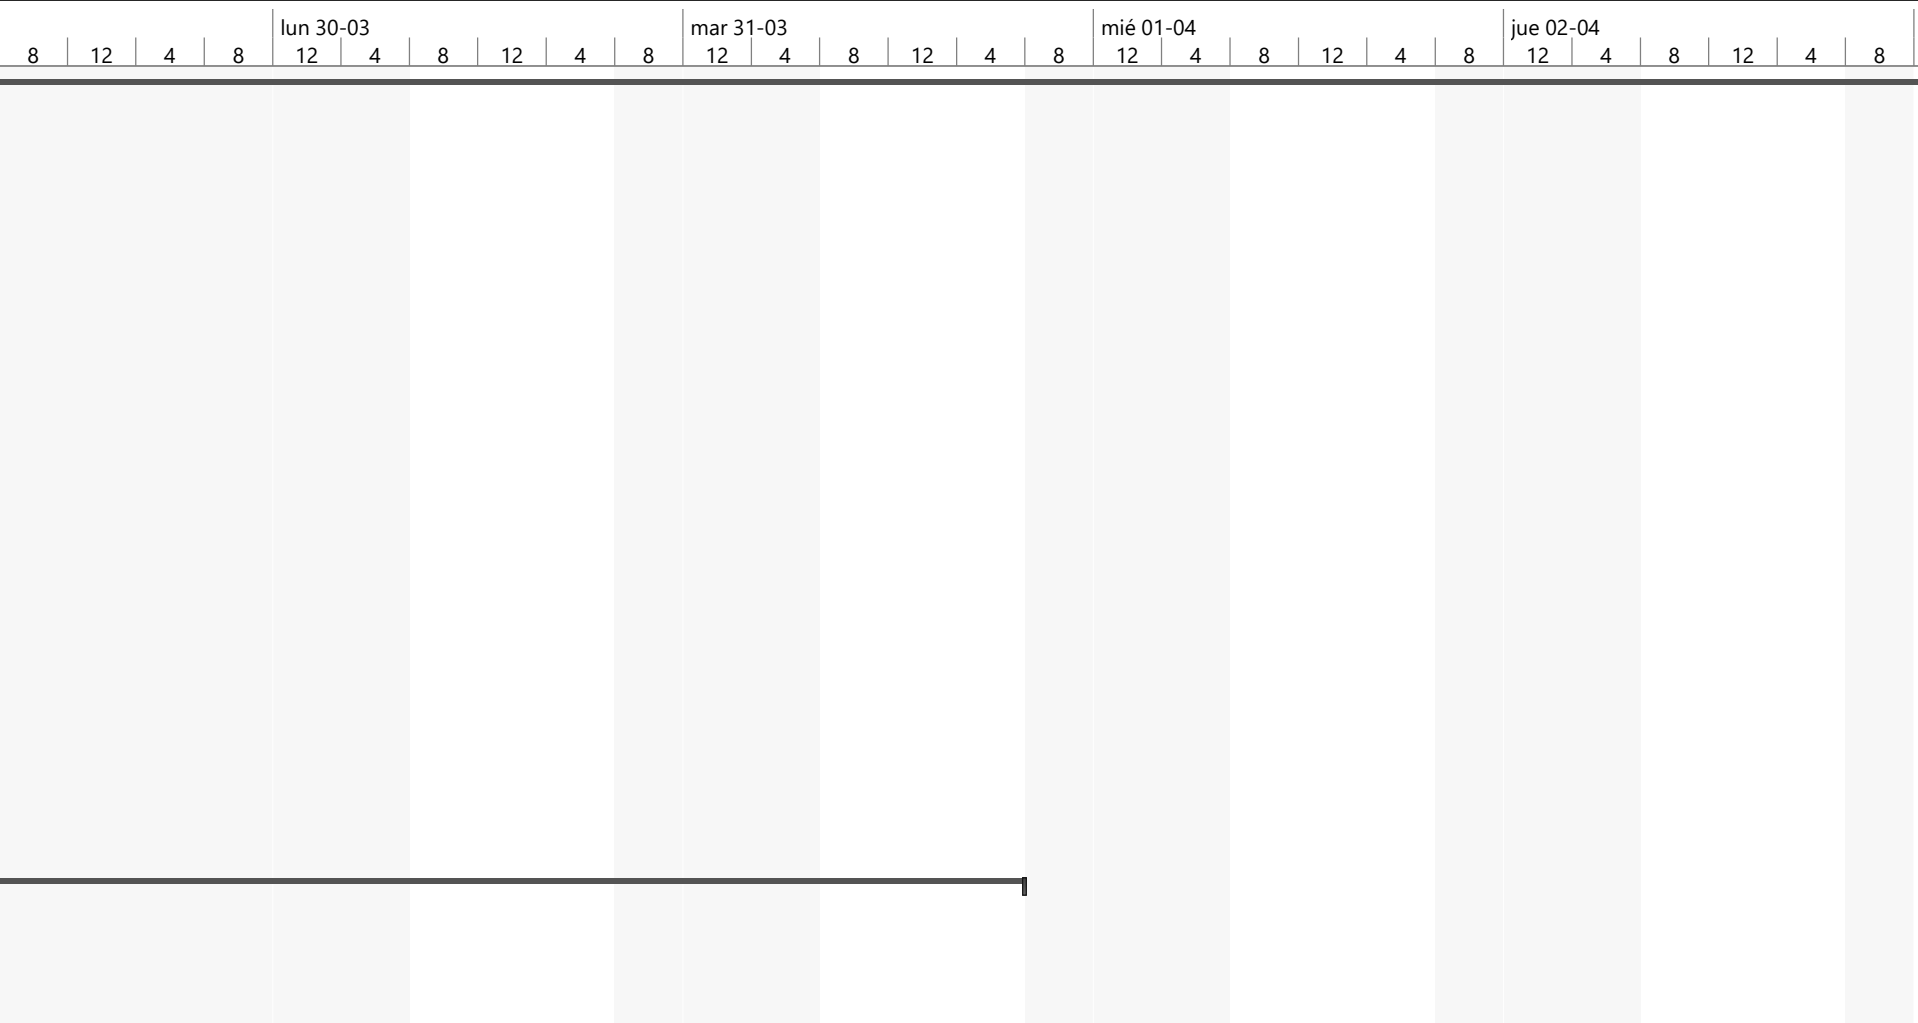



Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

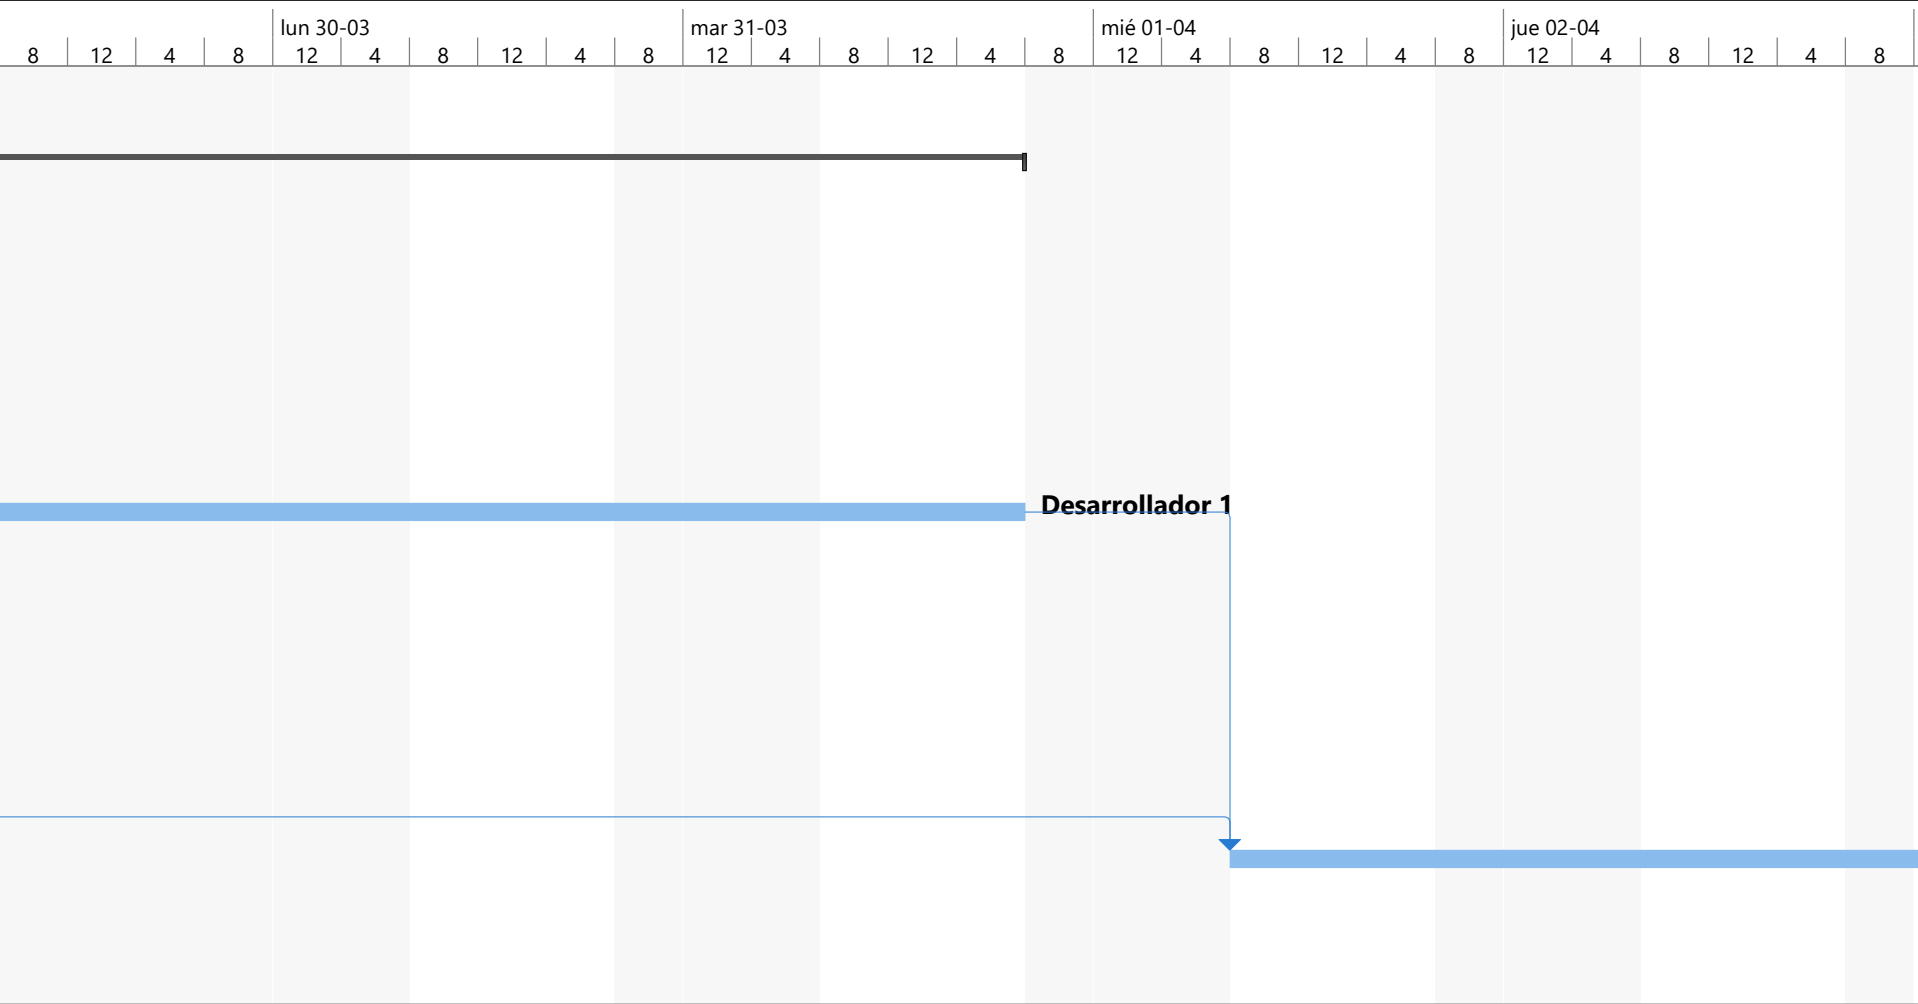


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


[illegible]

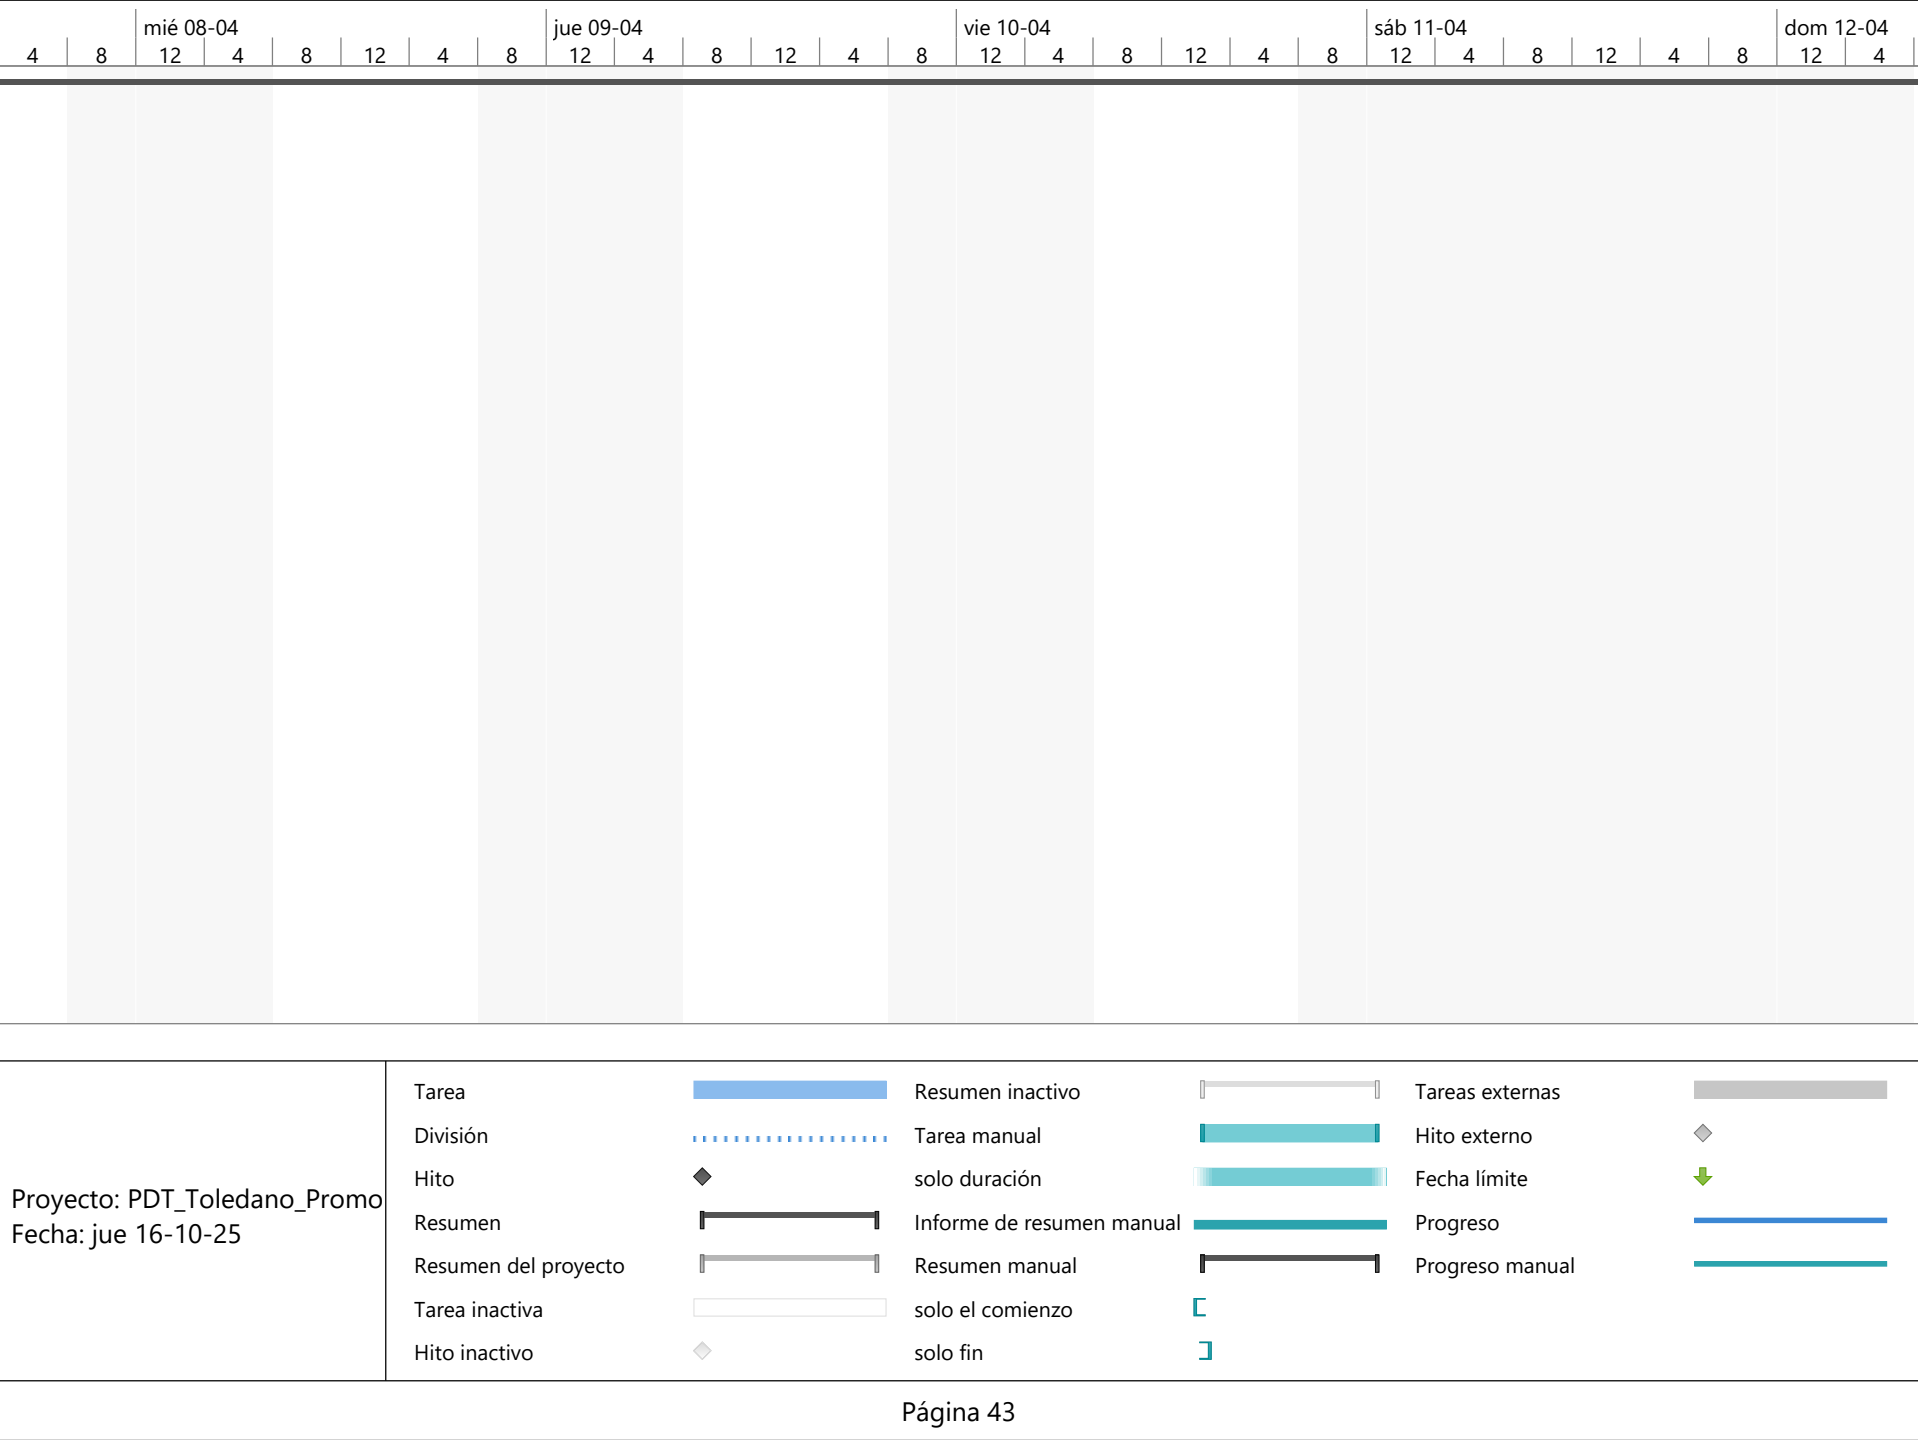

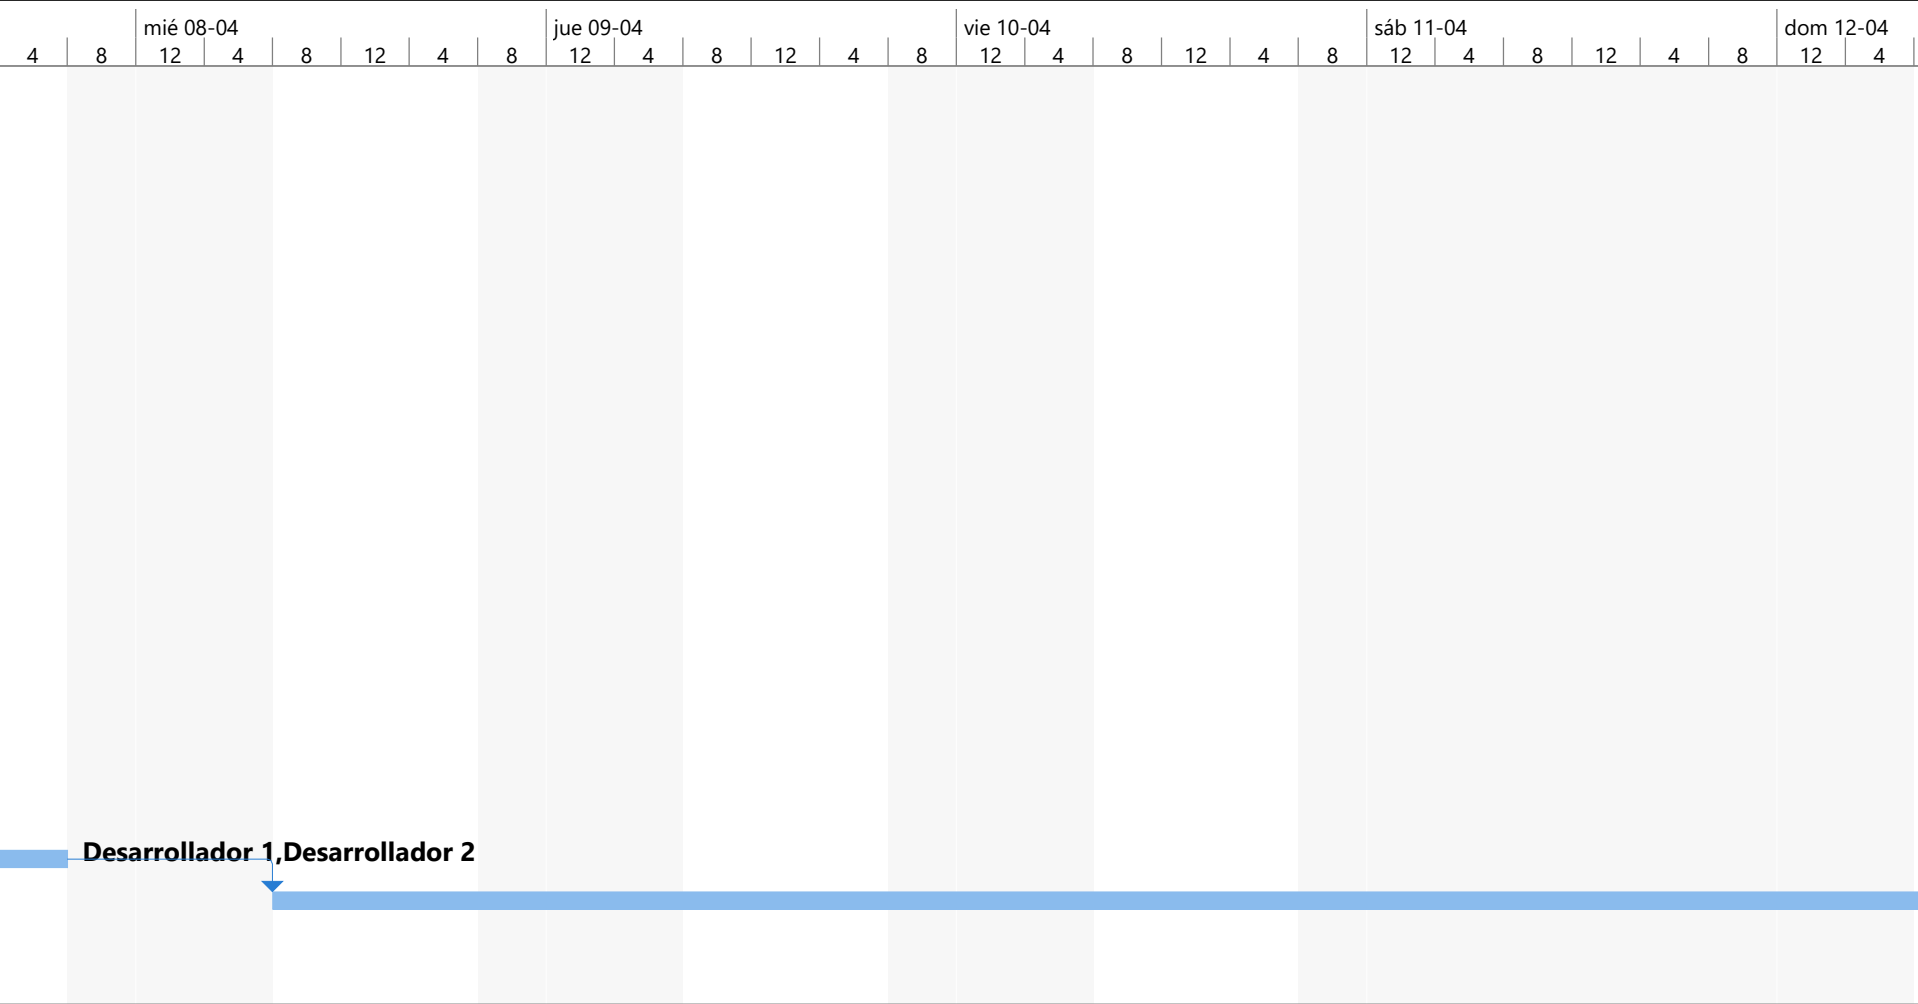


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

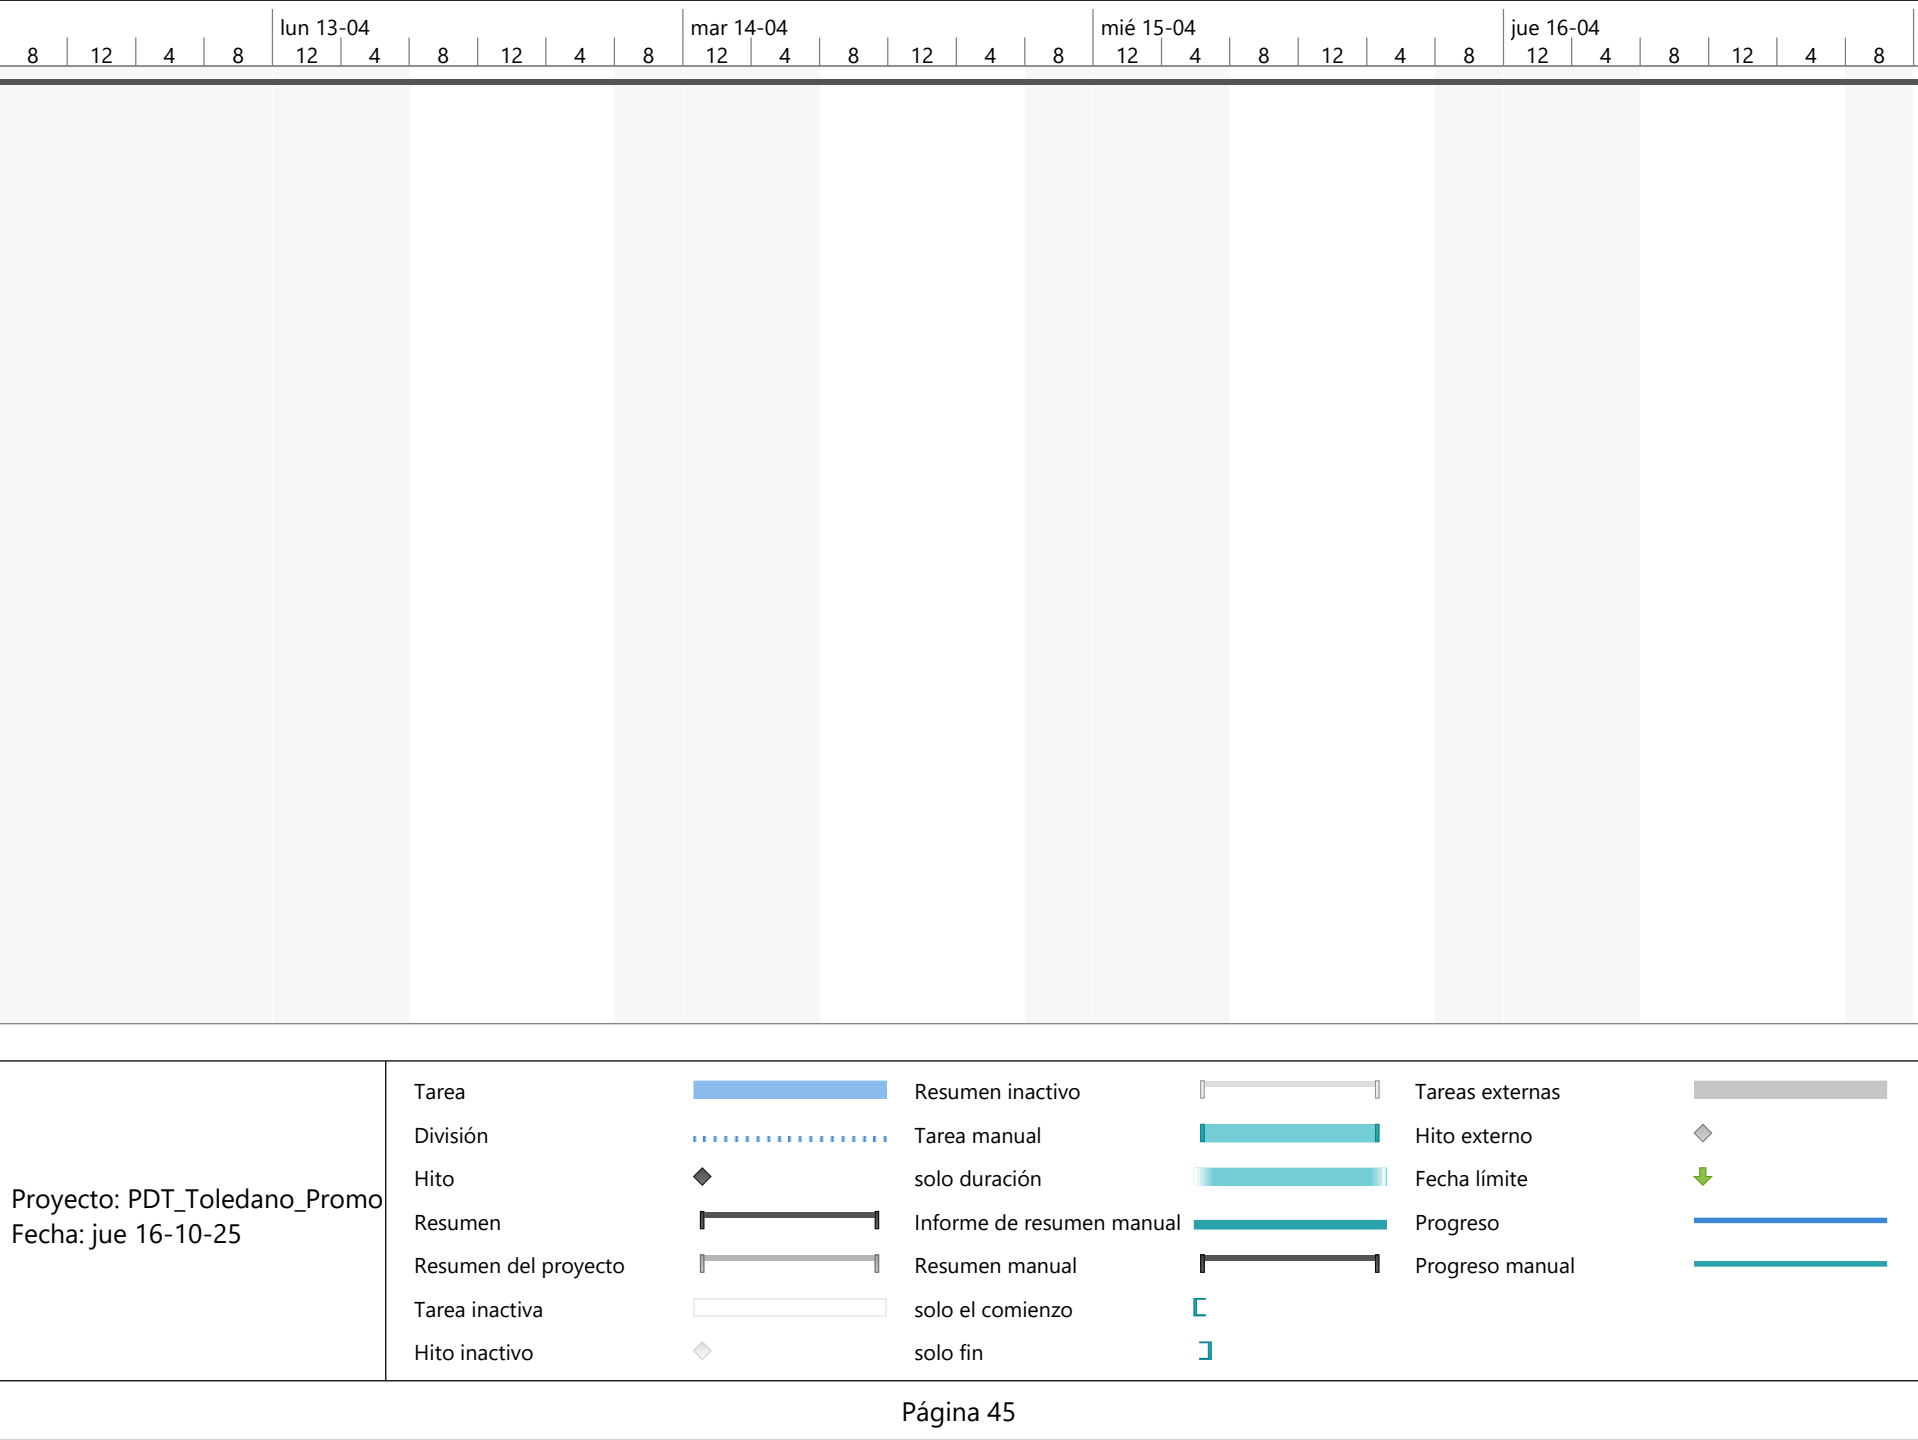


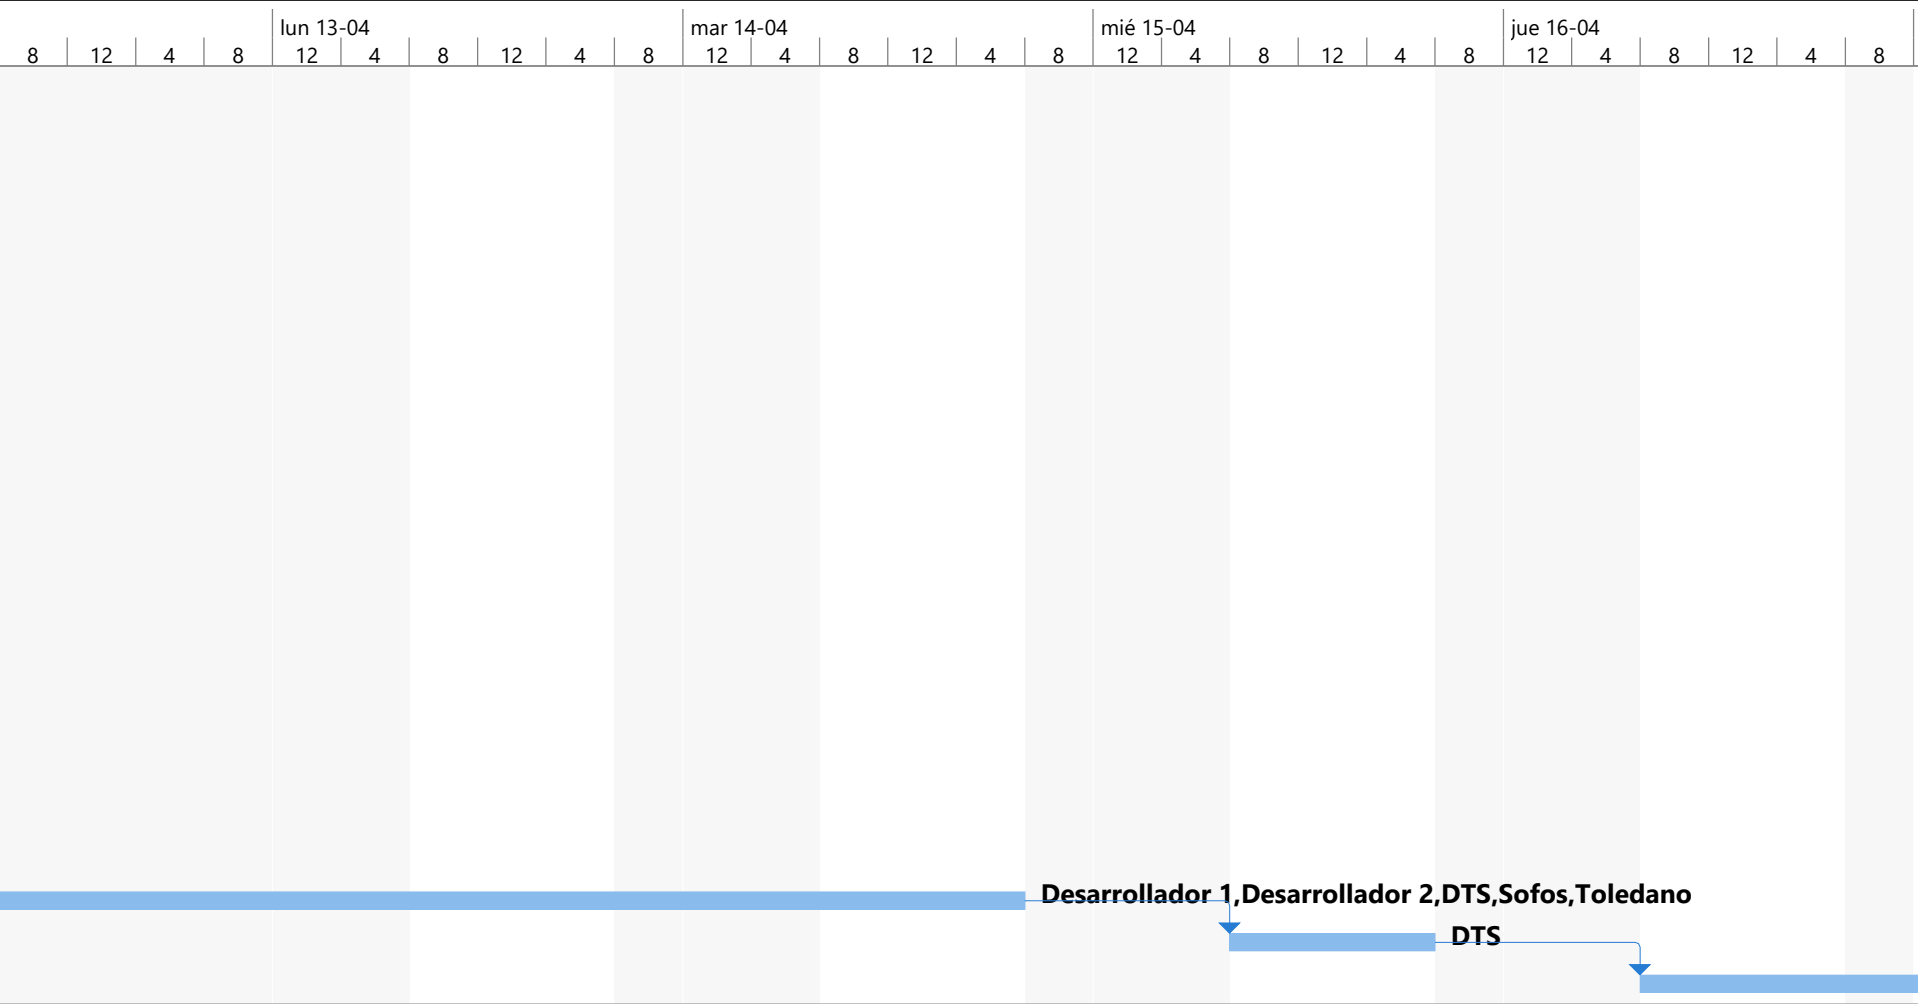

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

[illegible]

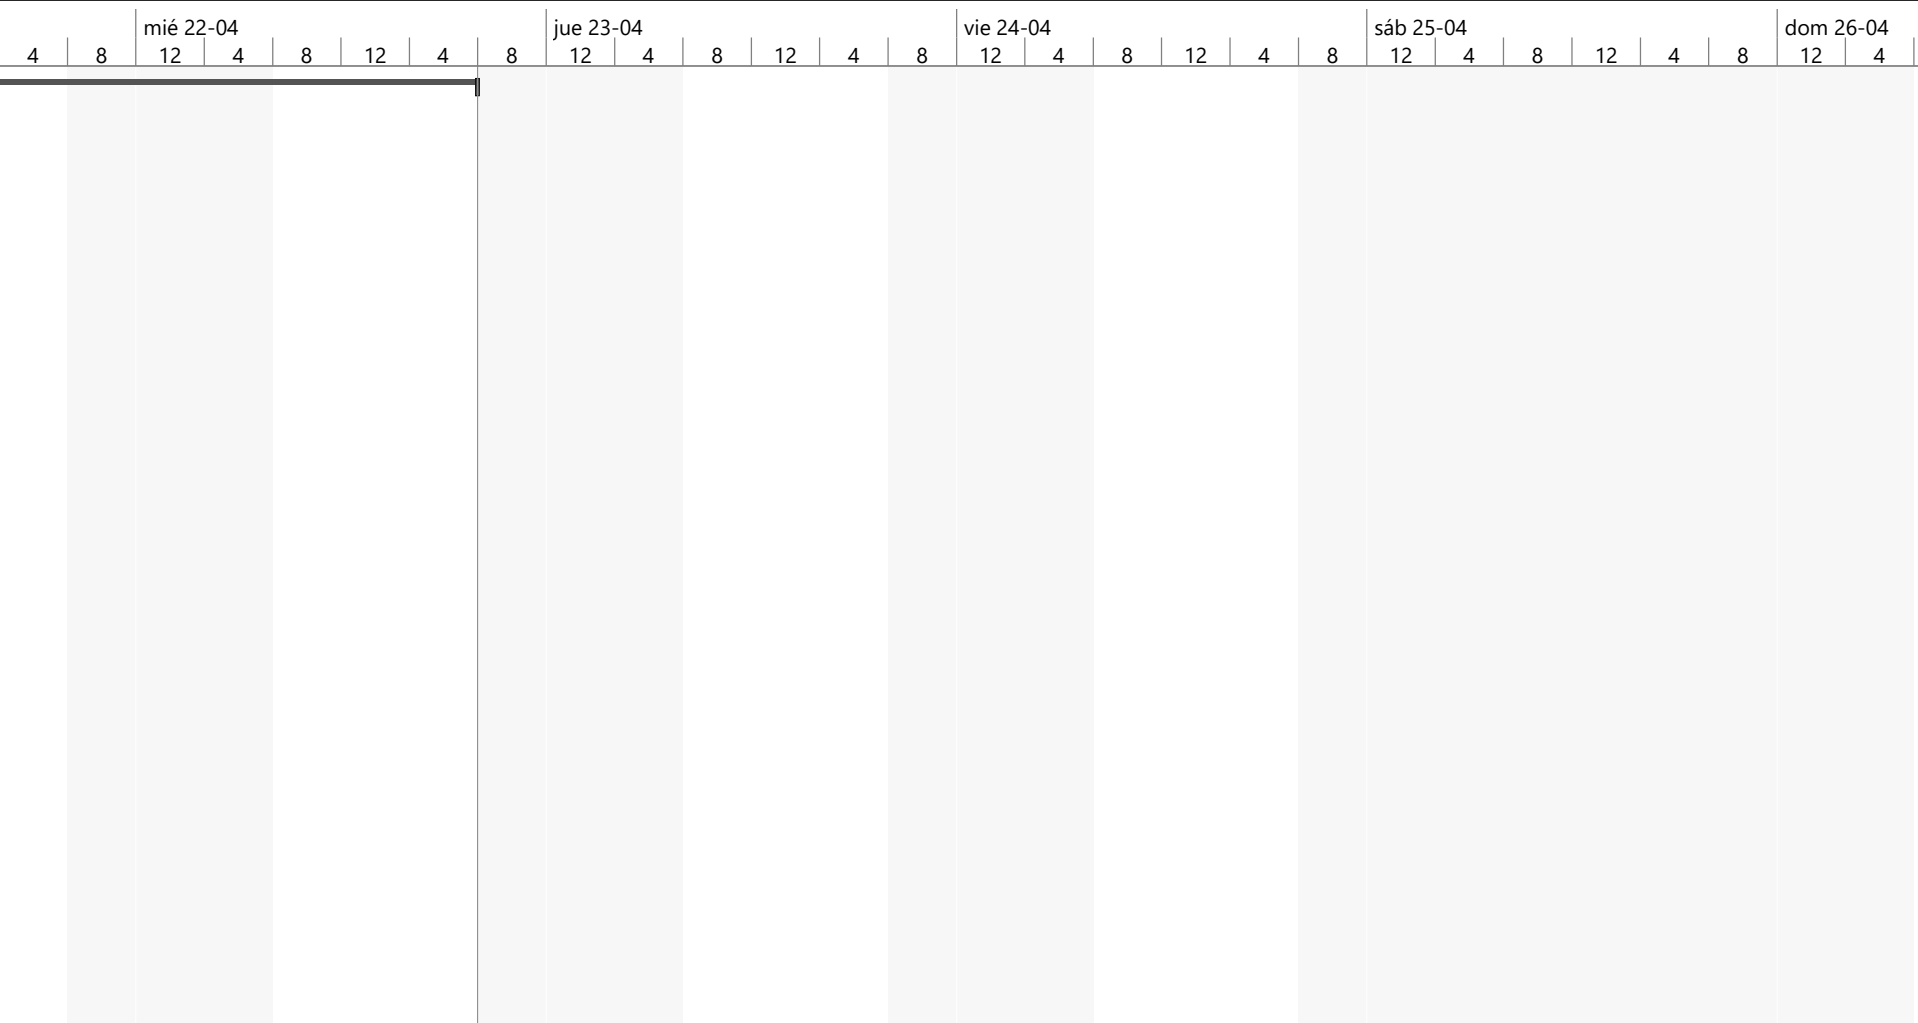

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: jue 16-10-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

