


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			Plan de trabajo Promociones ROAD Fase 1	72 días	lun 05-01-26	mar 14-04-26	
2			Análisis y diseño de promociones	5 días	lun 05-01-26	vie 09-01-26	
3			Desarrollo de recargos en ROAD	11 días	lun 12-01-26	lun 26-01-26	
4			Agregar parámetro en las tablas de descuentos para definir si es un recargo o un descuento BOF	1 día	lun 12-01-26	lun 12-01-26	2
5			Agregar parámetro en las tablas de descuentos para definir si es un recargo o un descuento HH	1 día	lun 12-01-26	lun 12-01-26	2
6			Agregar la funcionalidad de recargo por porcentaje en la venta,utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes BOF	5 días	mar 13-01-26	lun 19-01-26	4
7			Agregar la funcionalidad de recargo por porcentaje en la venta,utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes HH	5 días	mar 13-01-26	lun 19-01-26	5
8			Agregar la funcionalidad de recargo fijo en la venta, utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes	5 días	mar 20-01-26	lun 26-01-26	6
9			Agregar la funcionalidad de recargo fijo en la venta, utilizando la funcionalidad de descuentos ya existentes	5 días	mar 20-01-26	lun 26-01-26	7
10			Desarrollos para integración de descuentos con SAP	15 días	mar 27-01-26	lun 16-02-26	
11			Sesión para definir mapeos entre las tablas de SAP y ROAC	2 días	mar 27-01-26	mié 28-01-26	8
12			Desarrollo de WebApi para recibir las mecánicas de SAP e insertarlas en las estructuras de ROAD	10 días	jue 29-01-26	mié 11-02-26	11
13			Modificaciones a las estructuras actuales de descuentos para poder recibir las promociones desde SAP en BOF	2 días	jue 12-02-26	vie 13-02-26	12
14			Modificaciones en HH a las estructuras actuales de descuentos	1 día	lun 16-02-26	lun 16-02-26	9,13

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: vie 12-12-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15			BOF	26 días	lun 16-02-26	lun 23-03-26	
16			Modificación al proceso de cálculo de precios en factura manual	5 días	lun 16-02-26	vie 20-02-26	13
17			Modificación al proceso de cálculo de precios en la nota de crédito con referencia manual	5 días	lun 23-02-26	vie 27-02-26	16
18			Modificación al proceso de cálculo de precios en la nota de crédito sin referencia manual	5 días	lun 02-03-26	vie 06-03-26	17
19			Modificación al cálculo de notas por error en precio	3 días	lun 09-03-26	mié 11-03-26	18
20			Modificación a los reportes de precio	3 días	jue 12-03-26	lun 16-03-26	19
21			Reportes BOF análisis y desarrollo	5 días	mar 17-03-26	lun 23-03-26	20
22			PDA	15 días	mar 17-02-26	lun 09-03-26	
23			Modificar la forma en que se calculan los descuentos en la facturación en ROAD en la HH para hacerlo como se hace actualmente en SAP	5 días	mar 17-02-26	lun 23-02-26	14
24			Modificar la forma en que se calculan los descuentos en las notas de crédito en ROAD en la HH para hacerlo como se hace actualmente en SAP	5 días	mar 24-02-26	lun 02-03-26	23
25			Reportes PDA análisis y desarrollo	5 días	mar 03-03-26	lun 09-03-26	24
26			Pruebas interface	5 días	mar 24-03-26	lun 30-03-26	25,21
27			Pruebas integrales	5 días	mar 31-03-26	lun 06-04-26	26
28			Publicación	1 día	mar 07-04-26	mar 07-04-26	27
29			Soporte posterior a implementación	5 días	mié 08-04-26	mar 14-04-26	28

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: vie 12-12-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: vie 12-12-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

Nombres de los recursos	05-01								mar 06-01								mié 07-01								jue 08-01								vie 09-01							
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12				
Desarrollador 1																																								
Desarrollador 1																																								
Desarrollador 1																																								
Desarrollador 1																																								
Desarrollador 1																																								
Desarrollador 1																																								
Desarrollador 2																																								
Desarrollador 2																																								
Desarrollador 2																																								
Desarrollador 1,De																																								
Desarrollador 1,De																																								
DTS																																								
DTS																																								

--


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

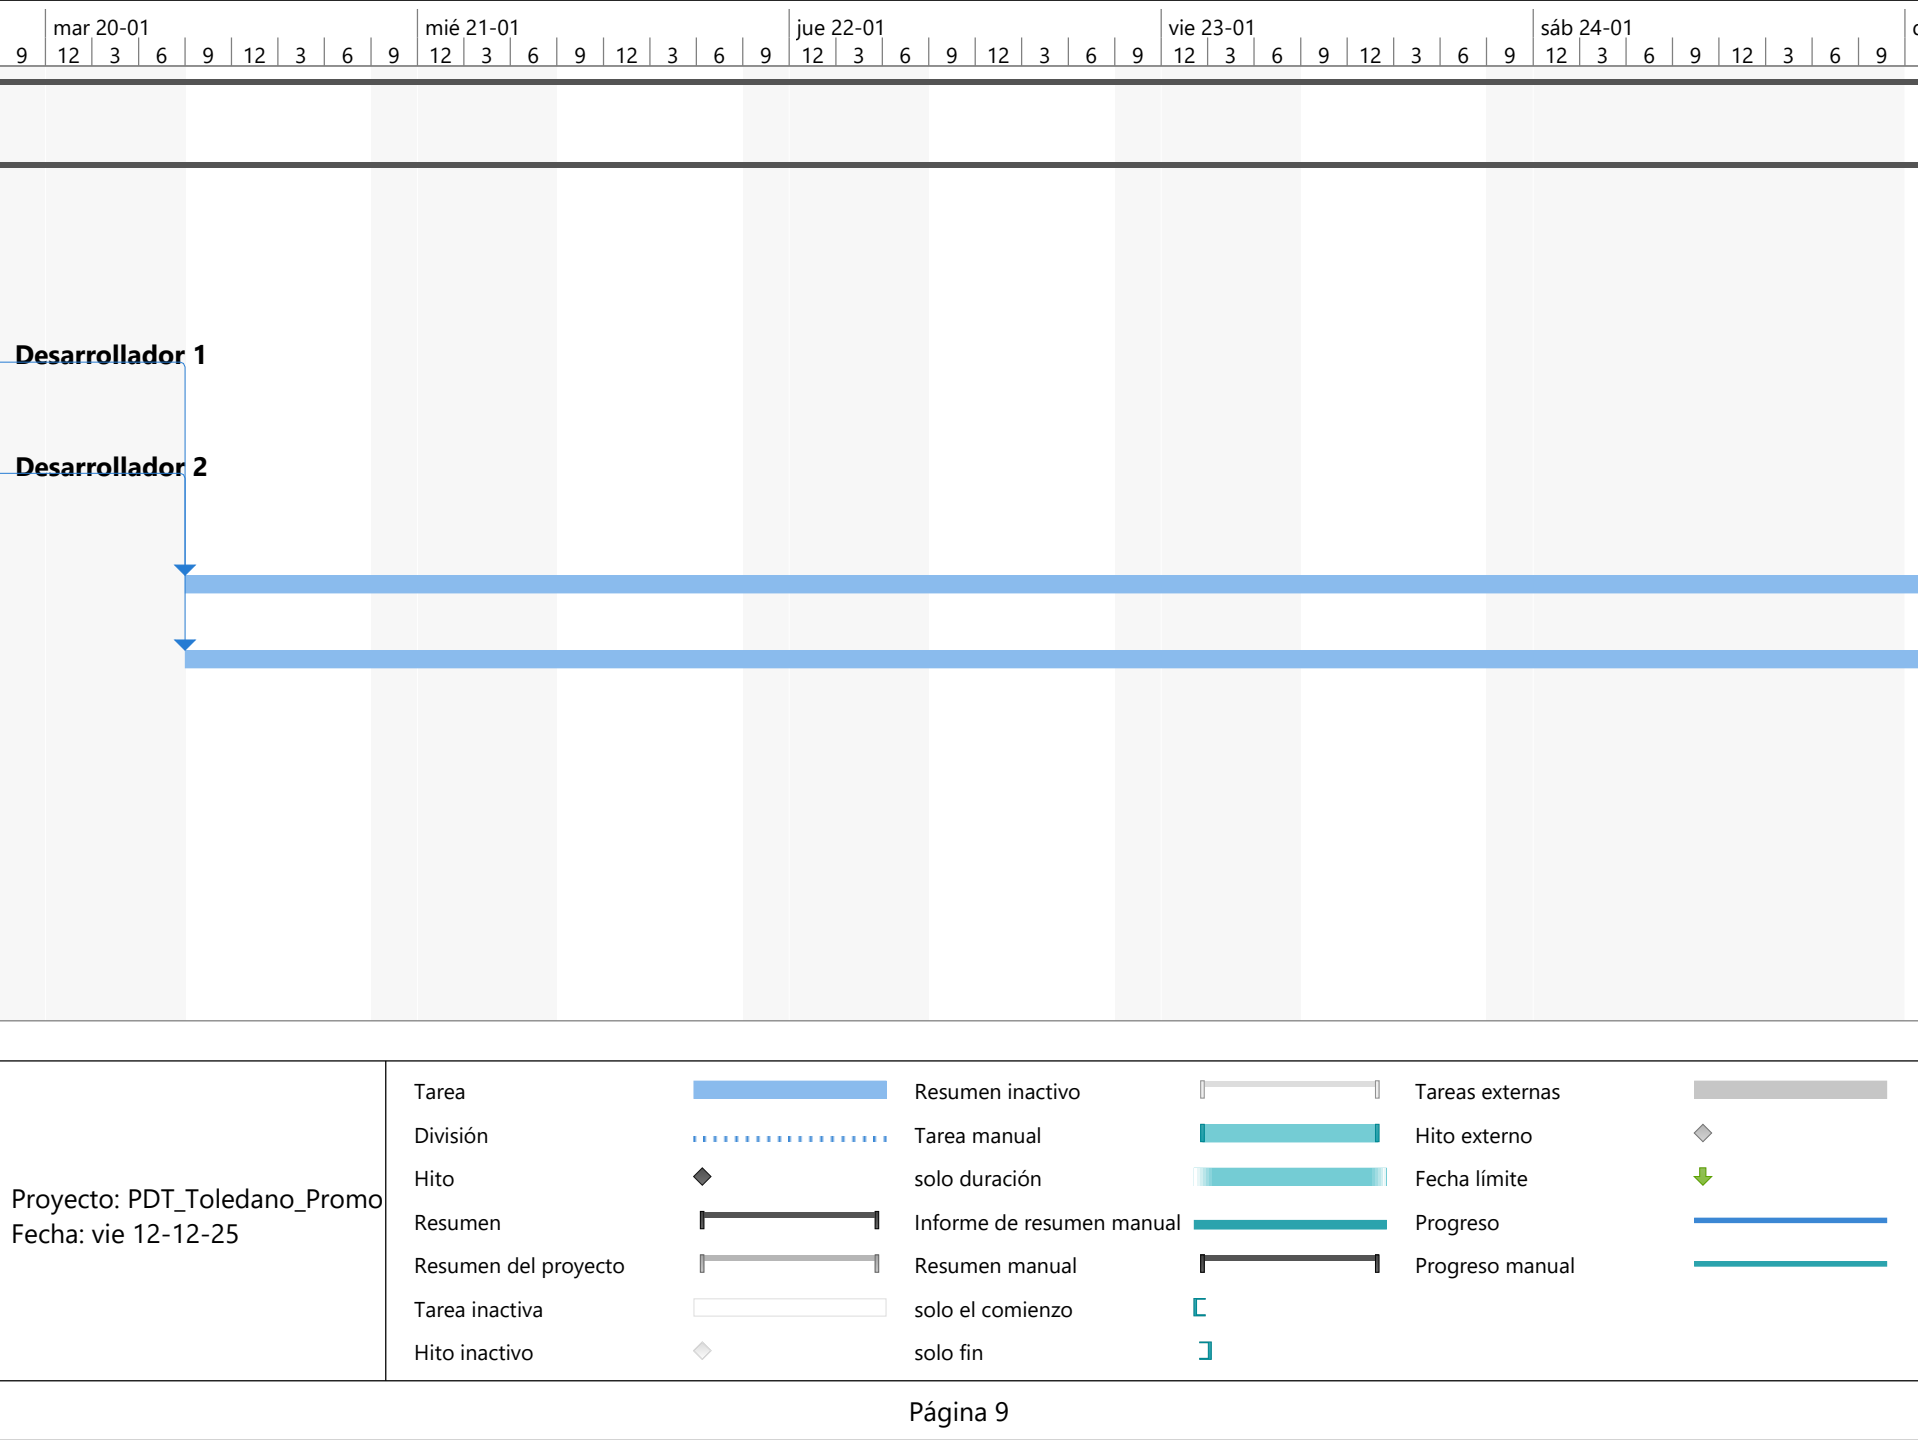





Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

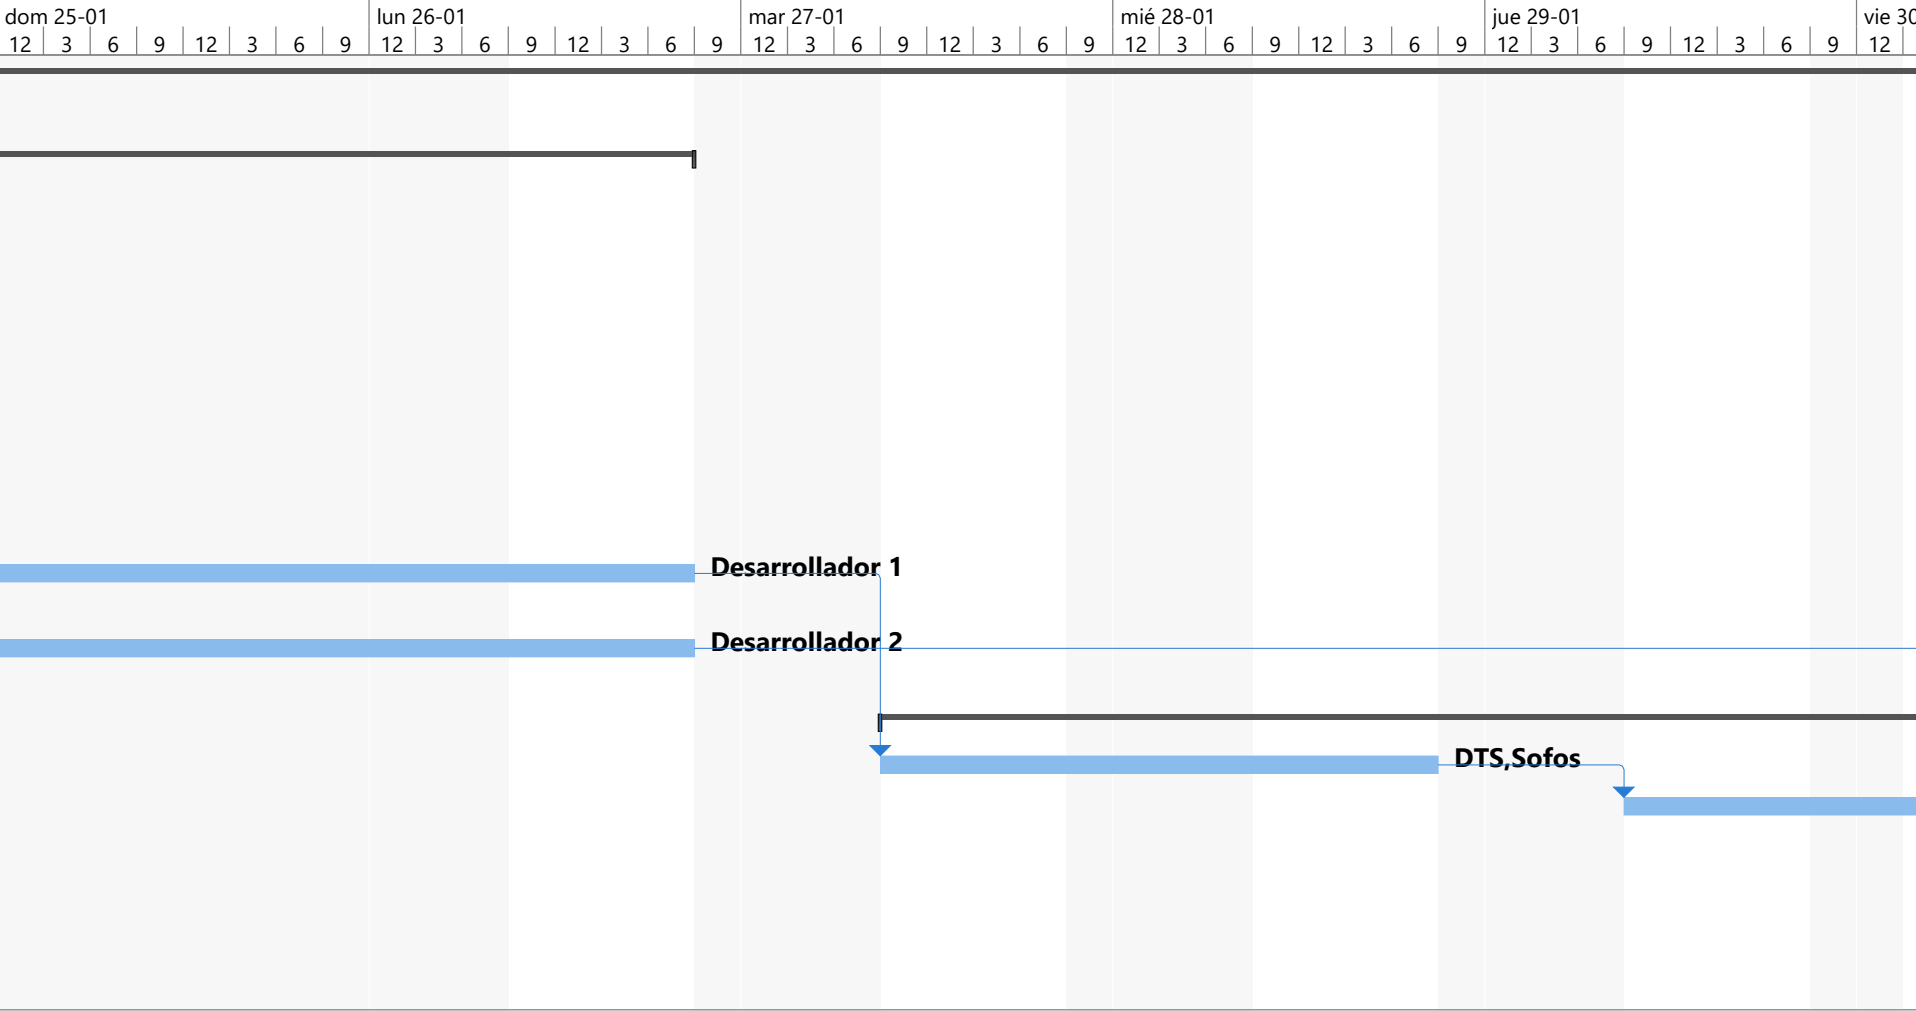


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

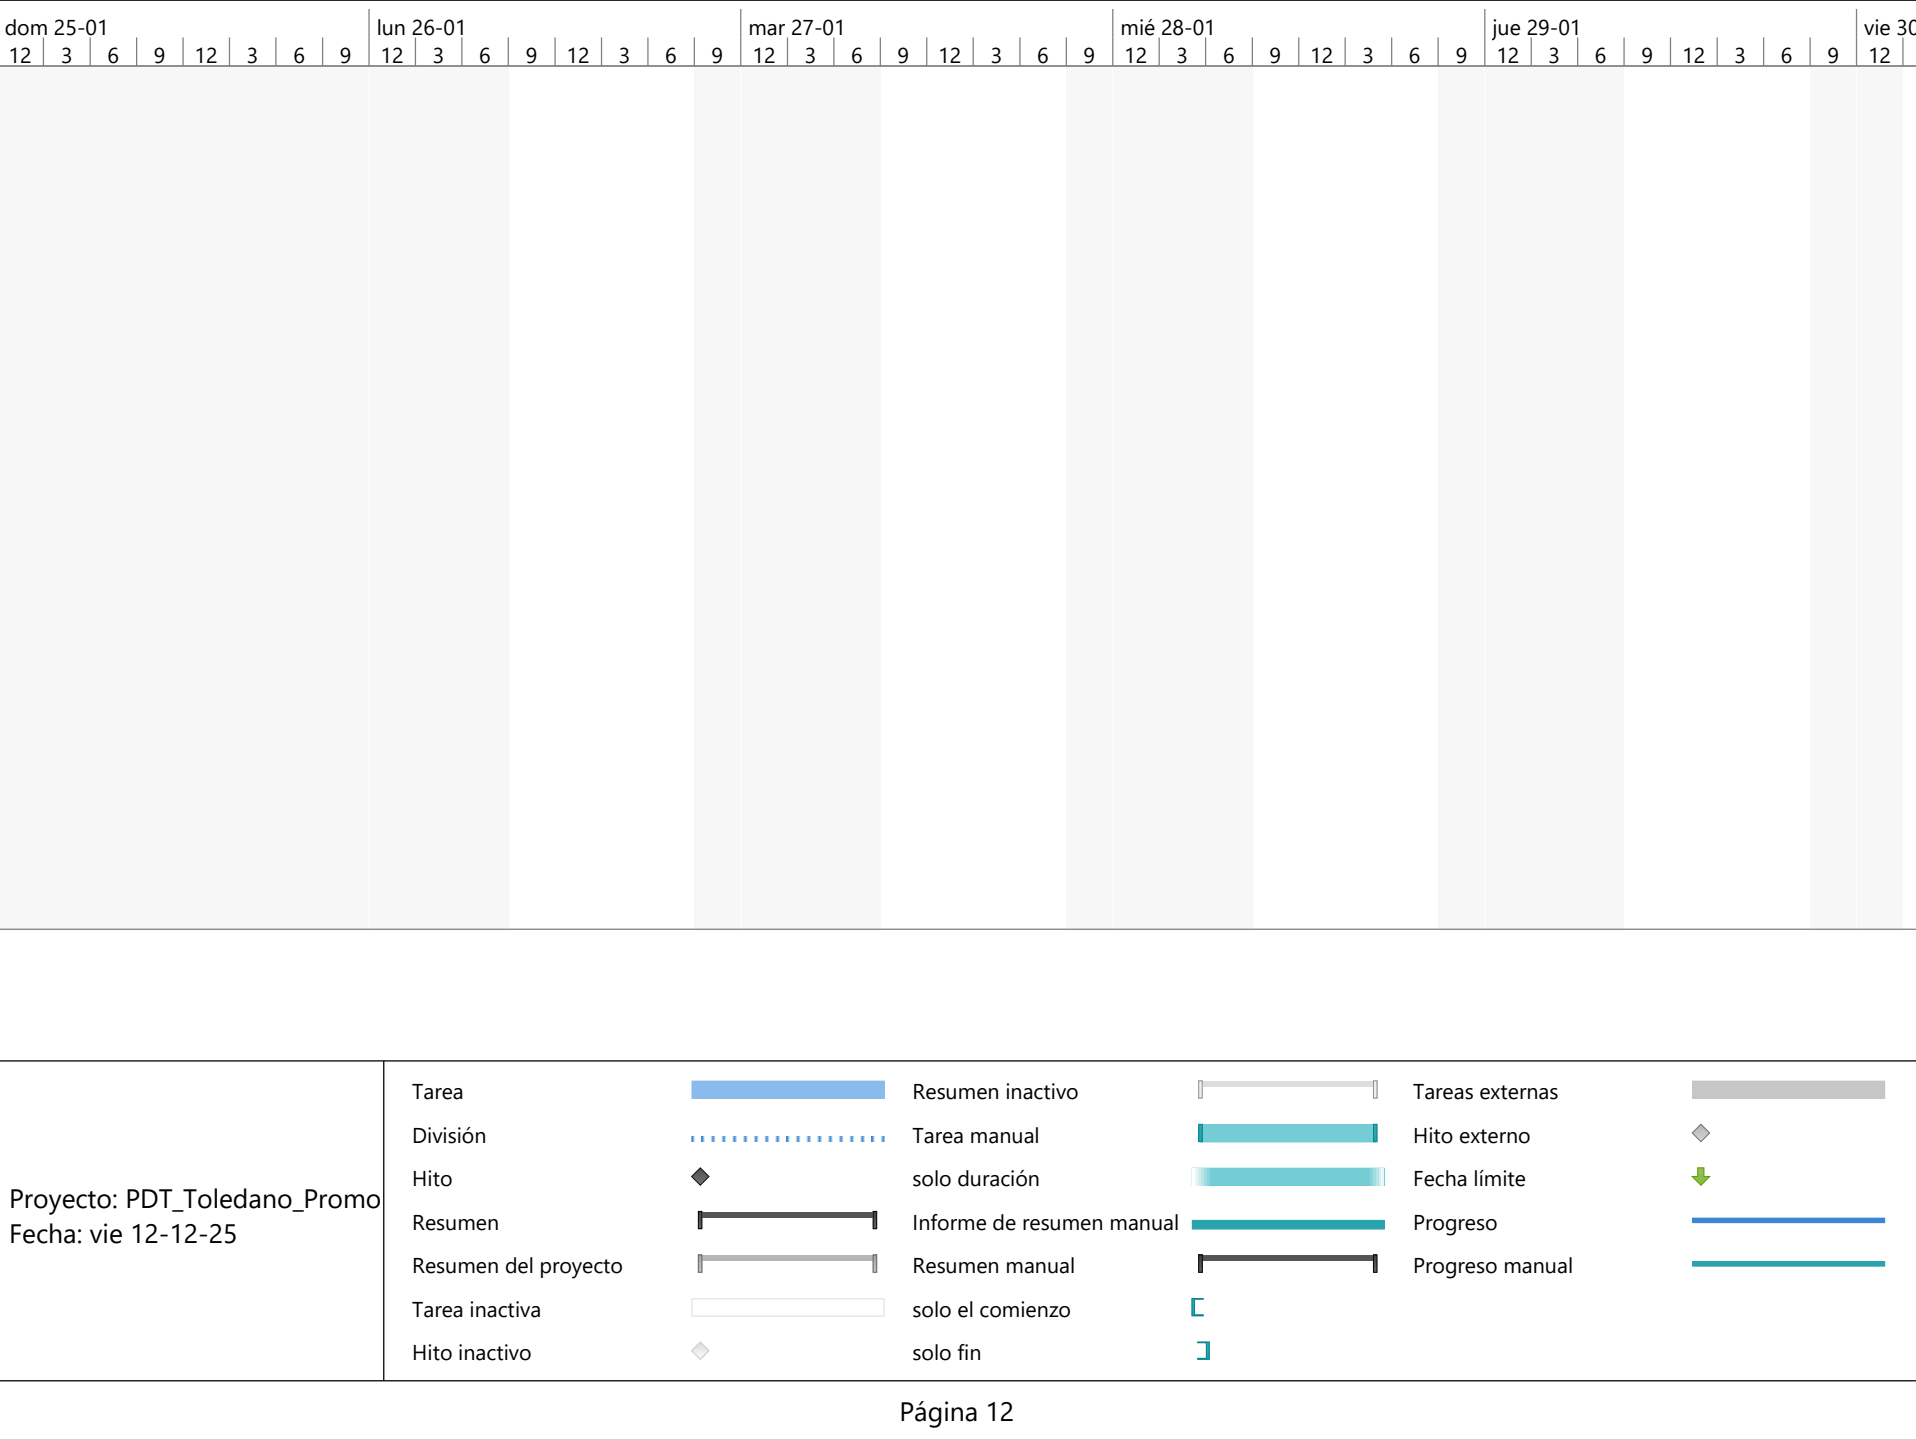

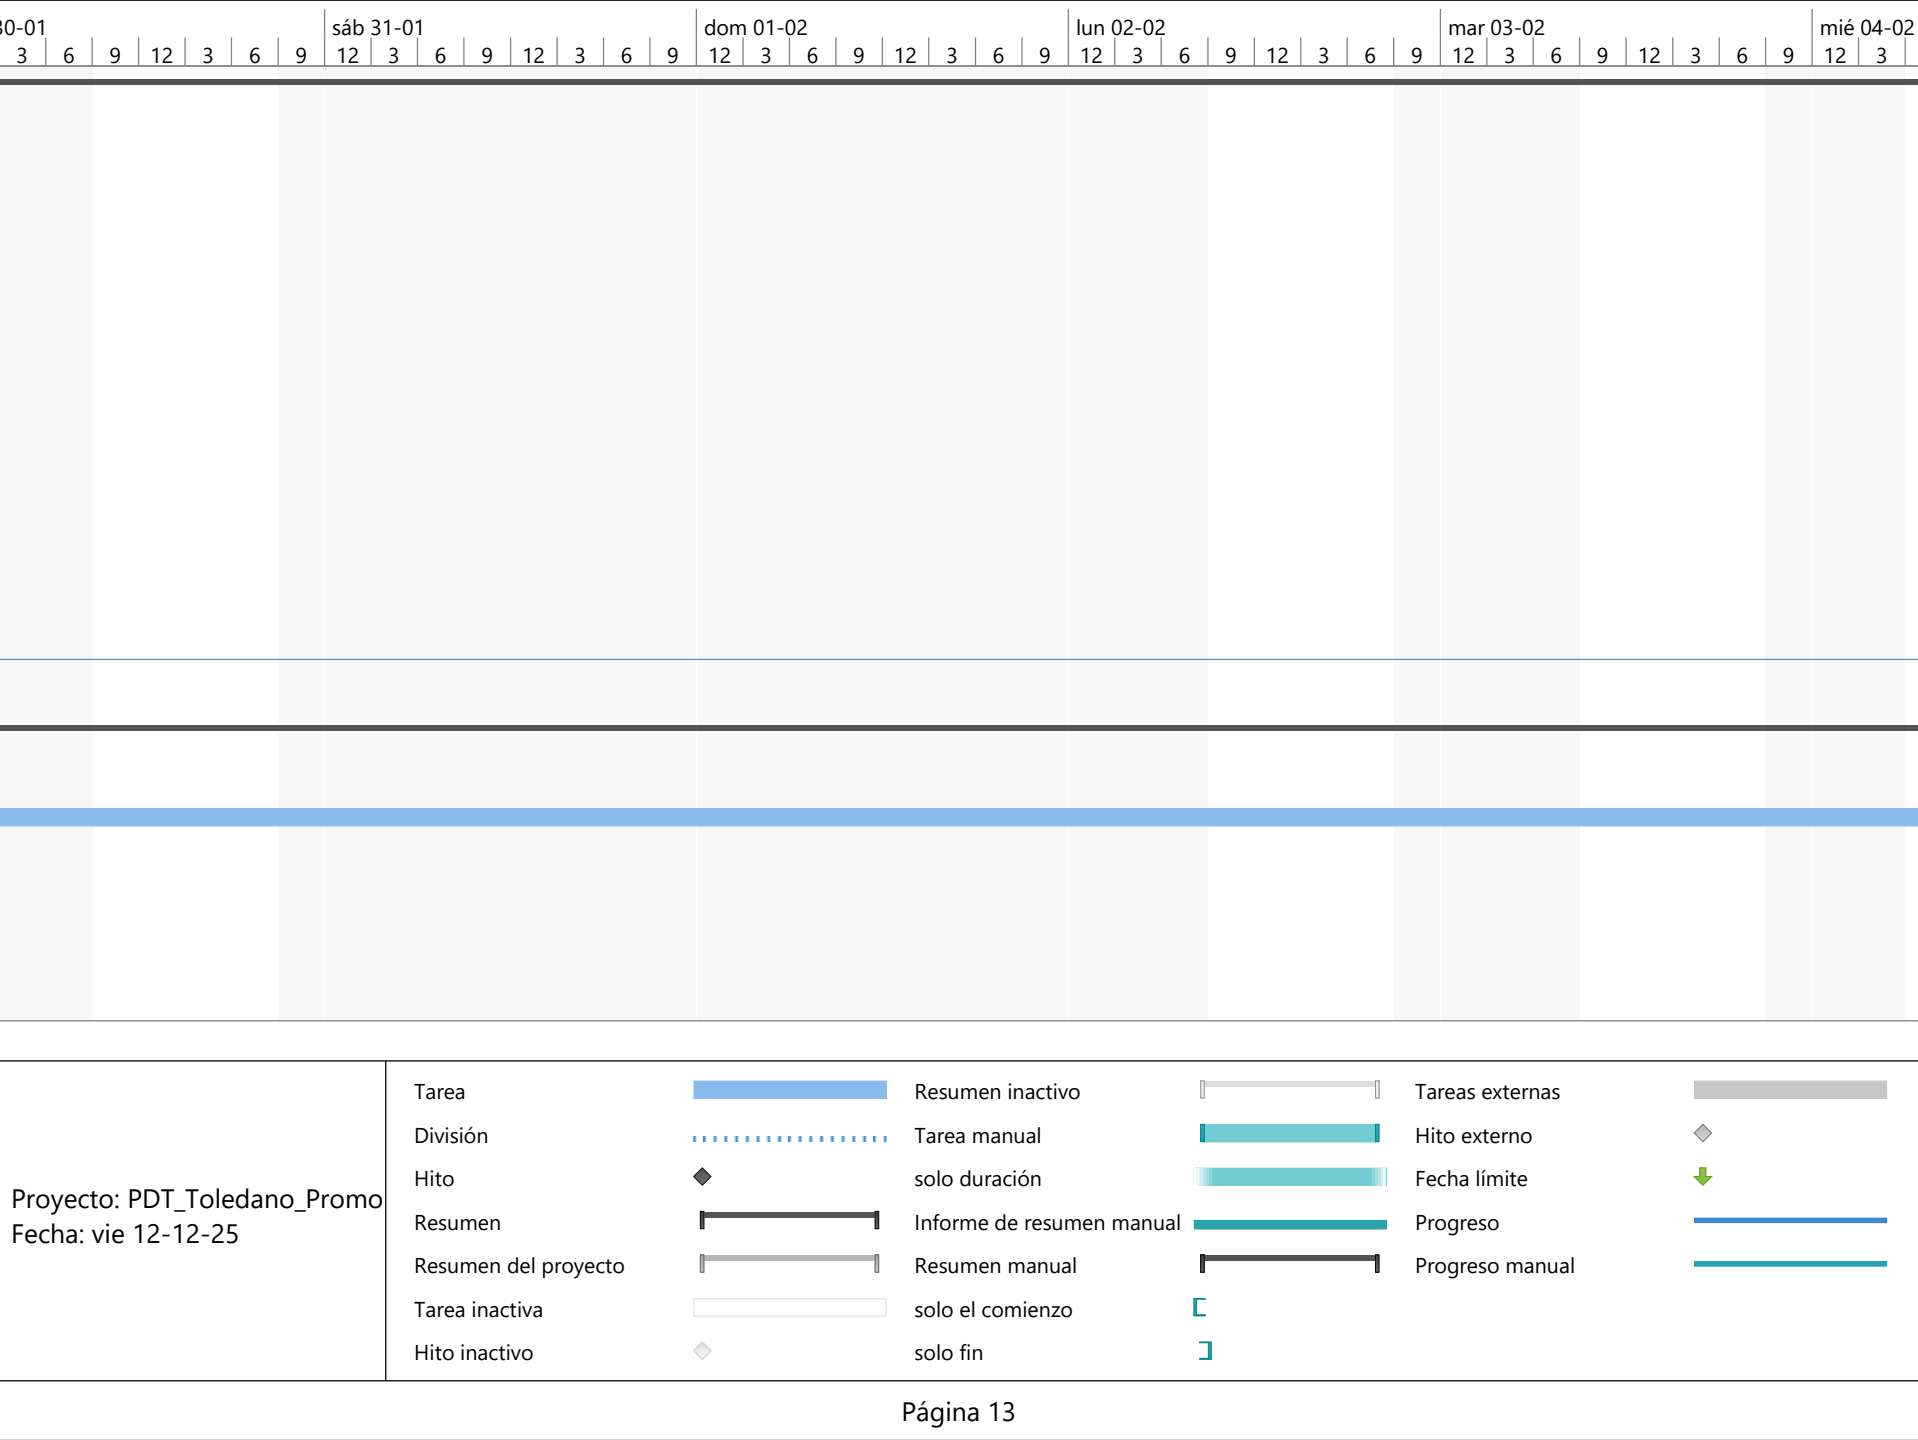





Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

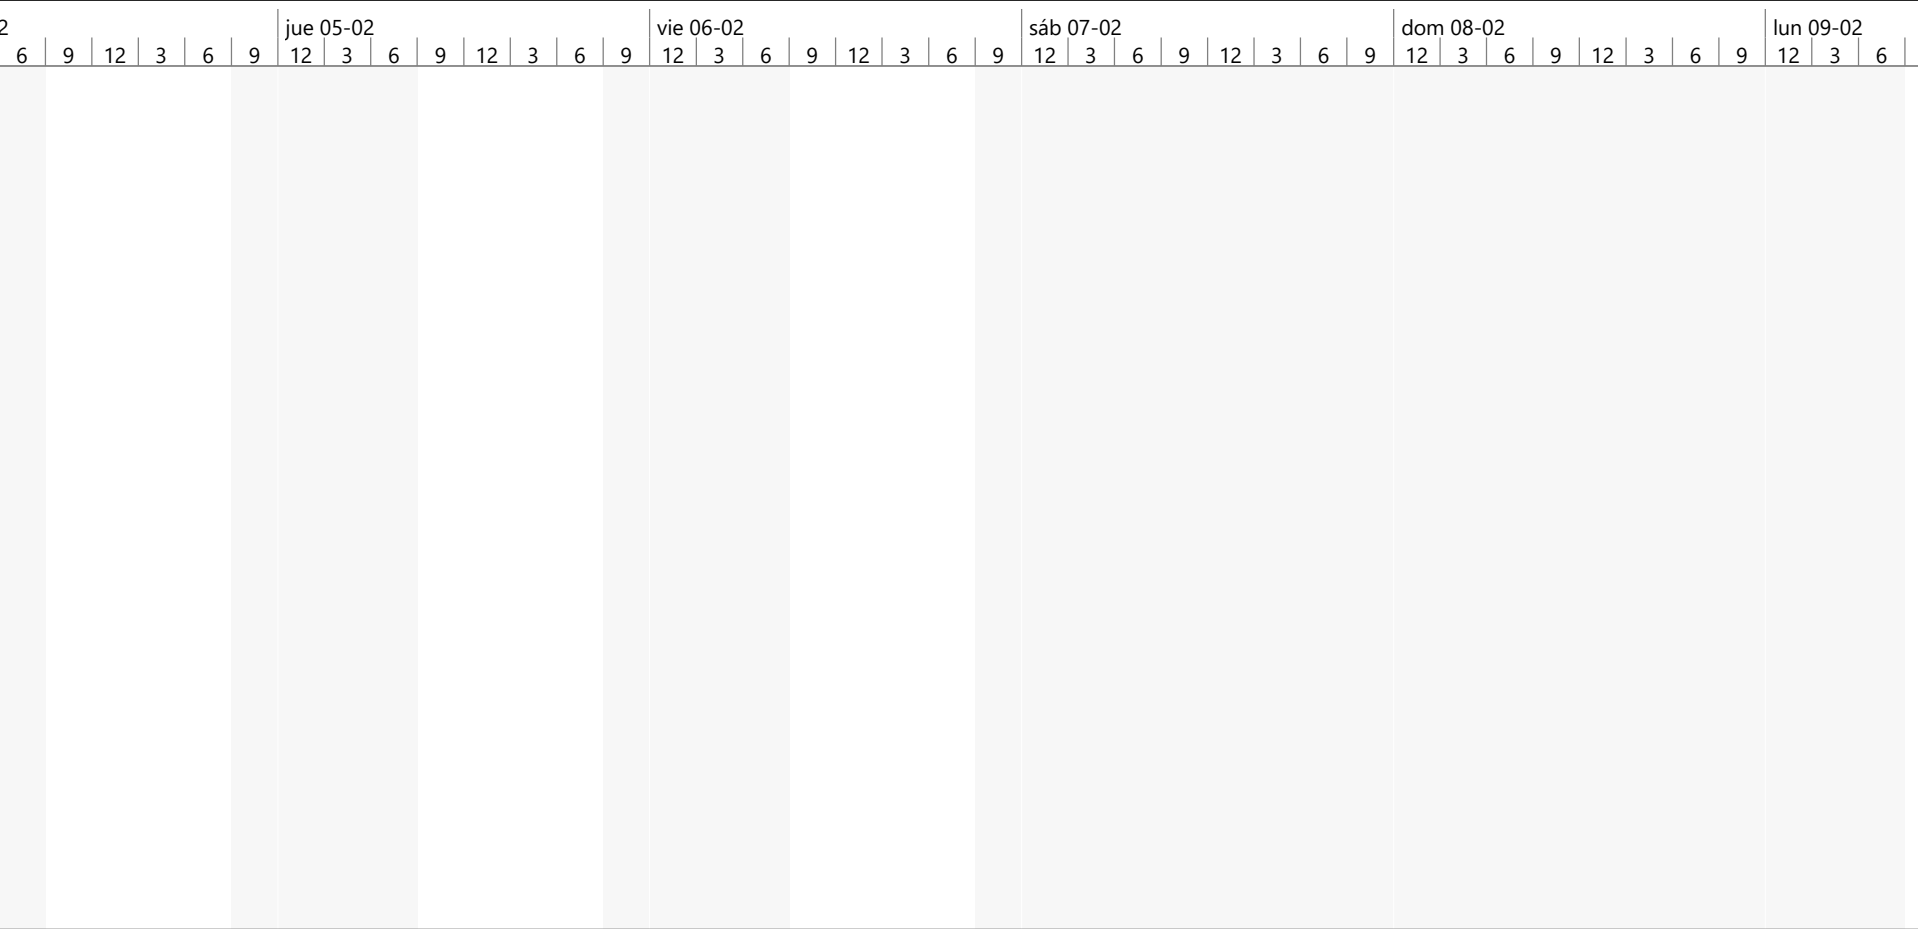


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

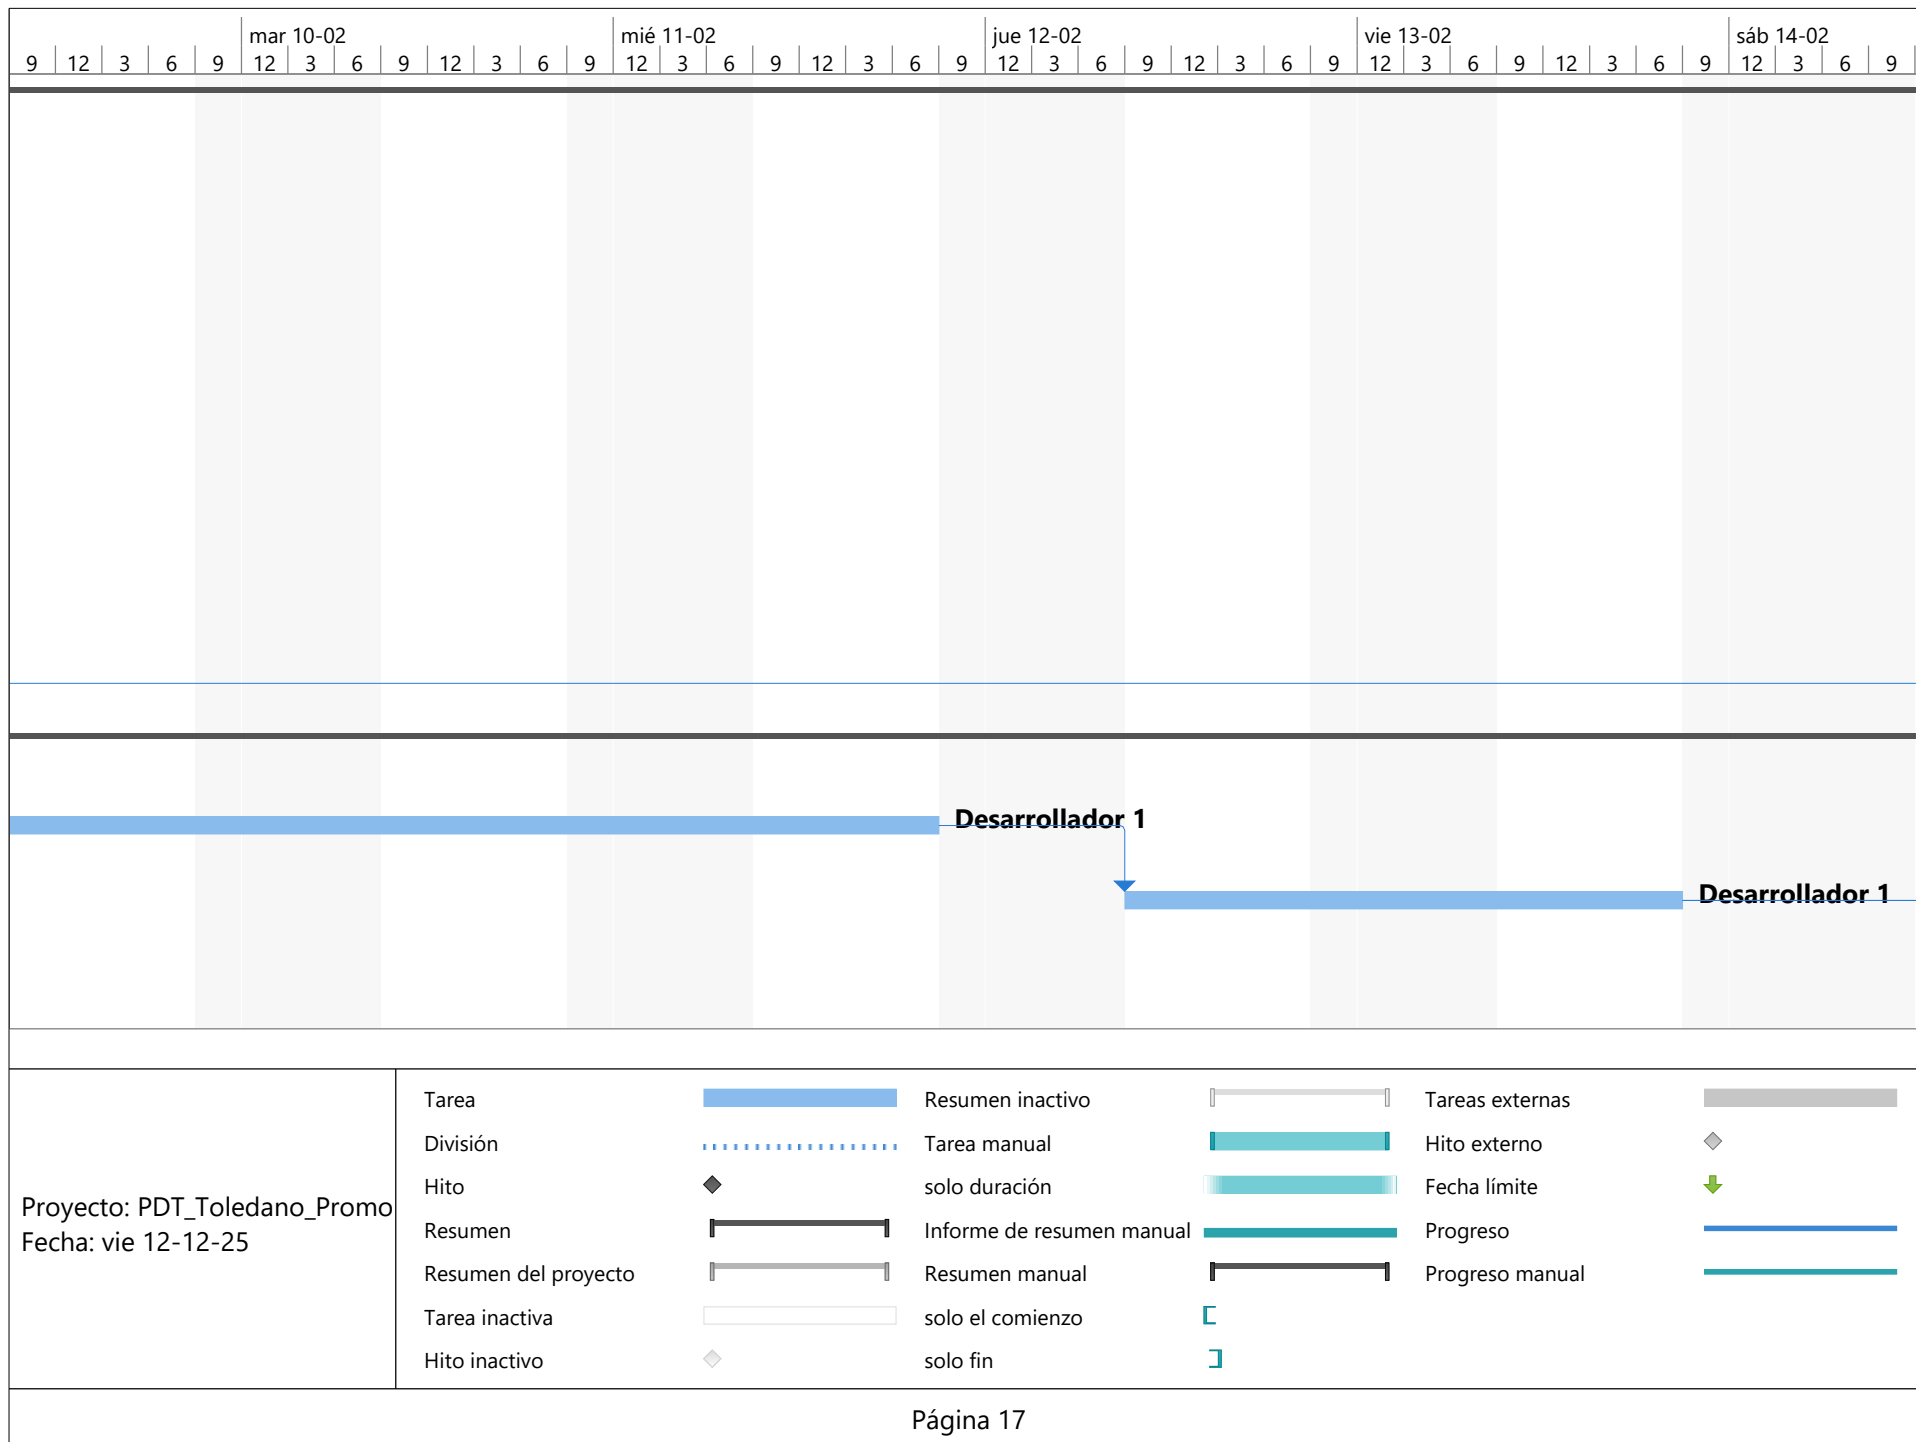

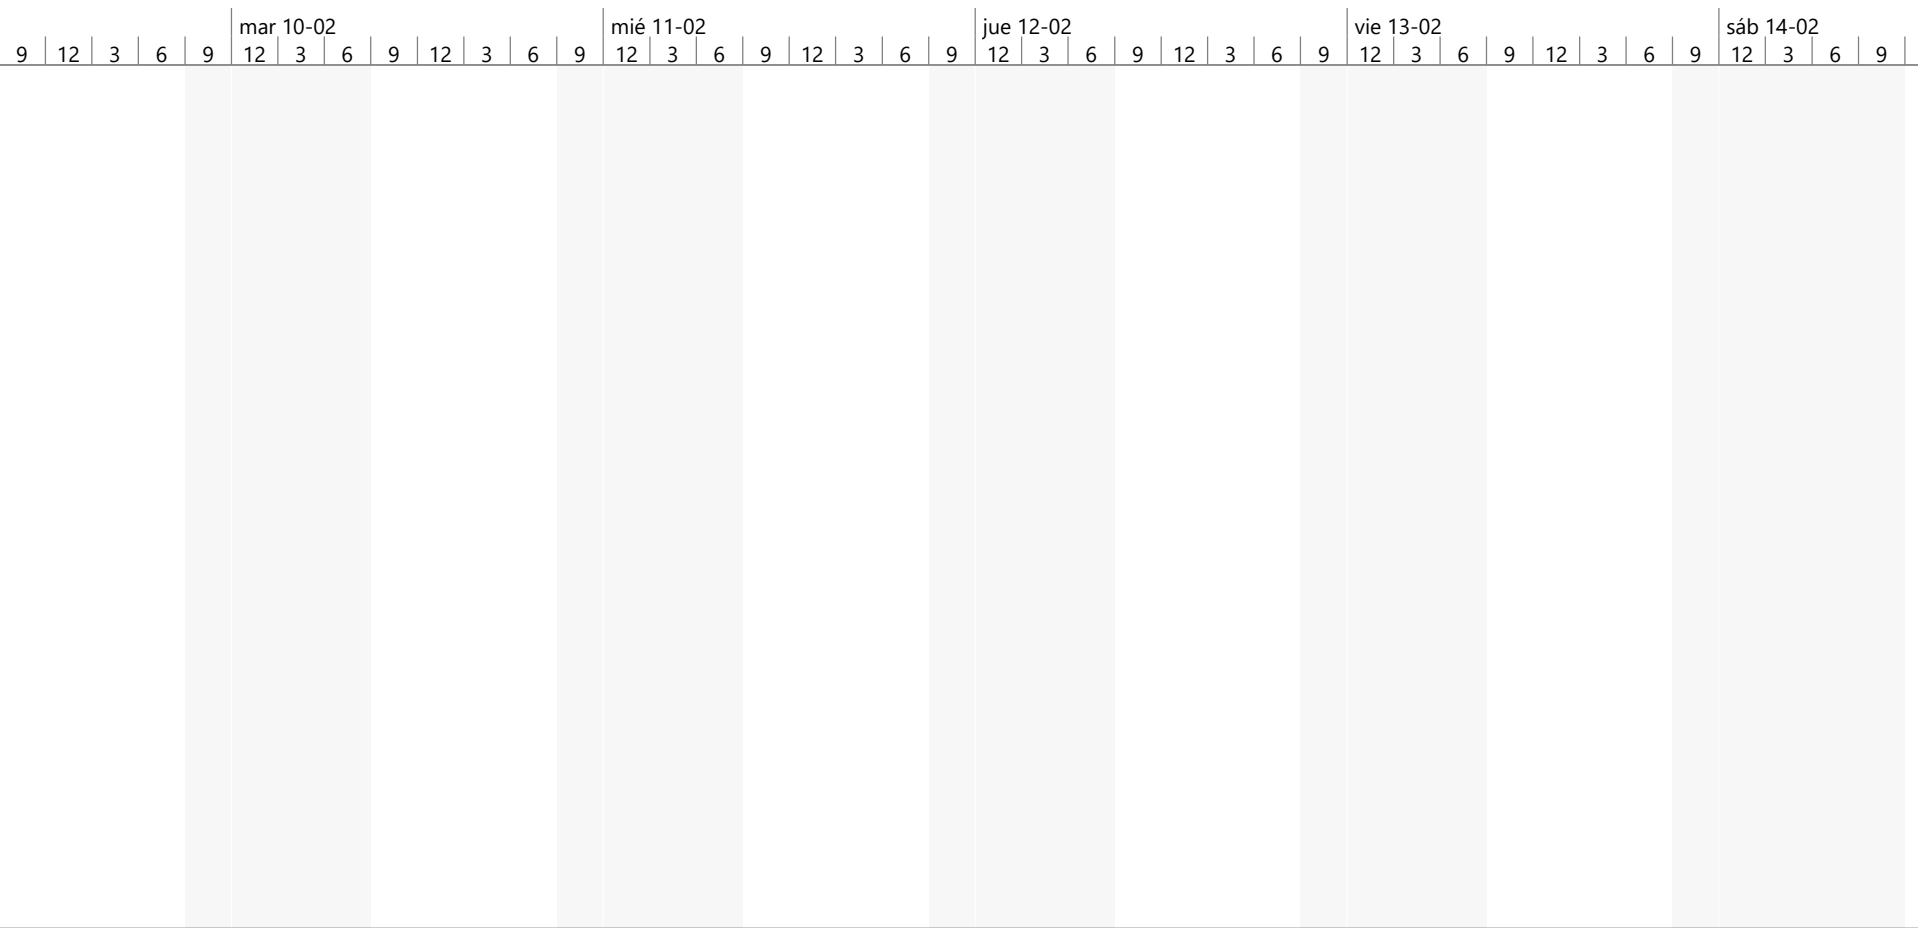



Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

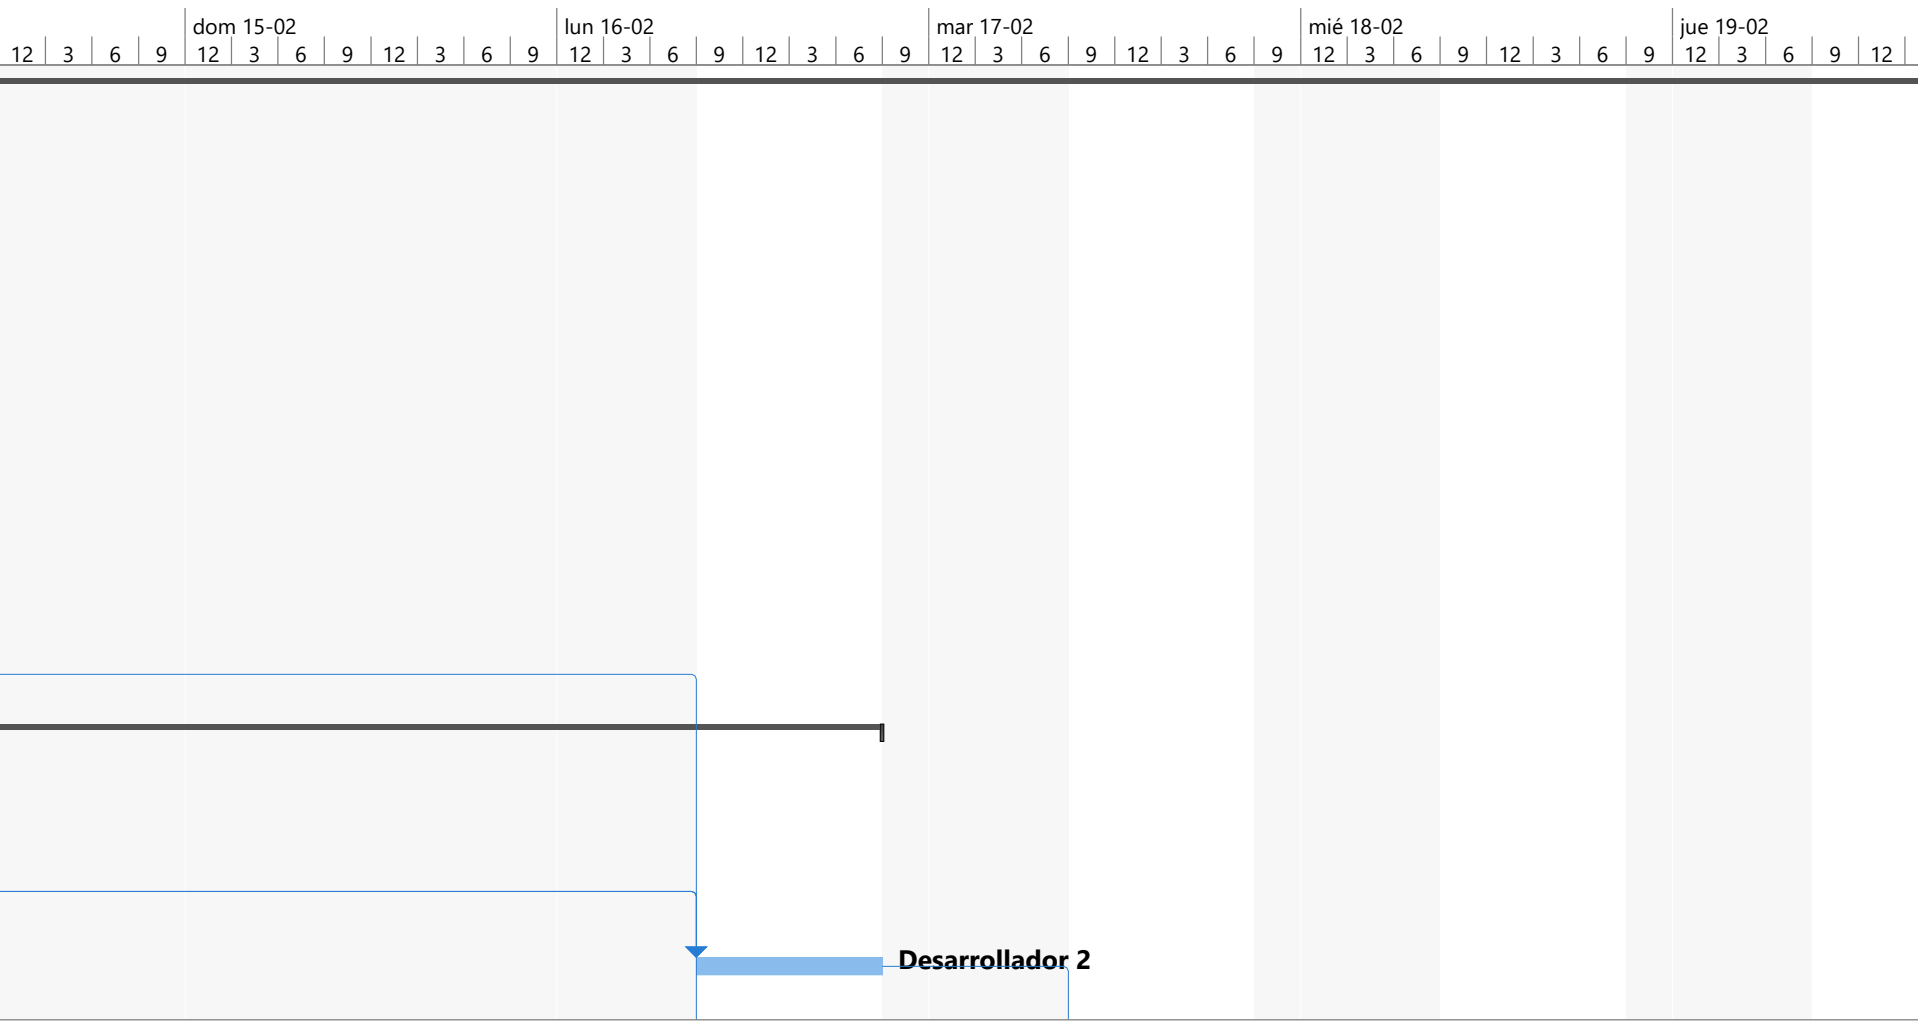

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


[illegible]

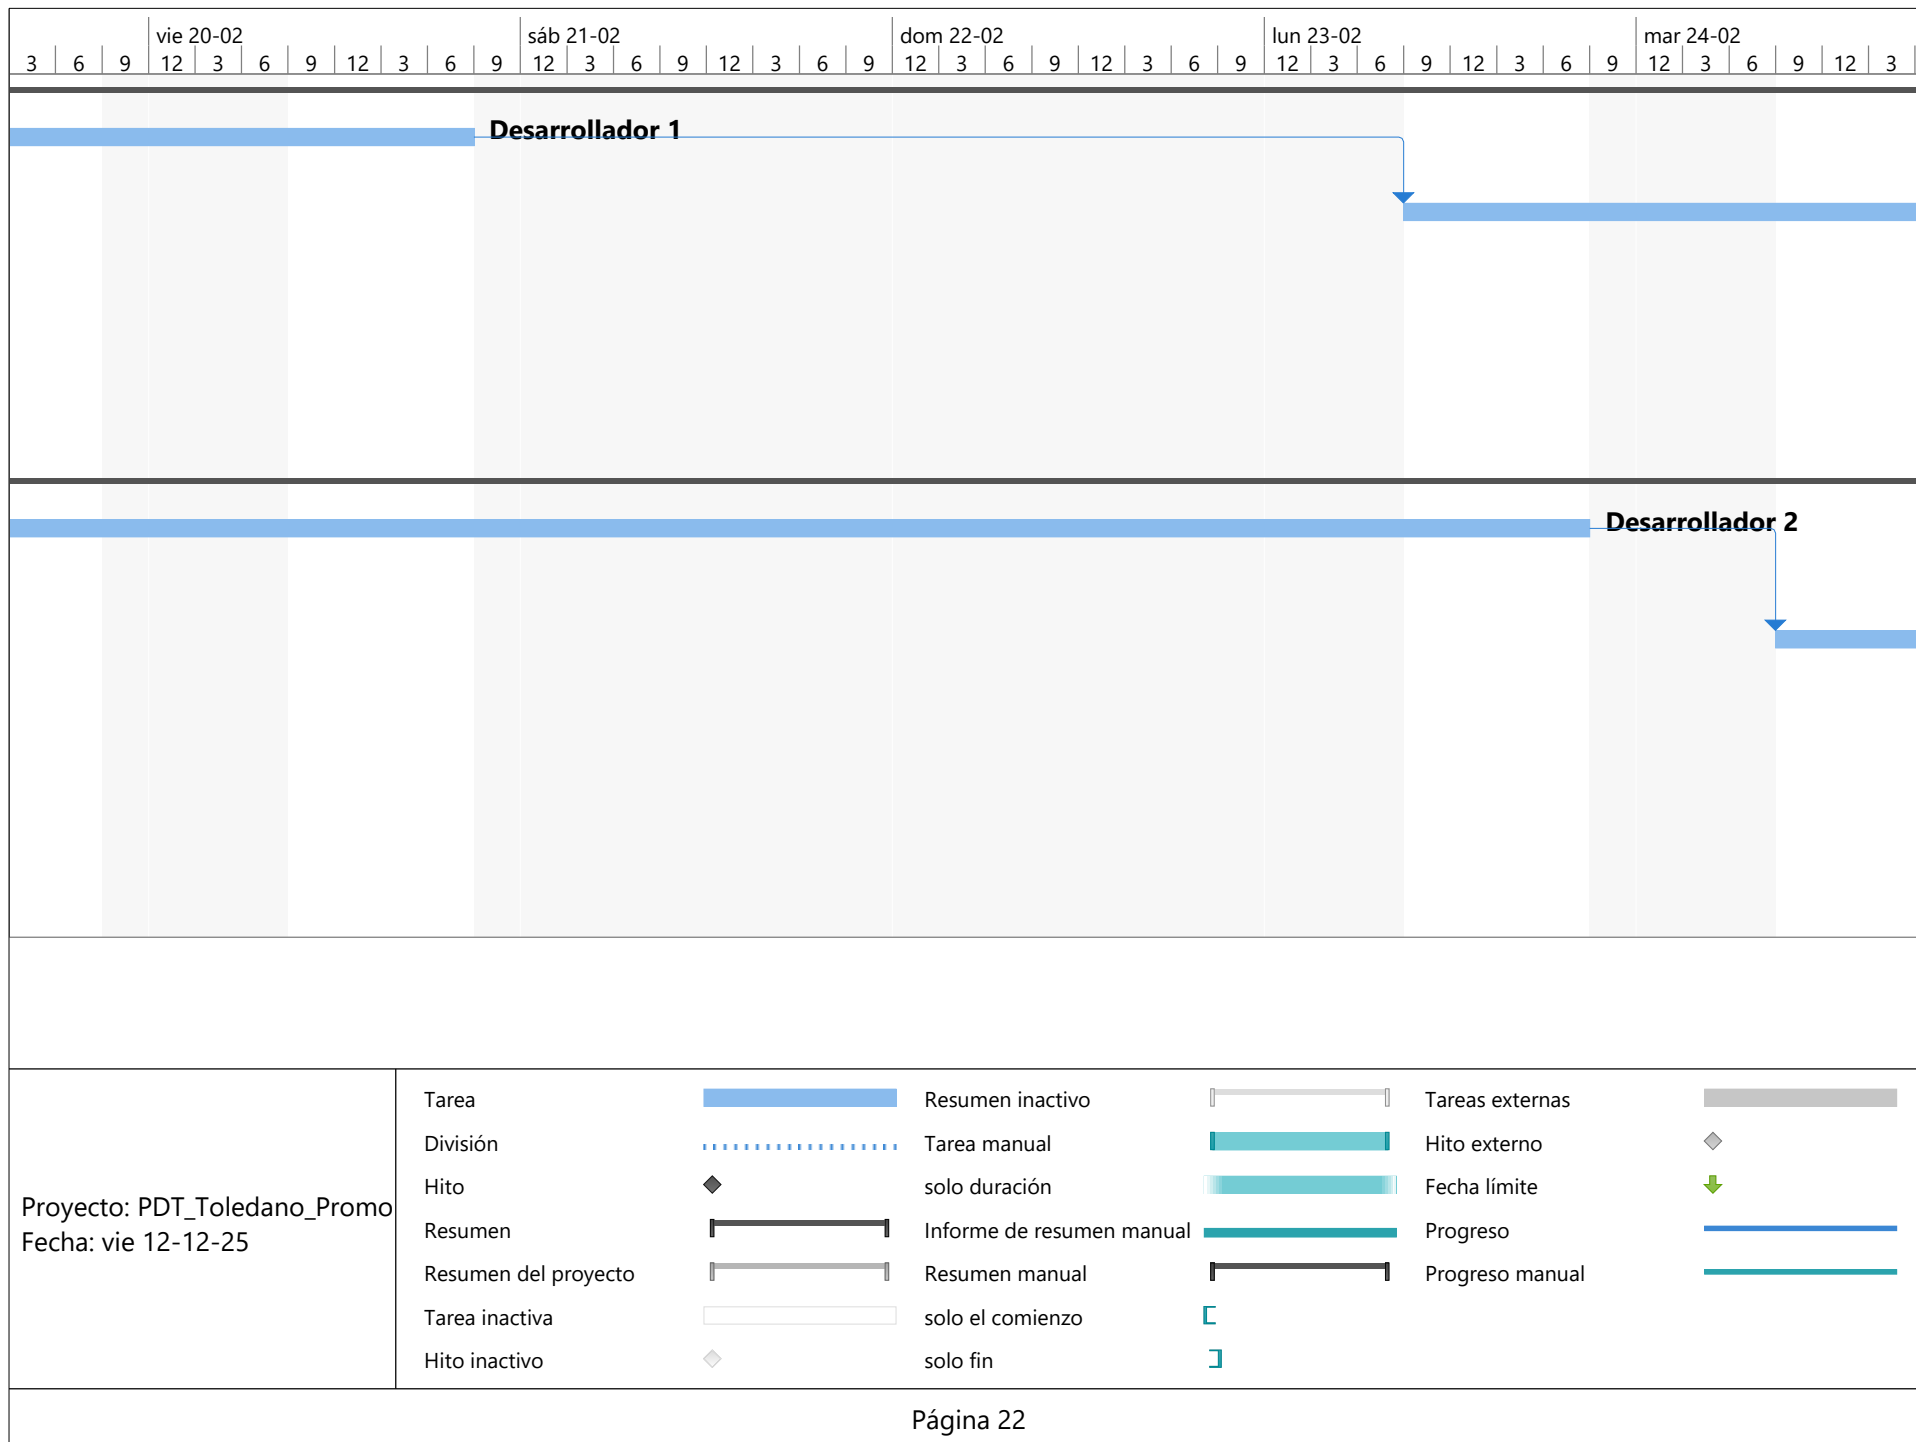

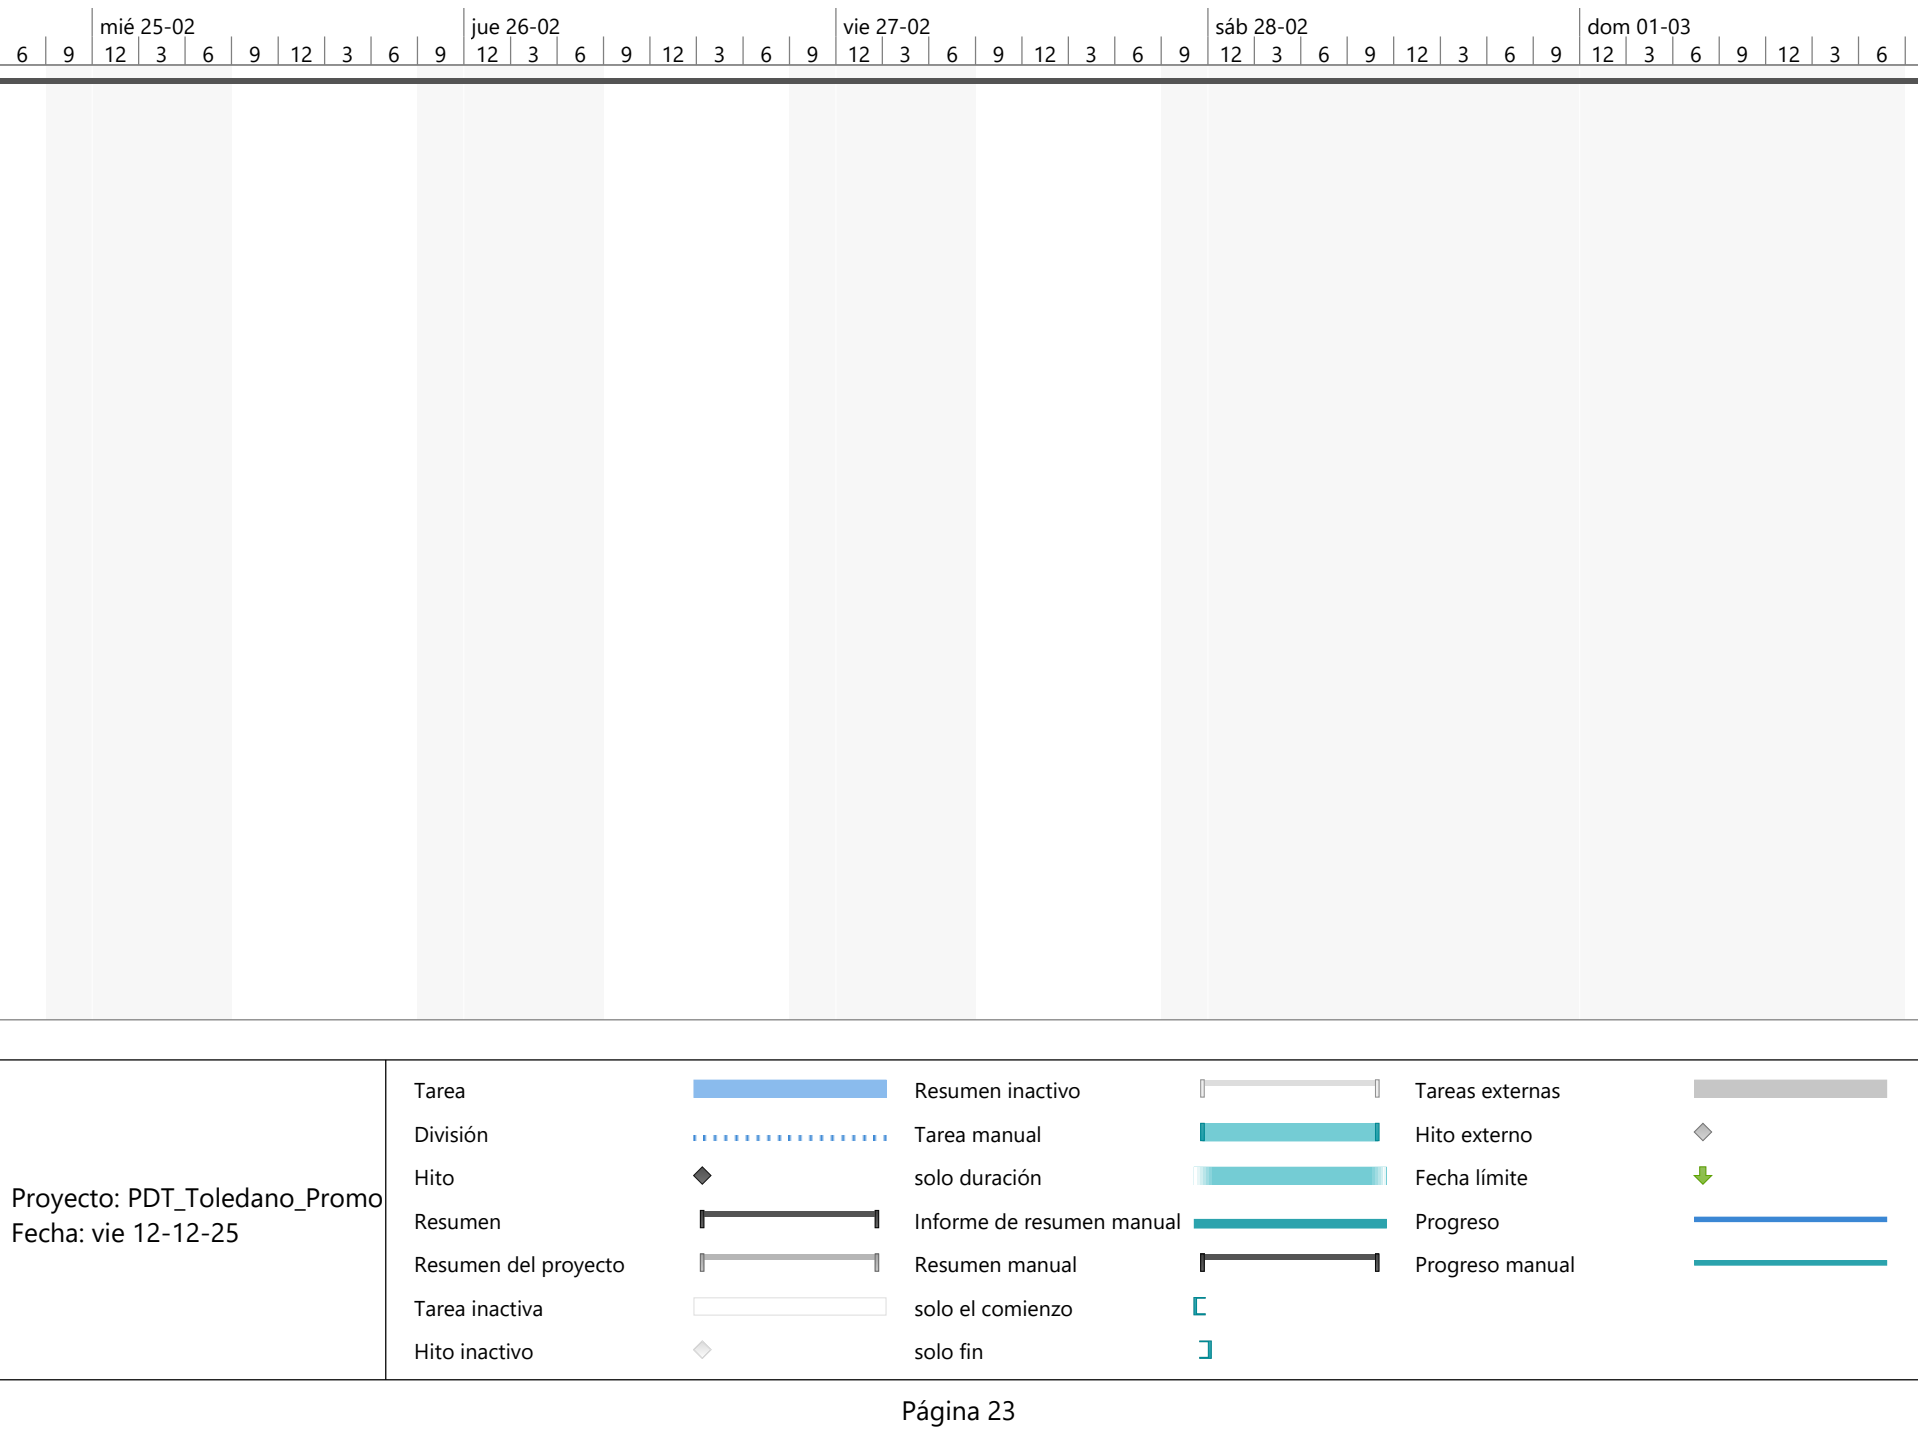



[illegible]


[illegible]

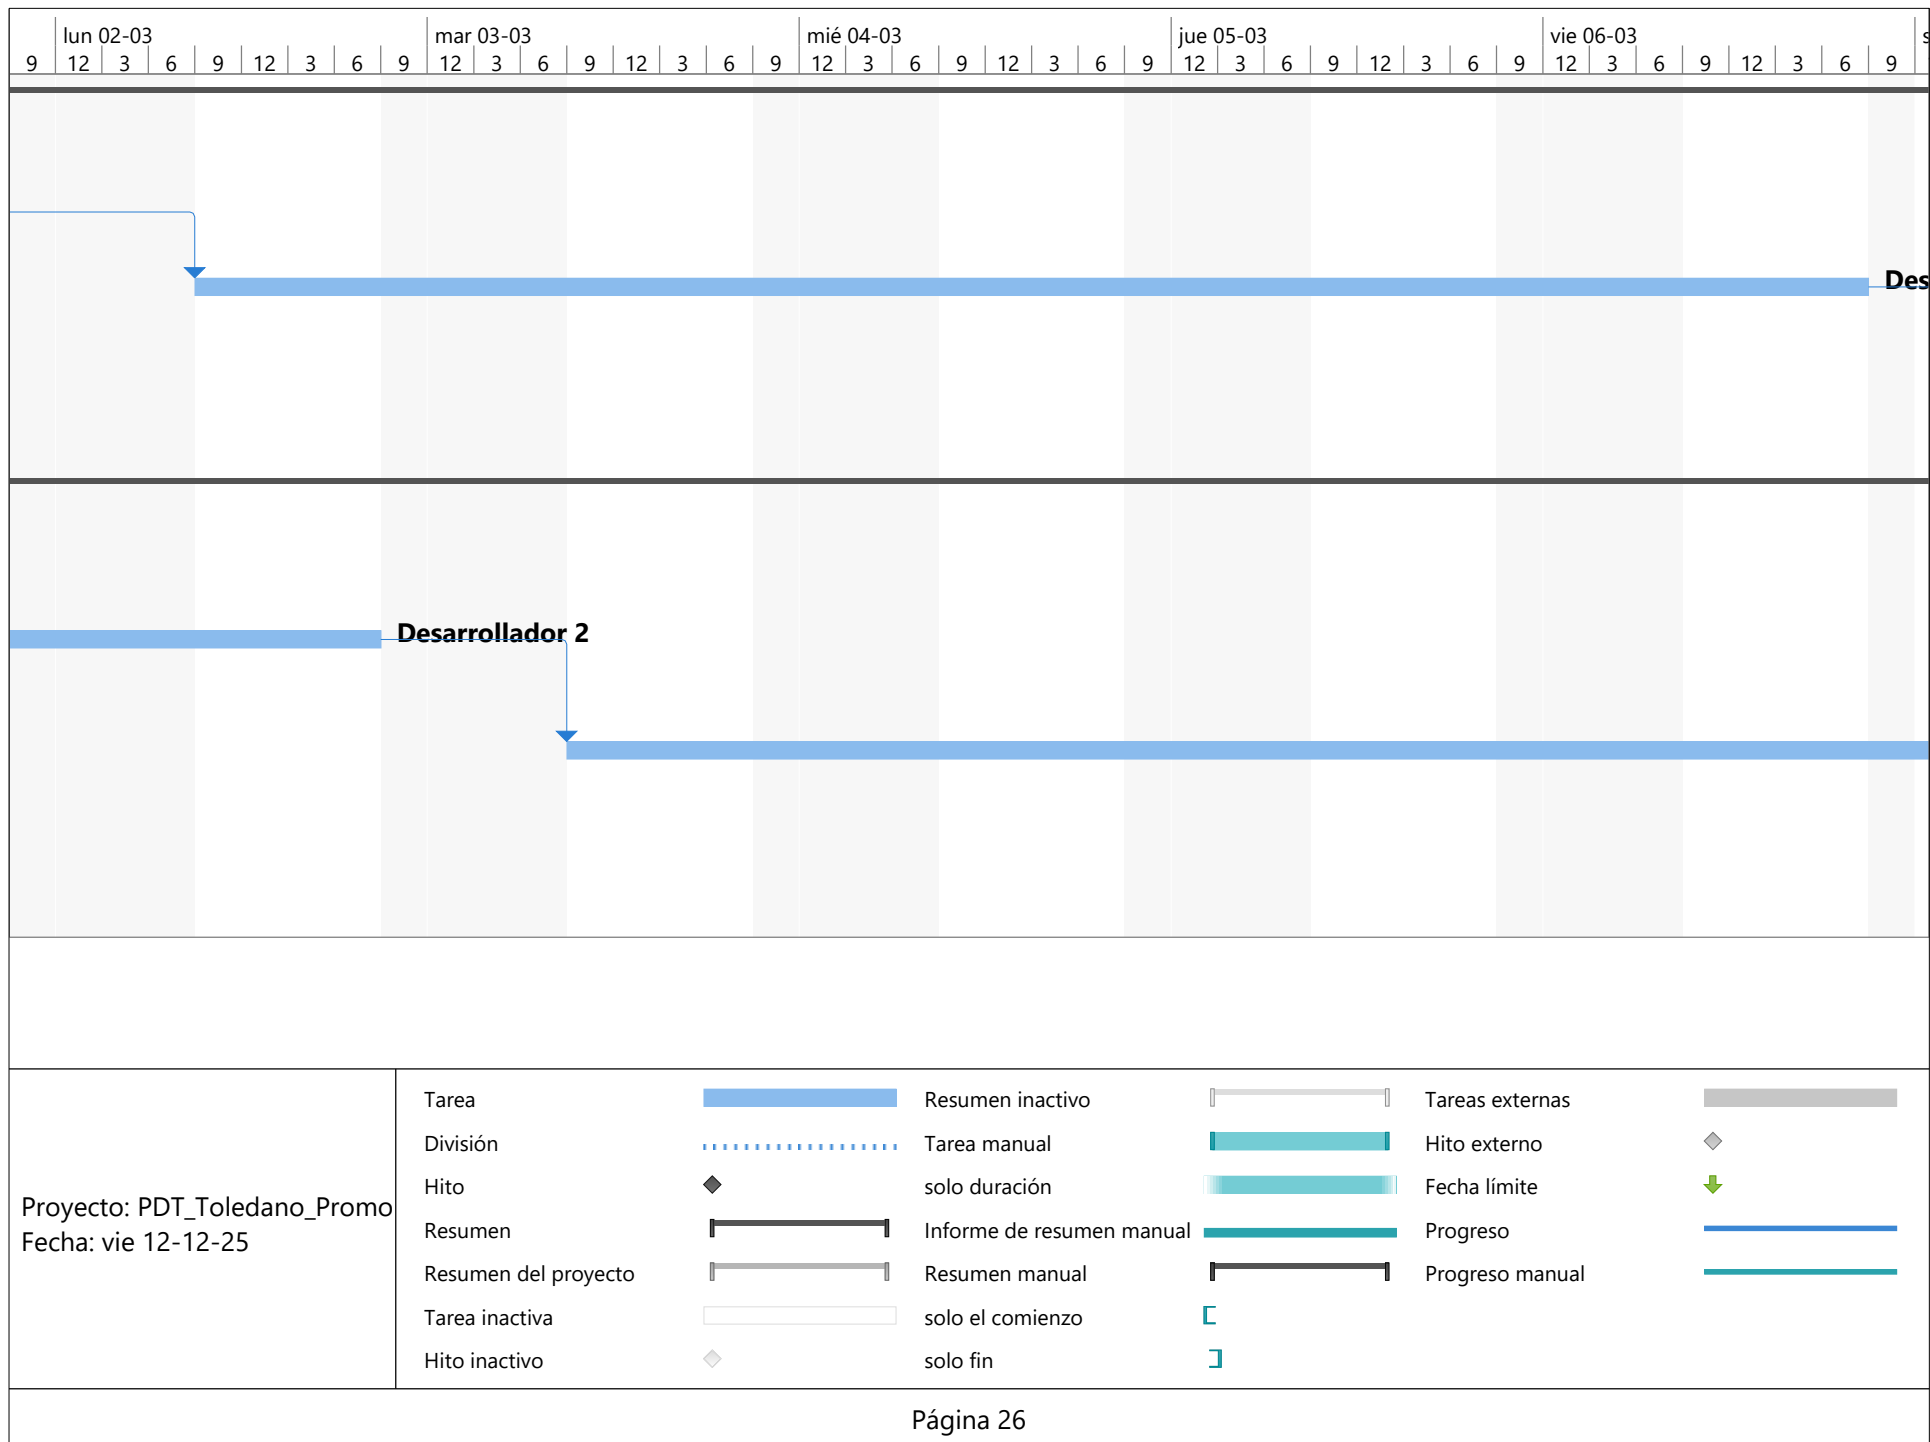




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

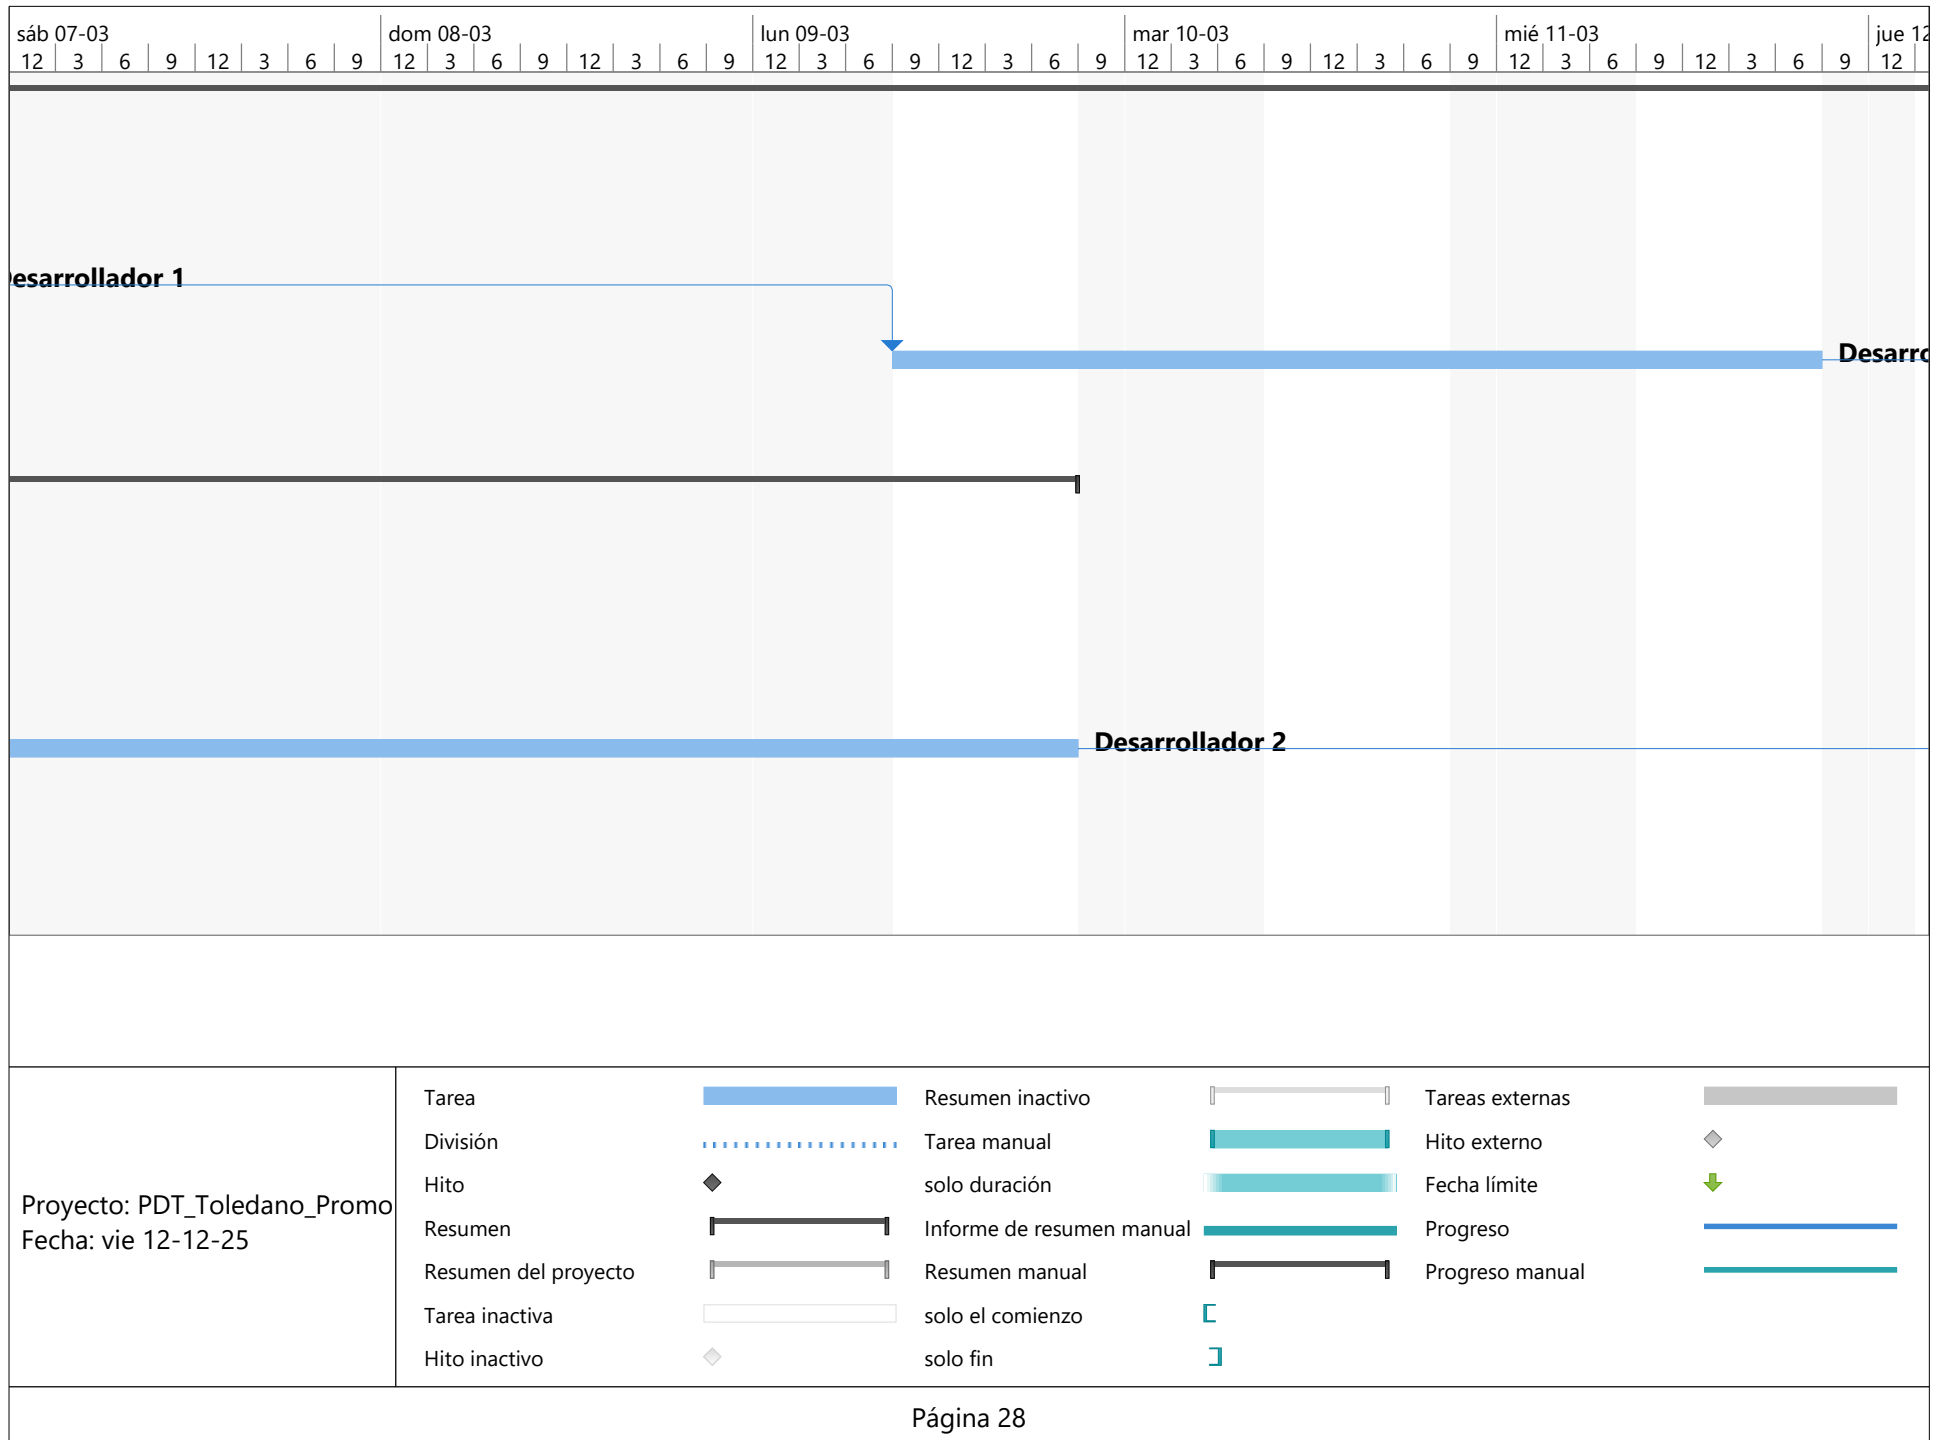


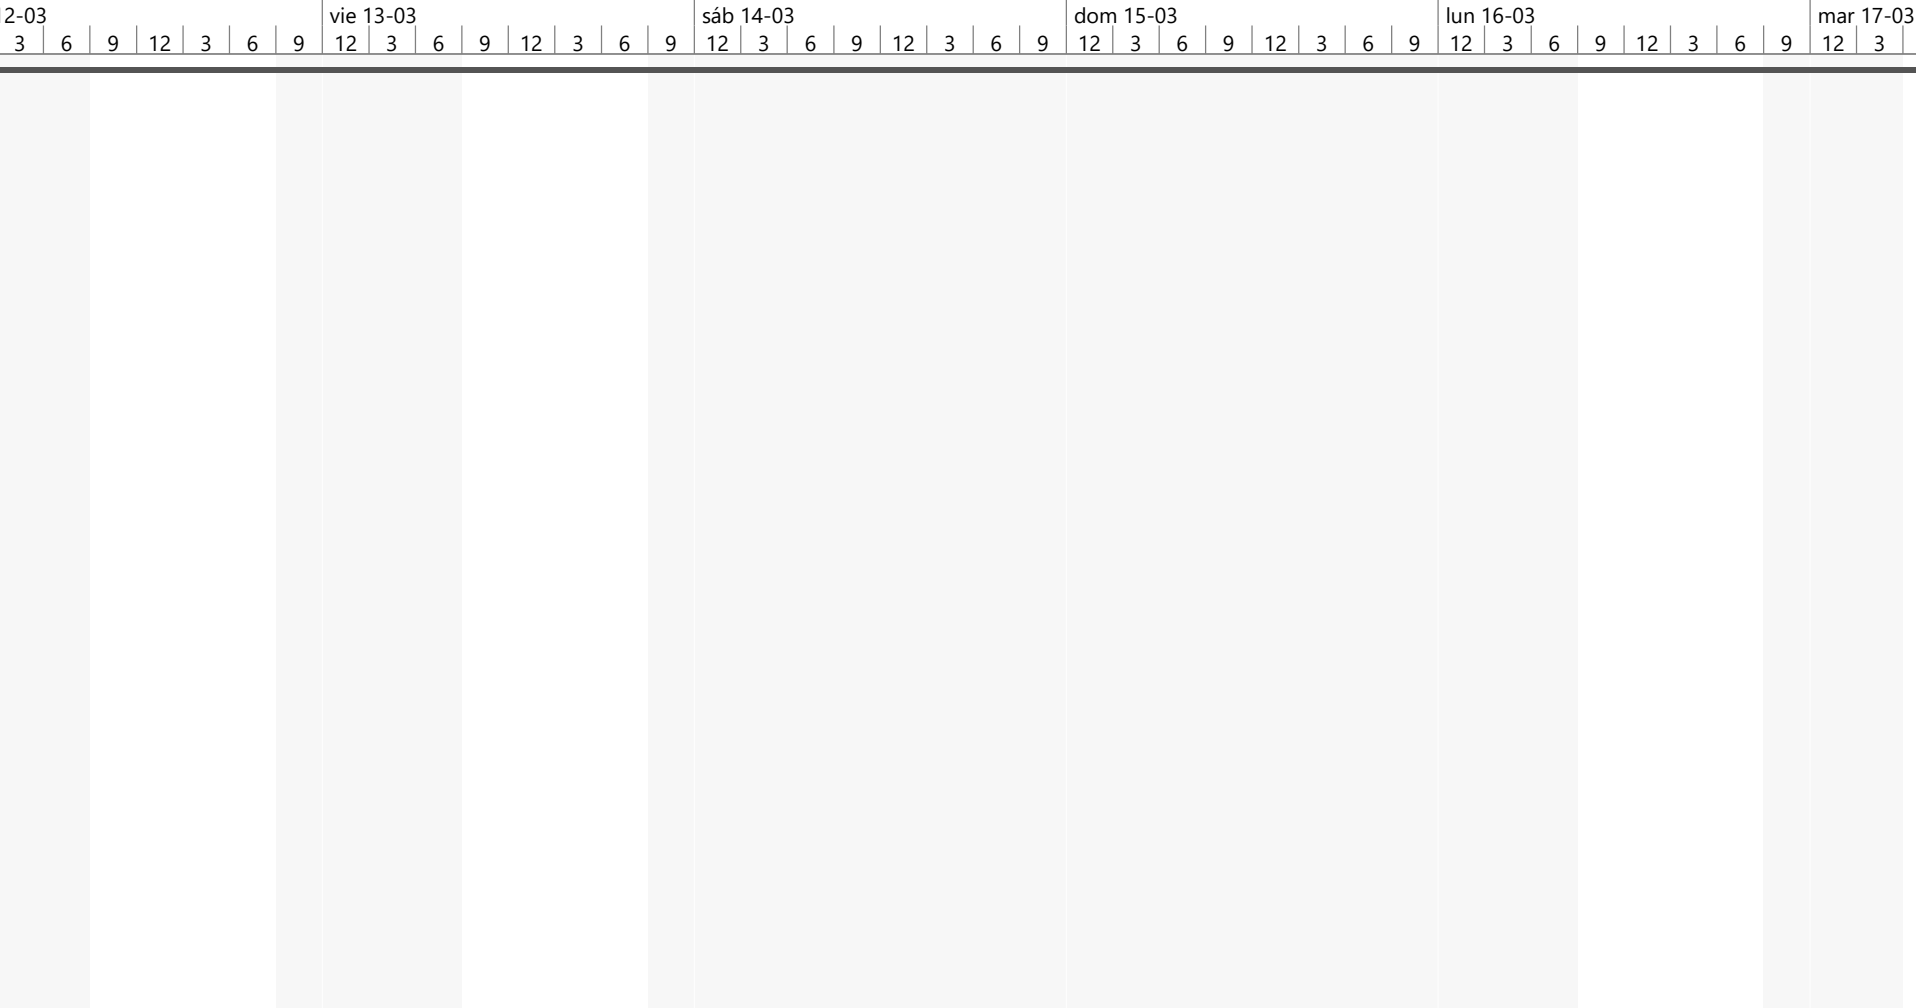



Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

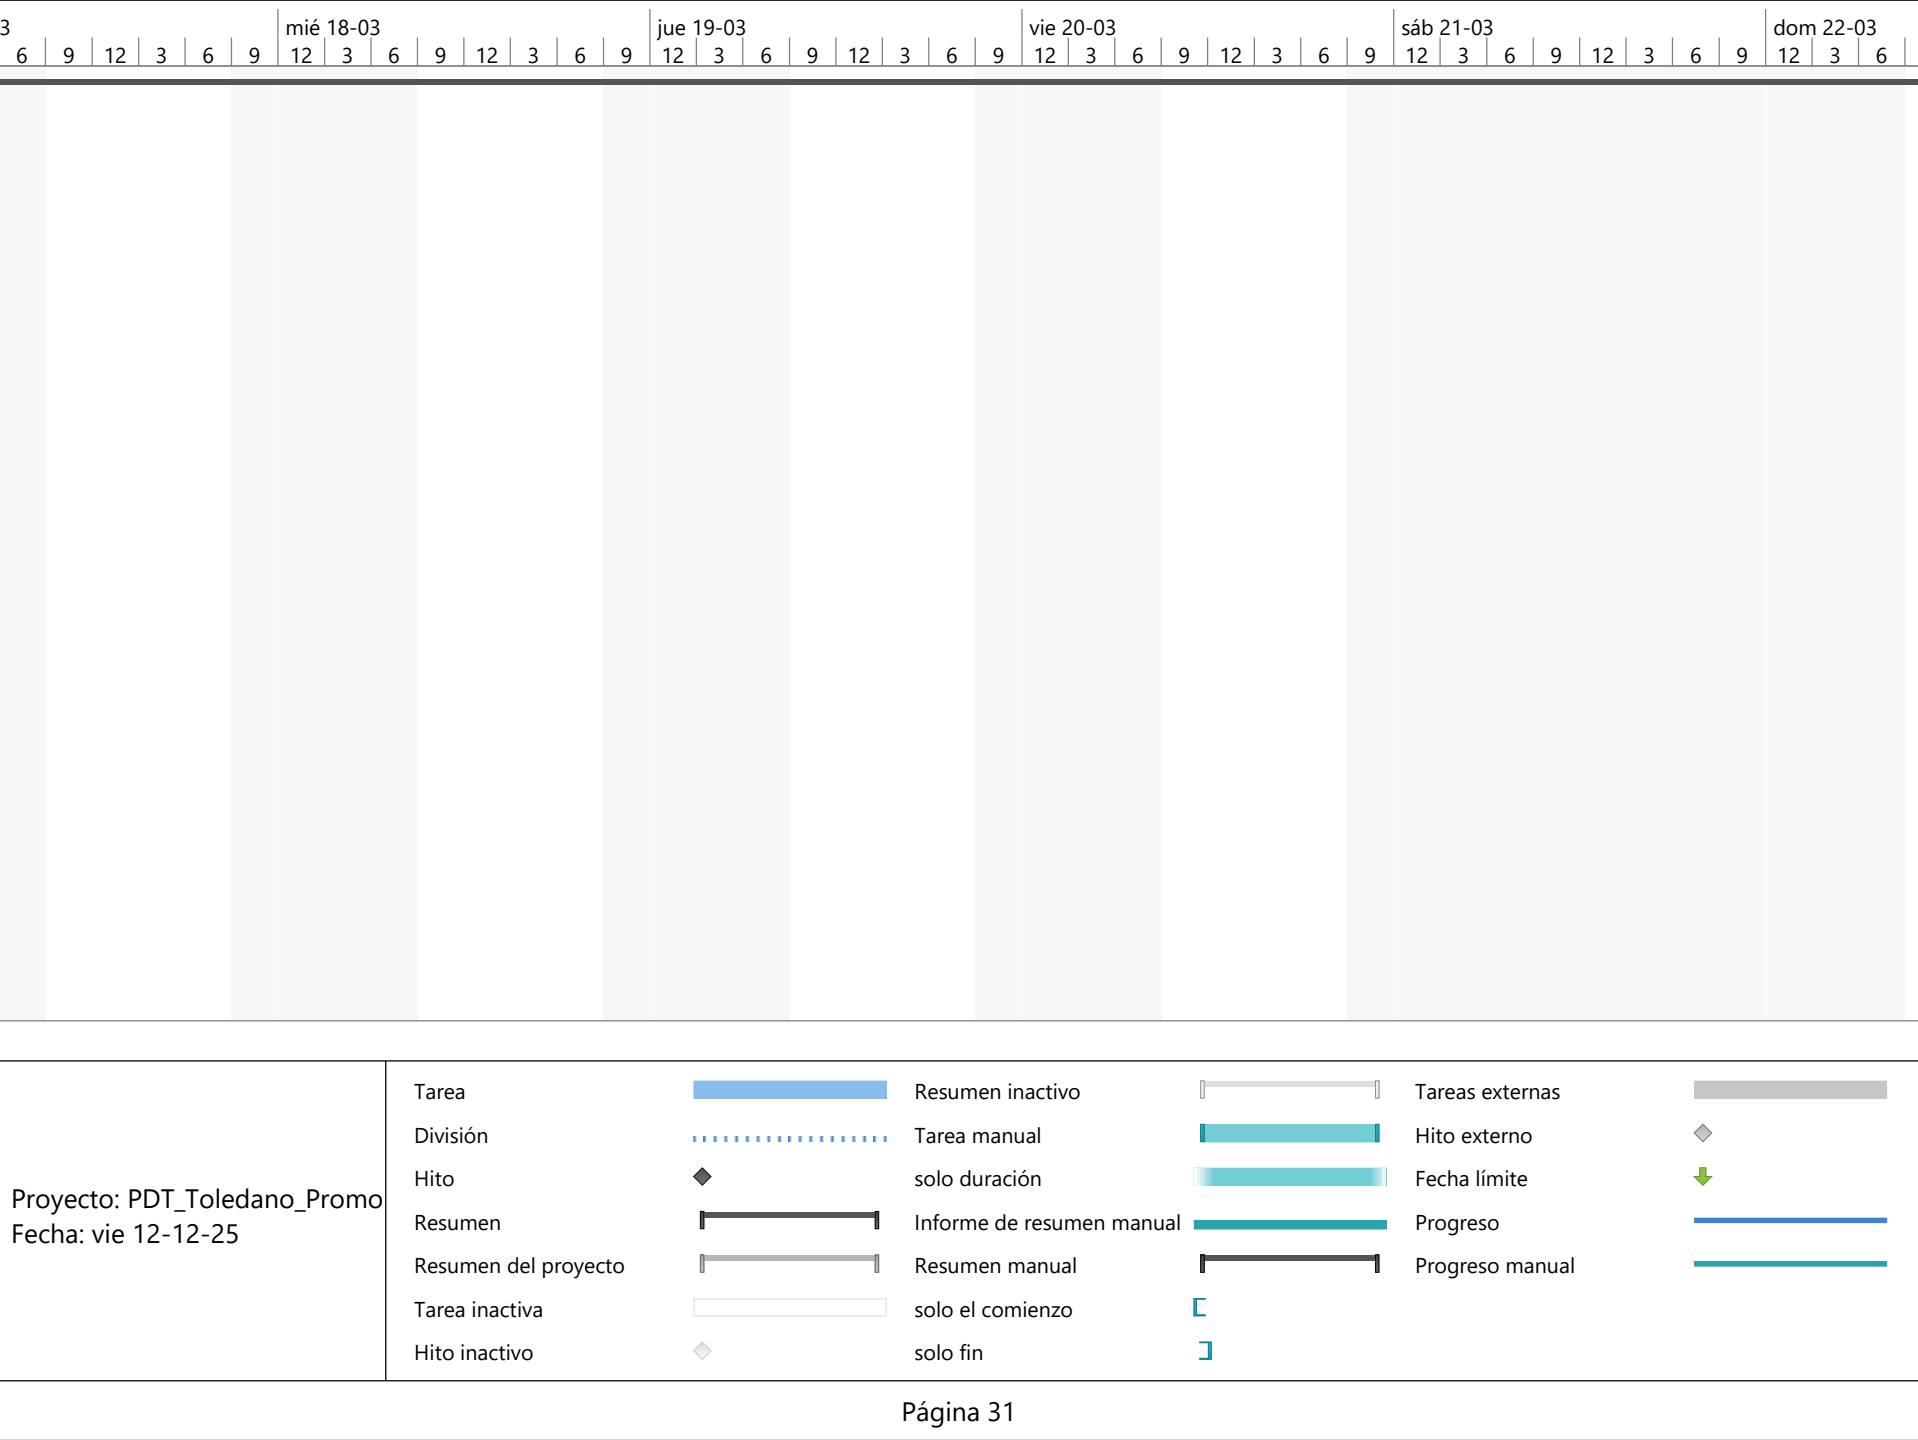


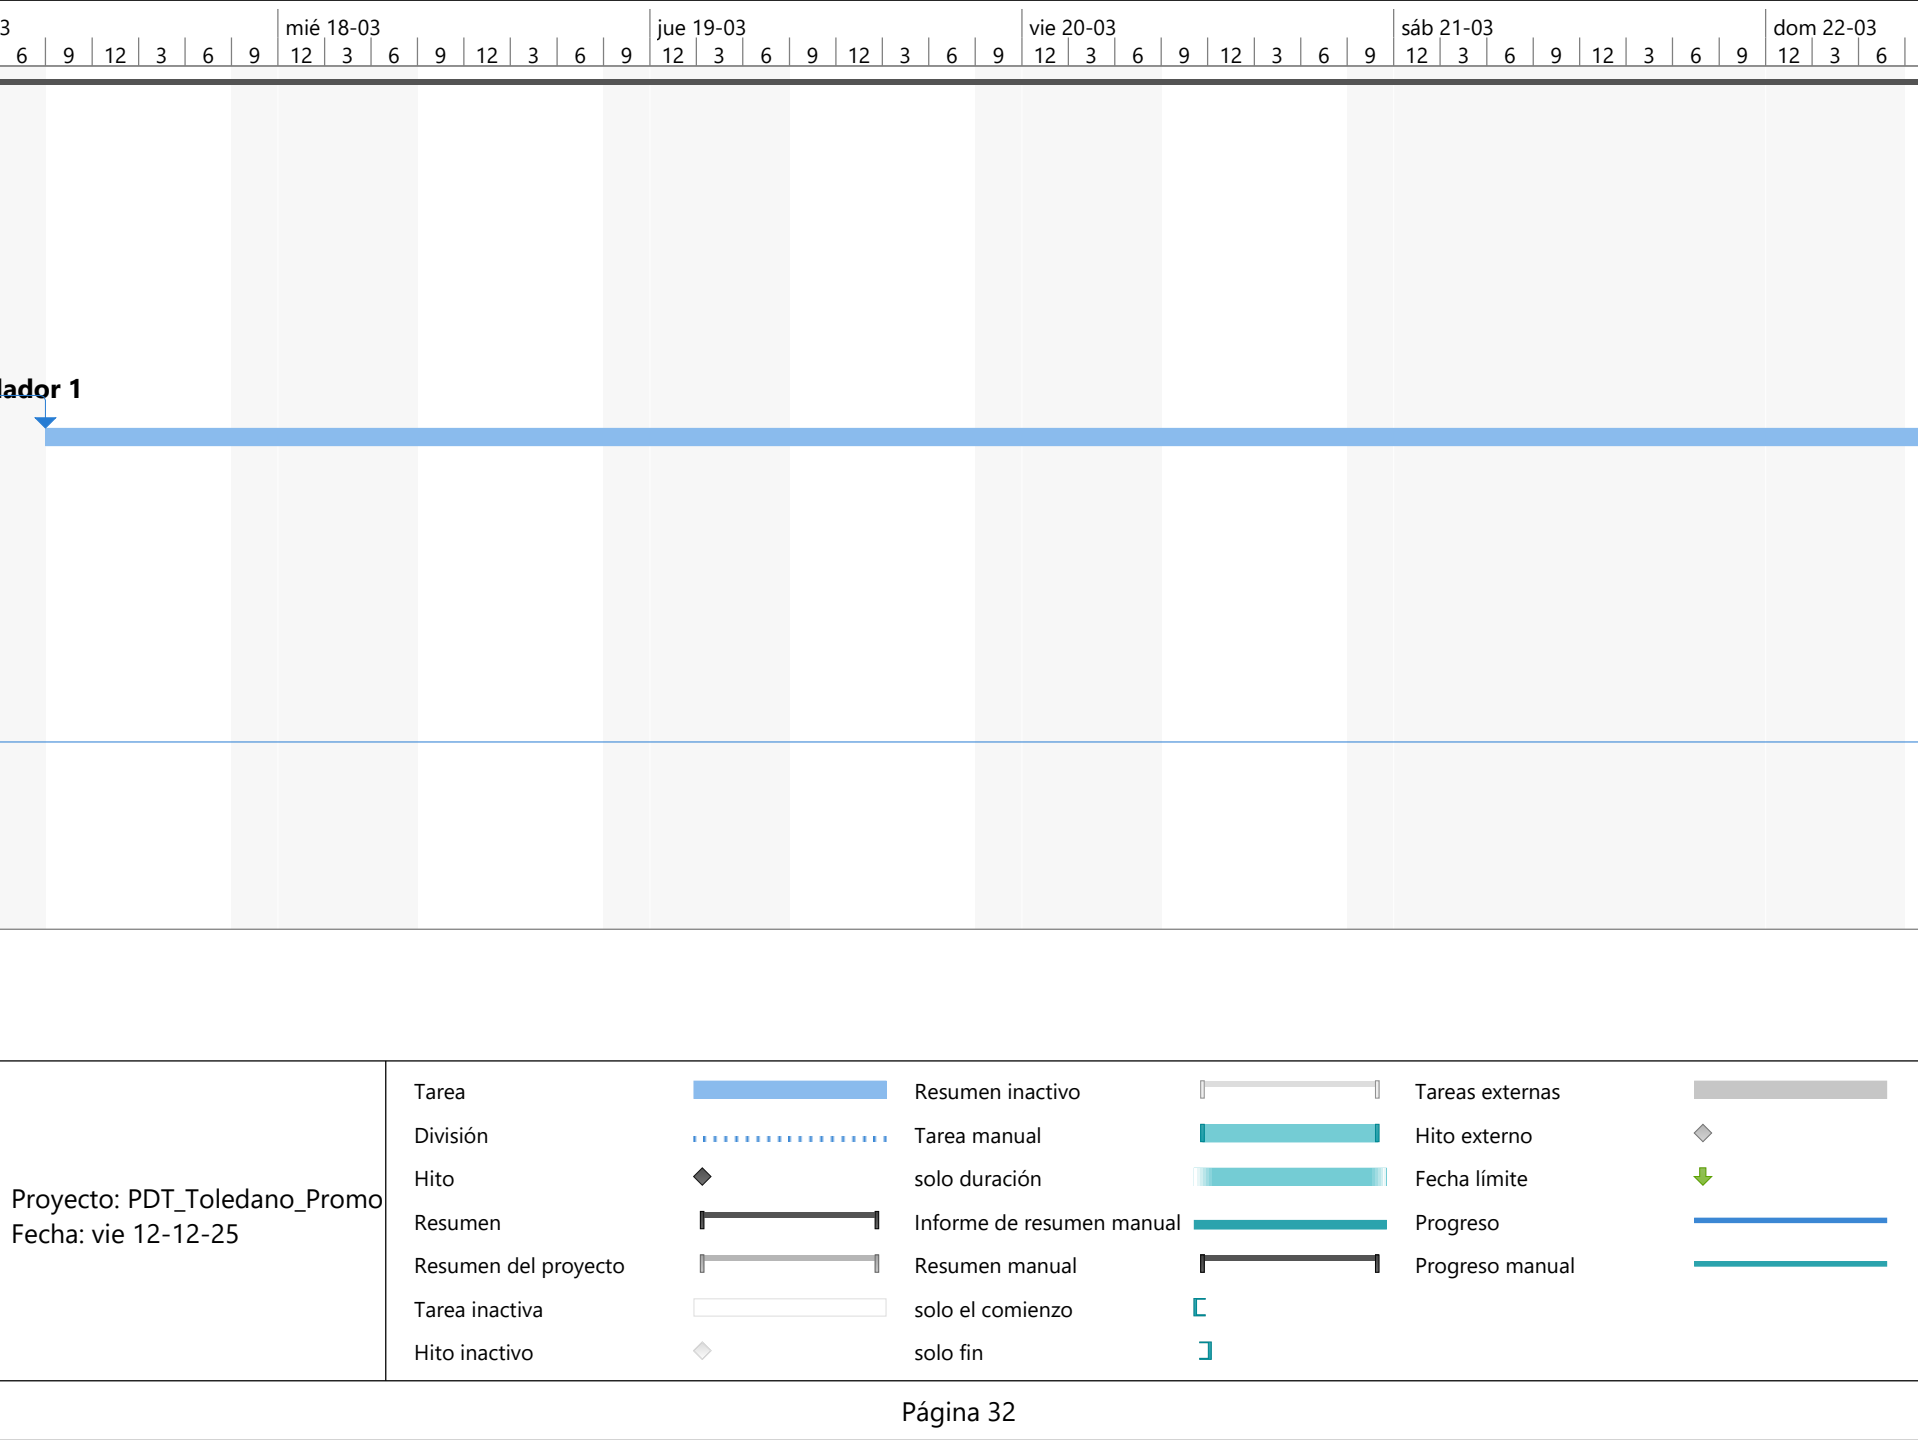


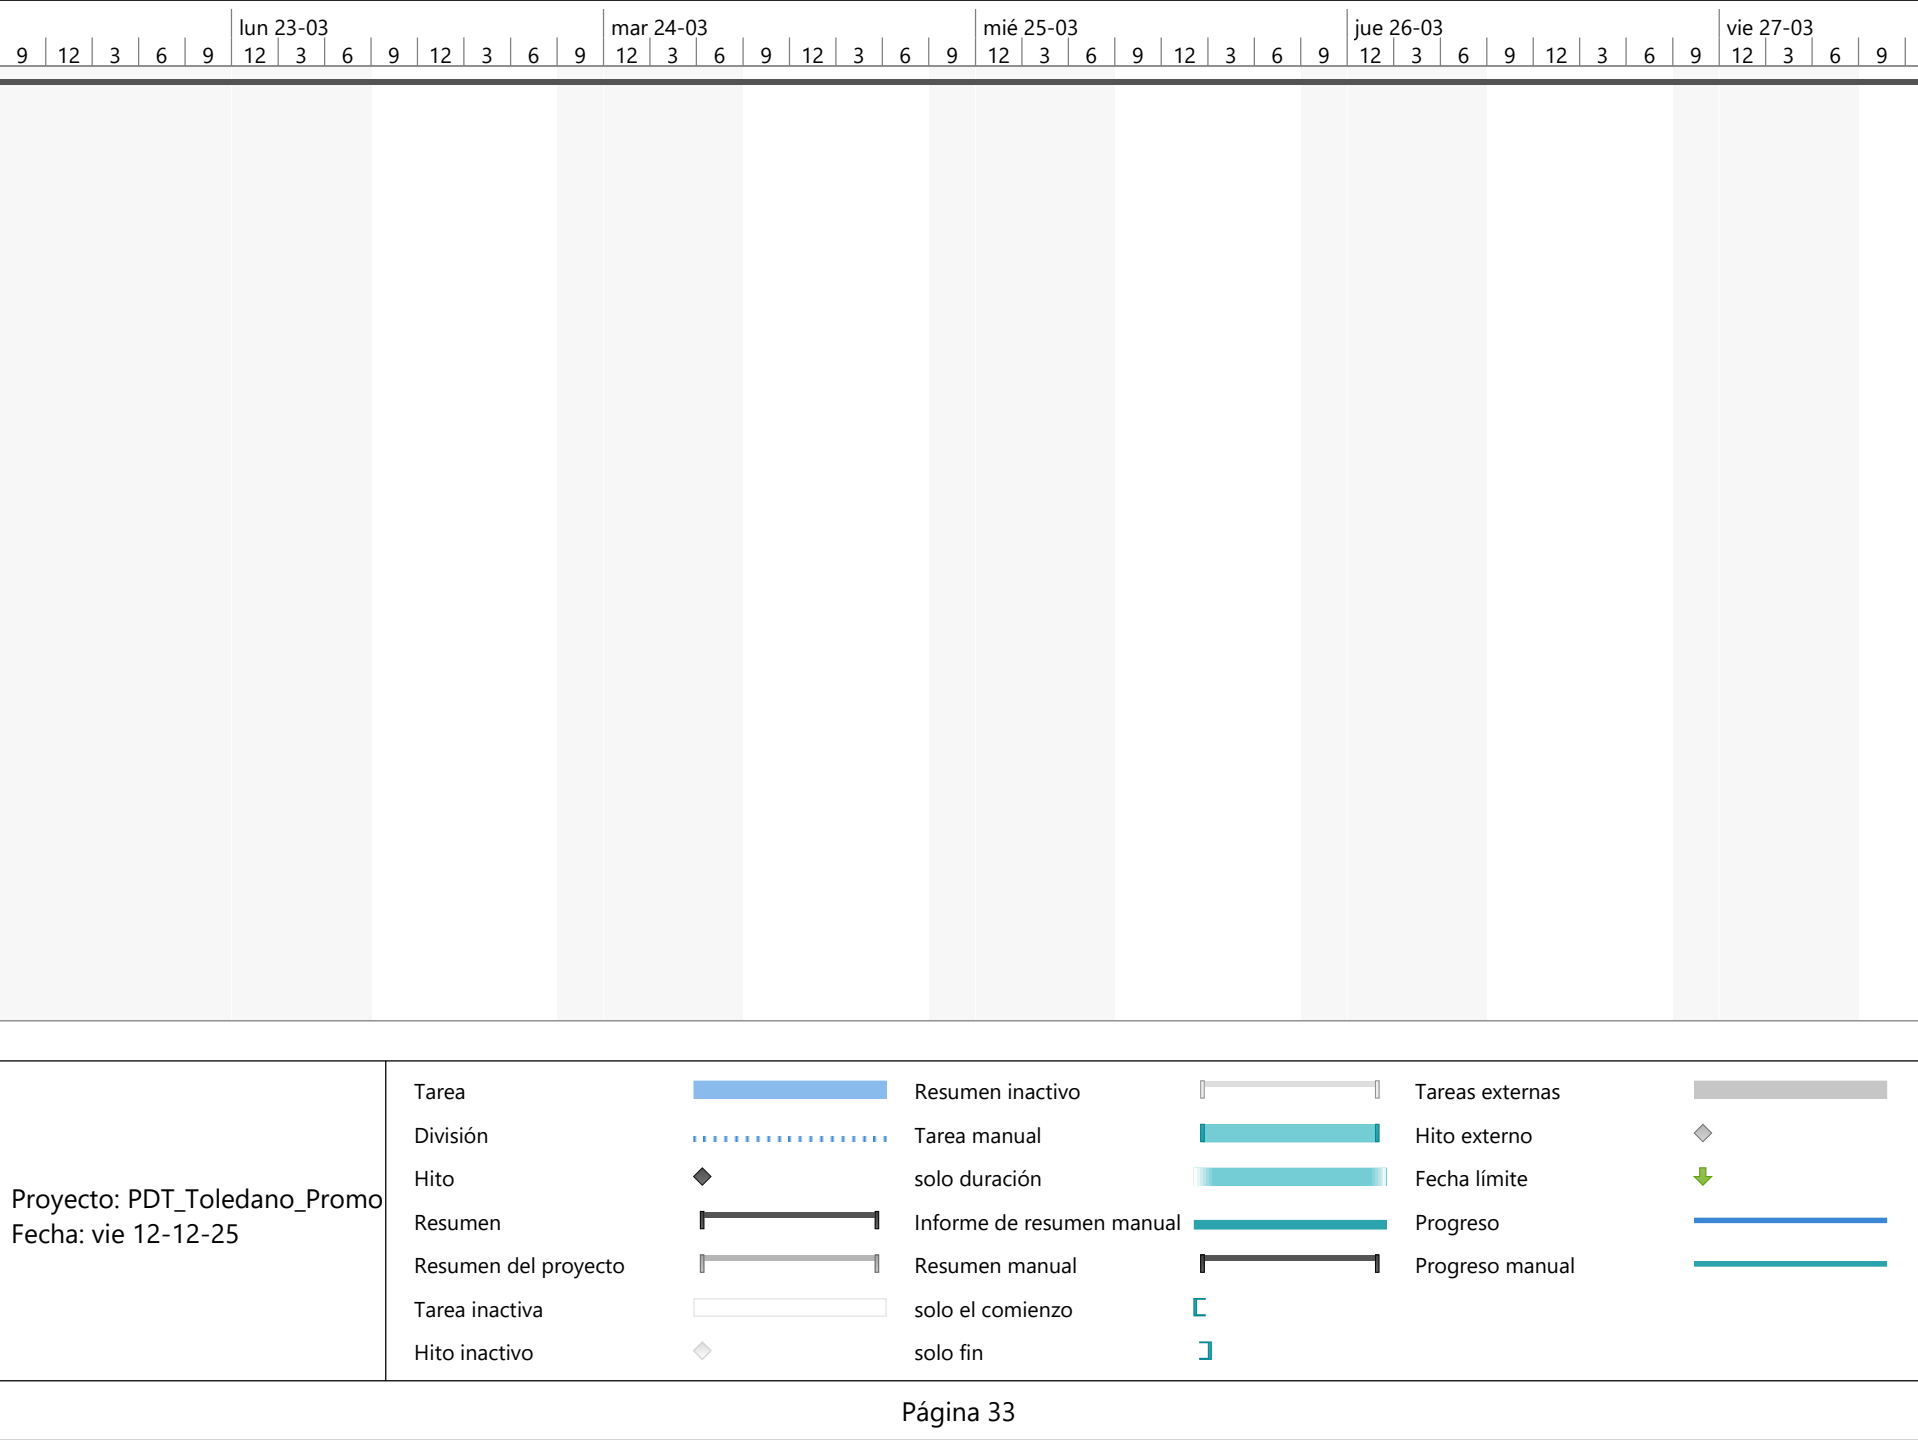


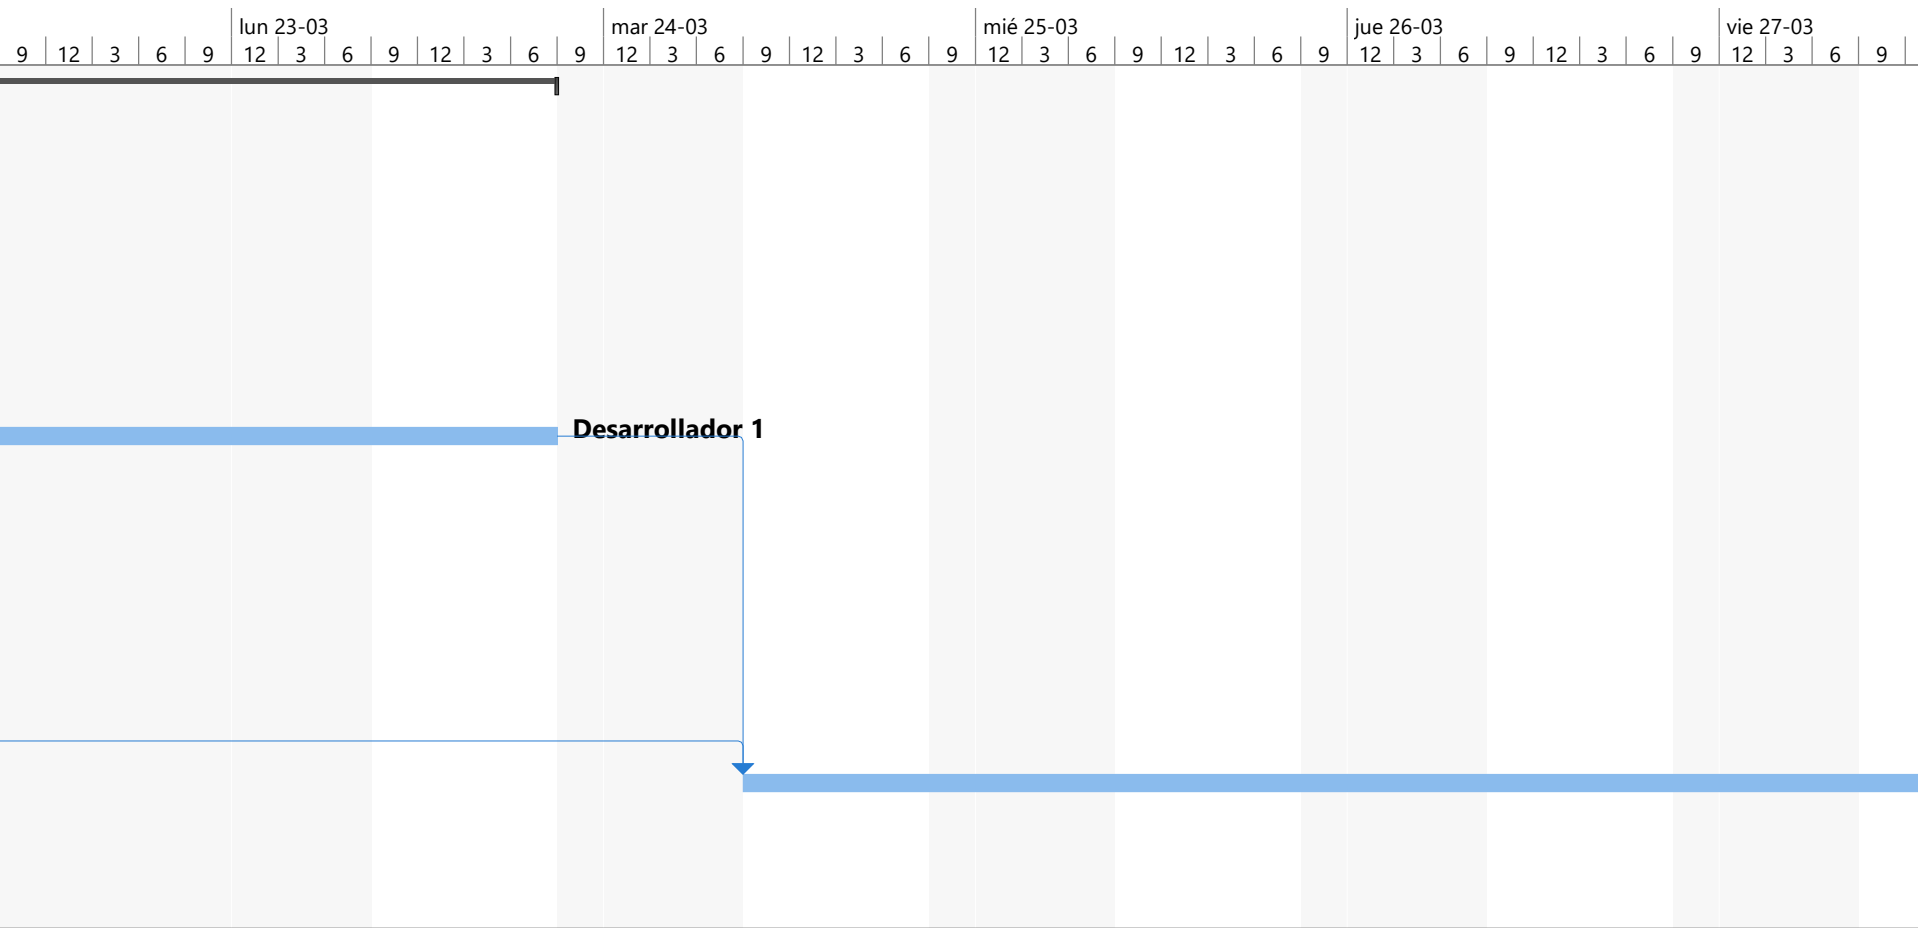

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

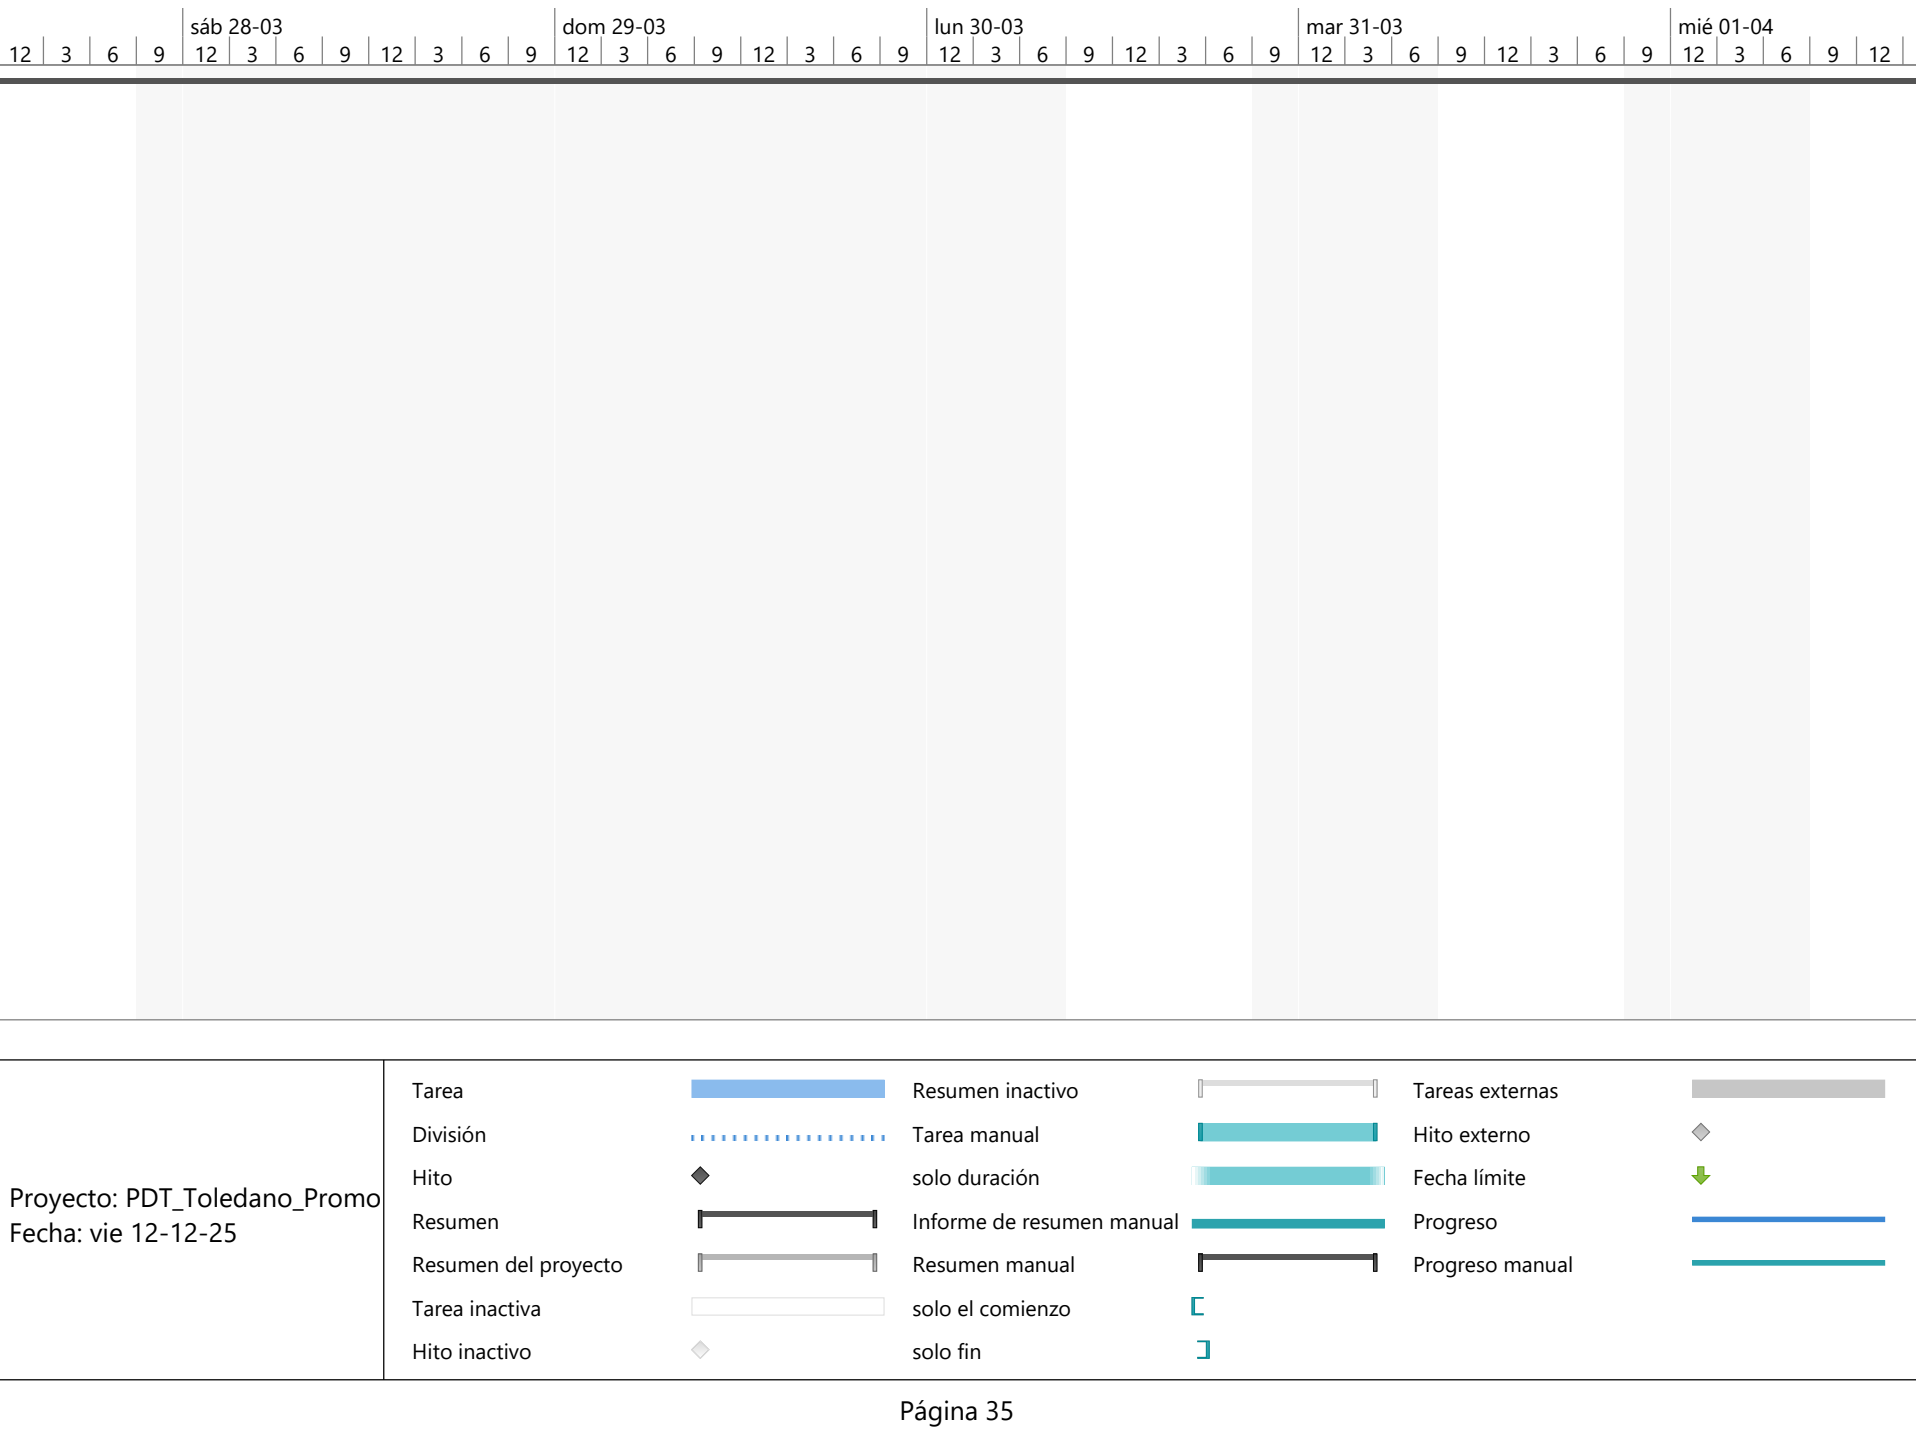


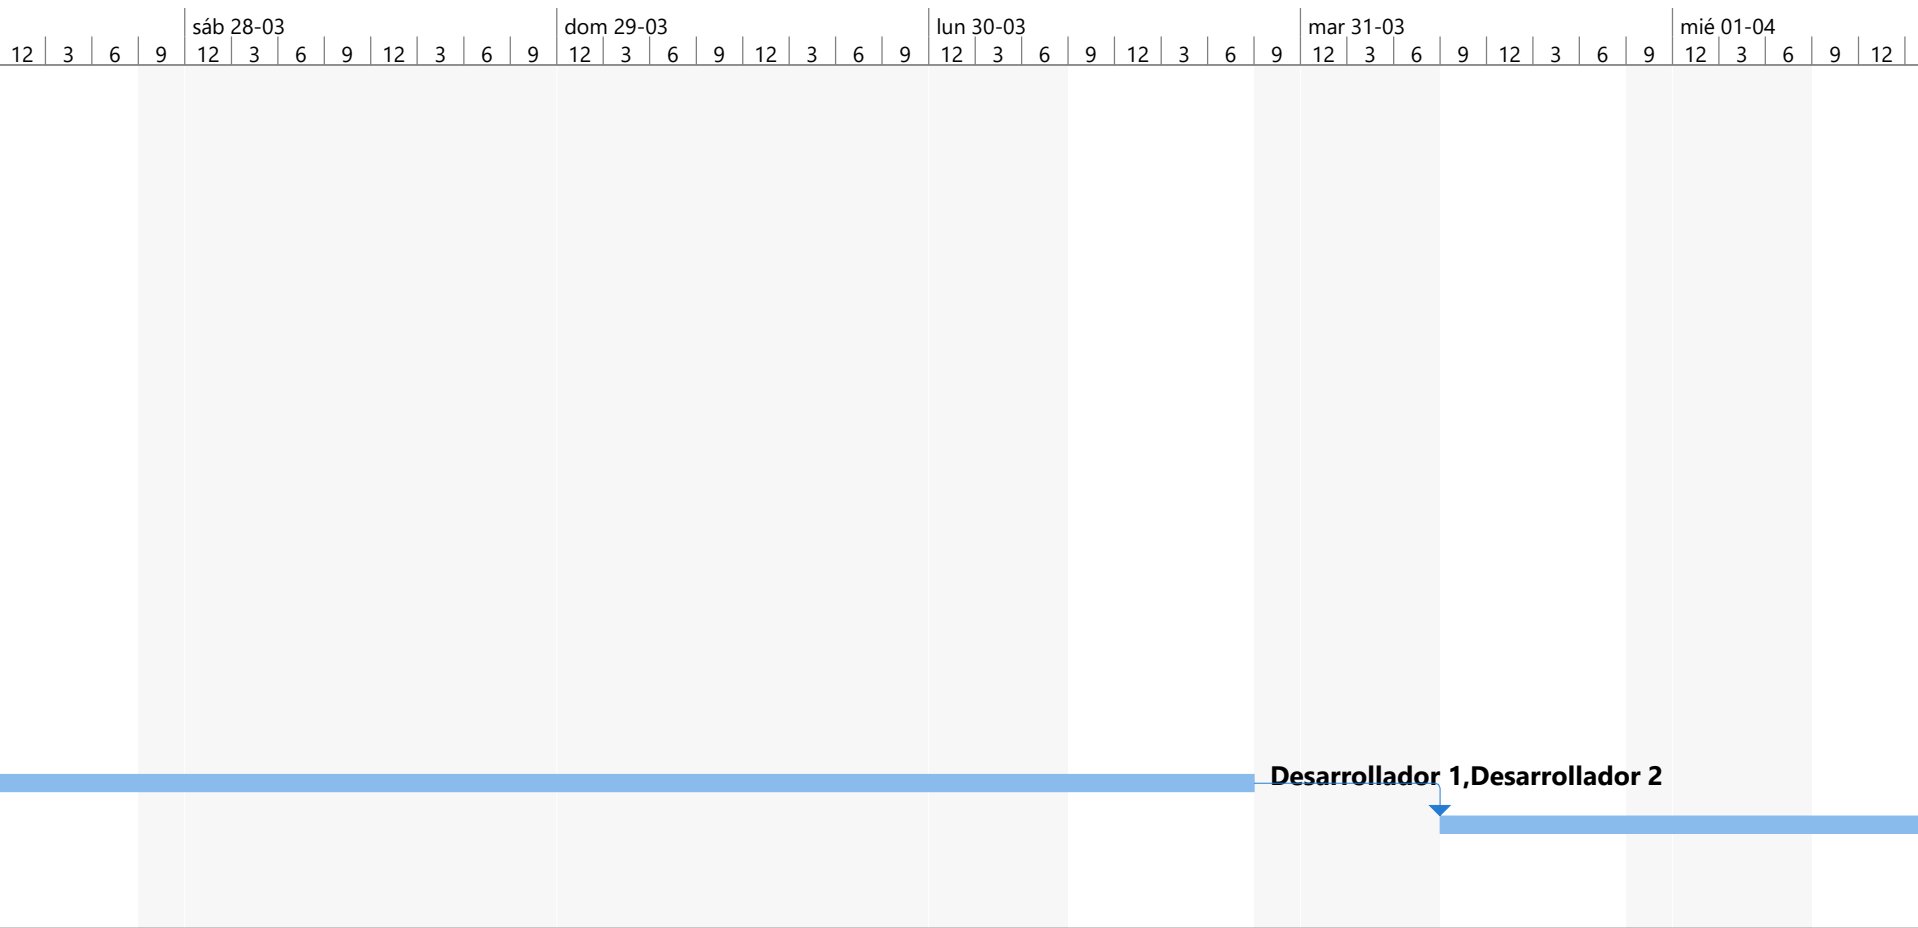



Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



[illegible]




Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

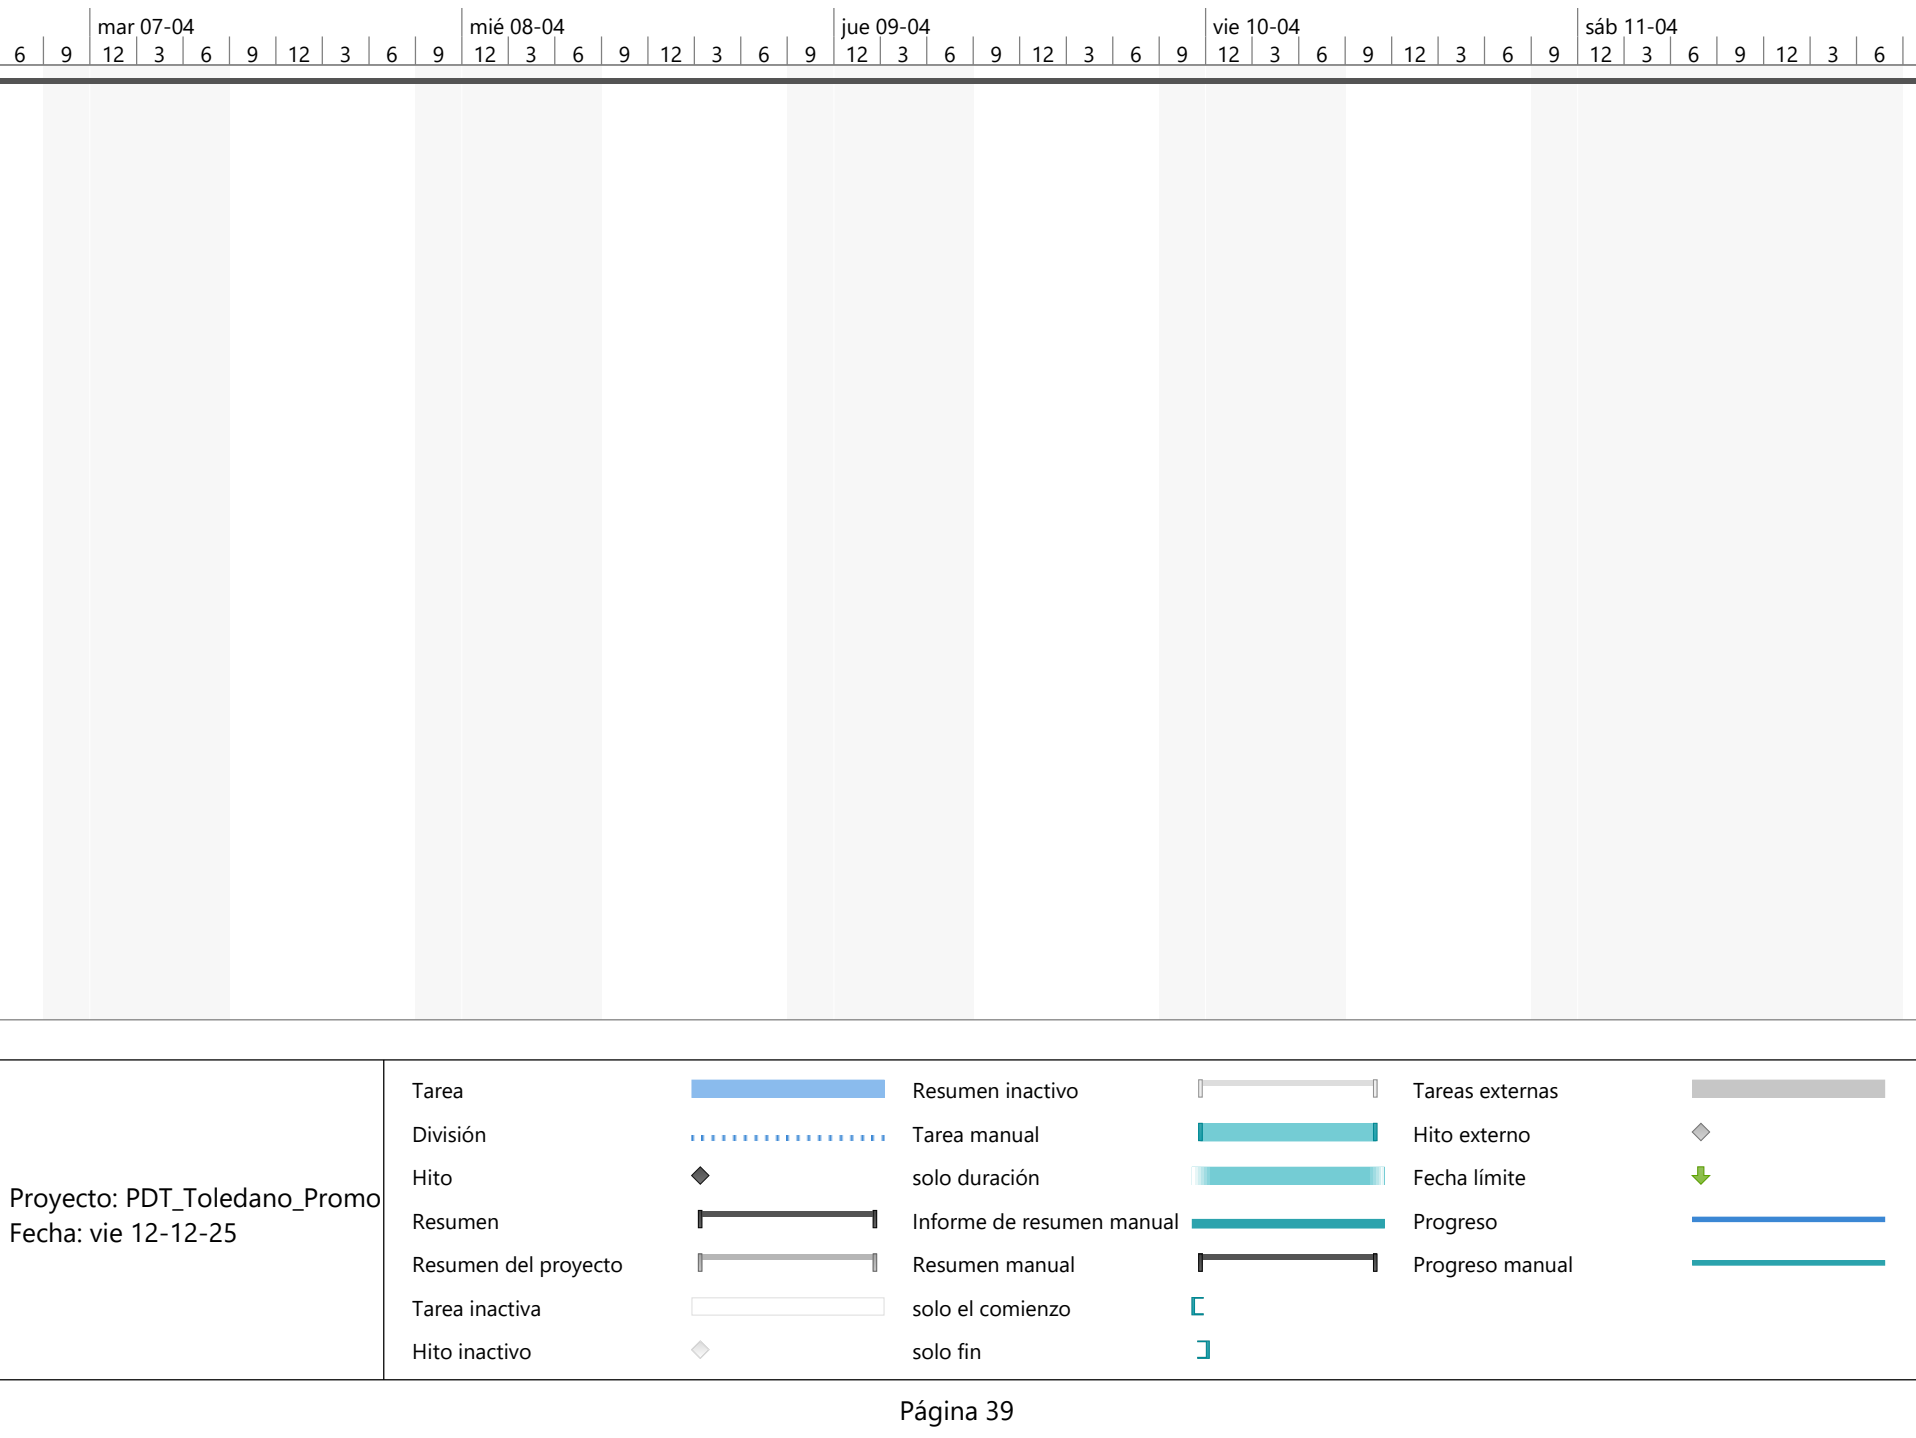

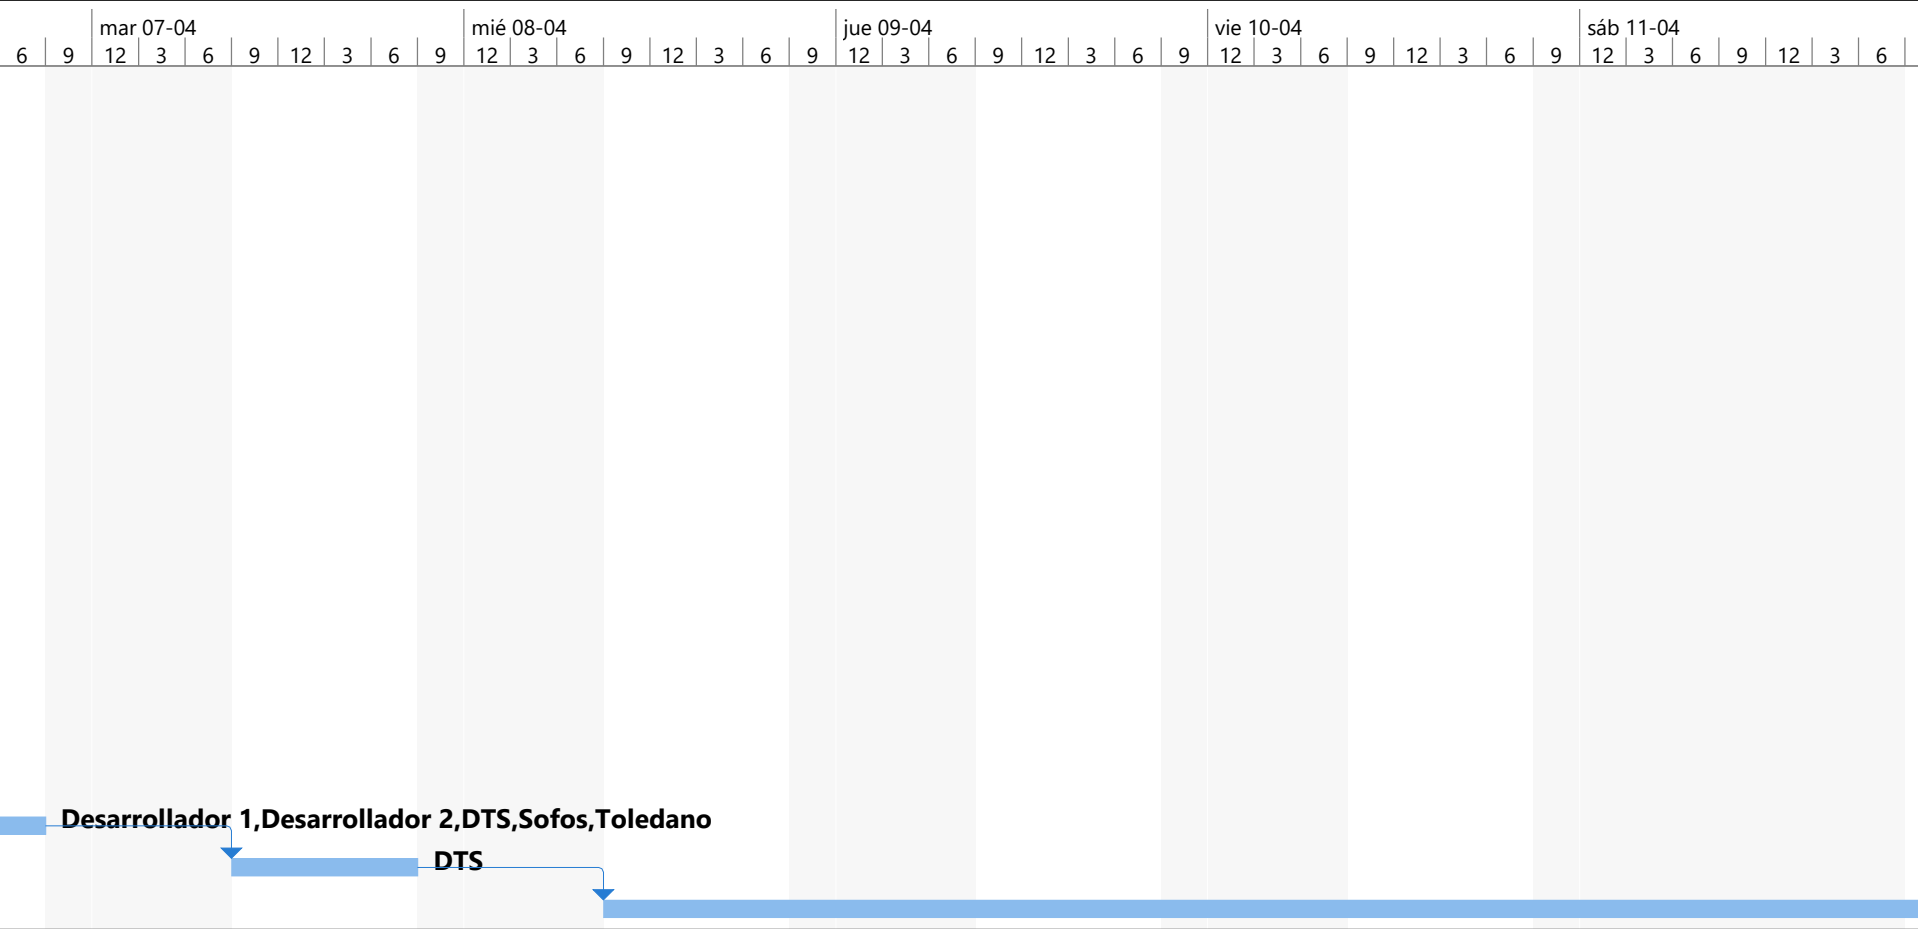


Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

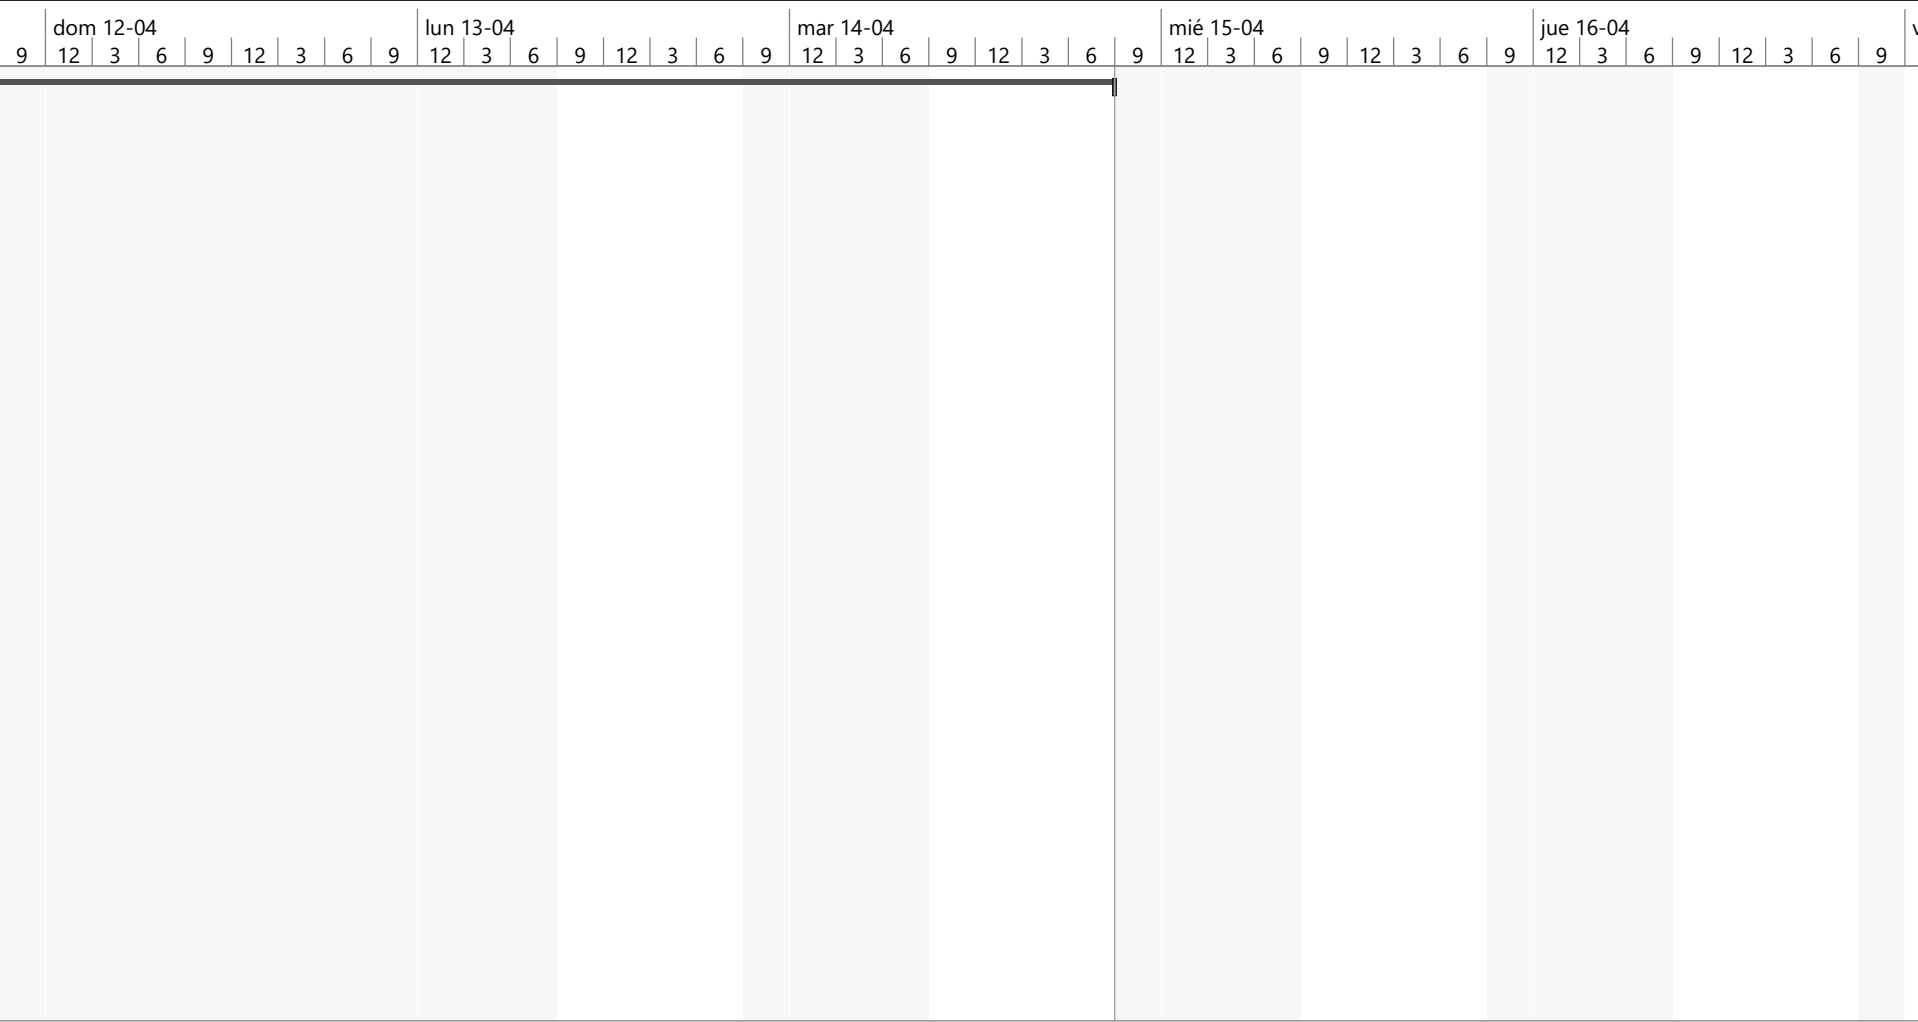

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: vie 12-12-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

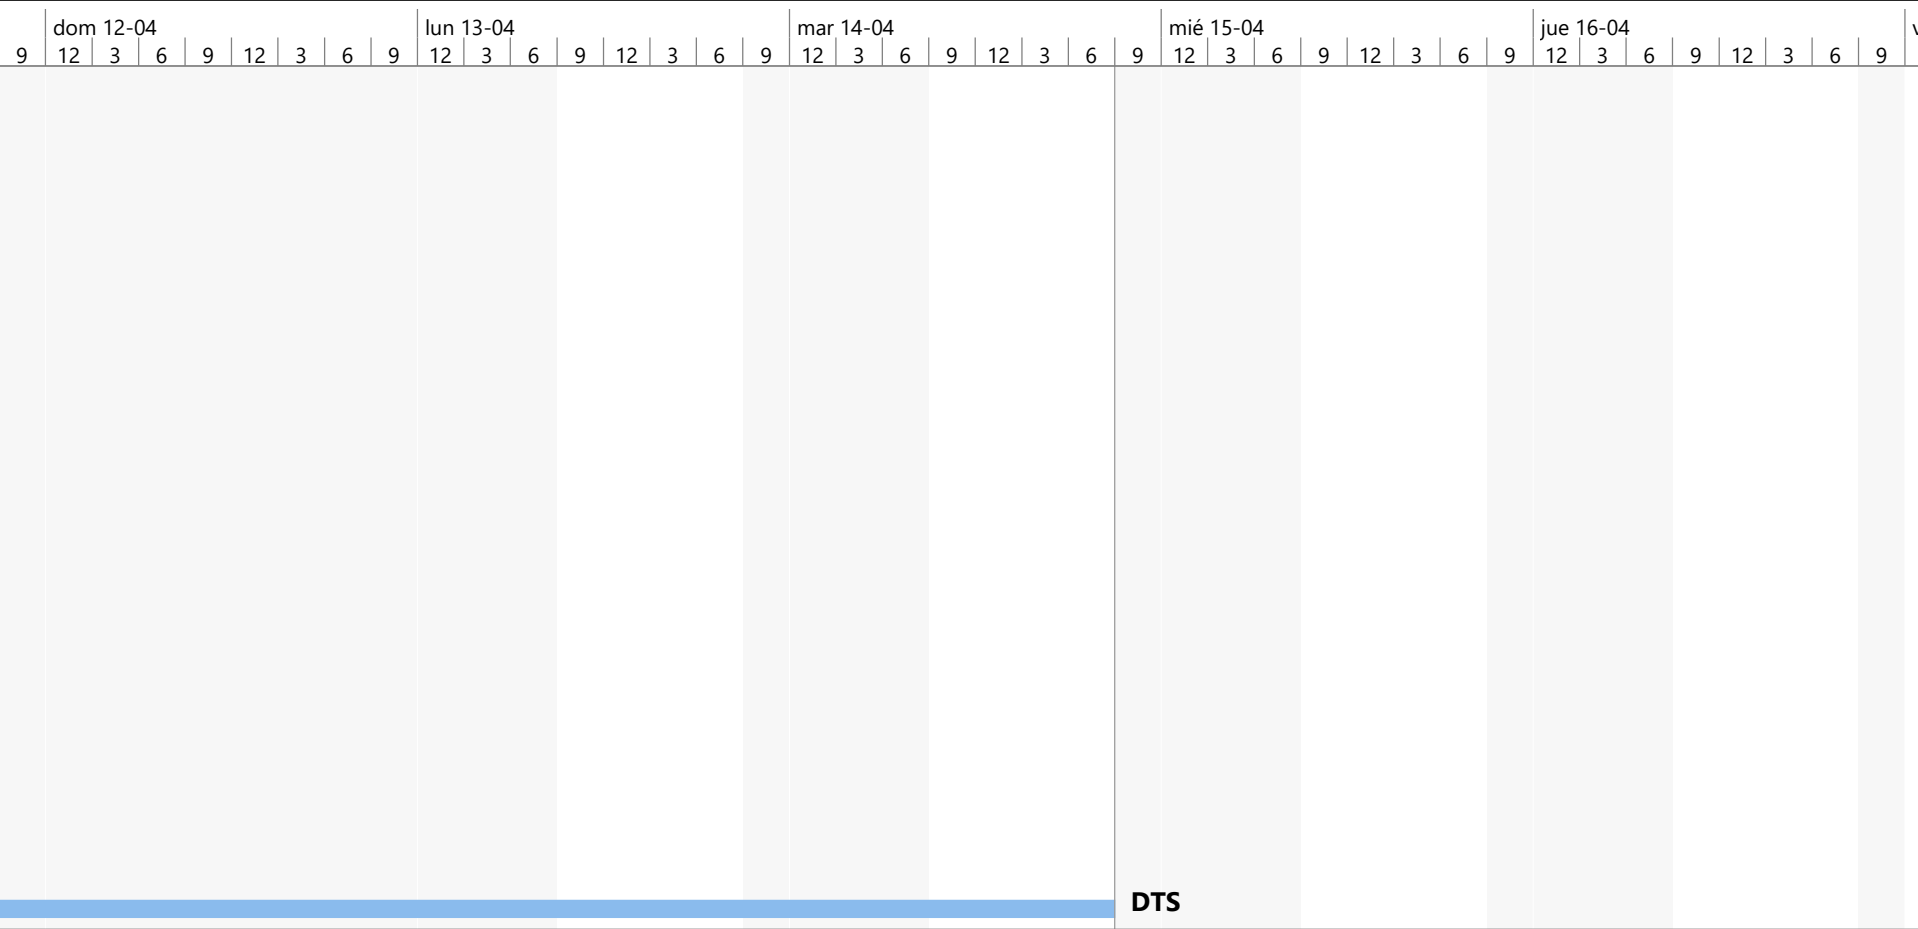

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
