



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			Plan de trabajo Promociones ROAD Fase 2	54 días	mié 15-04-26	lun 29-06-26	
2			Análisis y diseño de promociones	5 días	mié 15-04-26	mar 21-04-26	
3			Desarrollos para integración de bonificaciones con SAP	28 días	mié 22-04-26	vie 29-05-26	
4			Sesión para definir mapeos entre las tablas de SAP y ROAD	2 días	mié 22-04-26	jue 23-04-26	2
5			Desarrollo de WebApi para recibir las mecánicas de SAP e insertarlas en las estructuras de ROAD	5 días	vie 24-04-26	jue 30-04-26	4
6			Modificaciones a las estructuras actuales de bonificaciones para poder recibir las promociones desde	2 días	vie 01-05-26	lun 04-05-26	5
7			Modificaciones a las tablas de inventario BOF por manejo de las promociones.	2 días	mar 05-05-26	mié 06-05-26	6
8			Modificaciones a las tablas de inventario HH por manejo de las promociones.	2 días	jue 07-05-26	vie 08-05-26	7
9			Modificaciones al proceso de toma de pedidos por el manejo de productos bonificados, en cuanto al manejo del inventario.	5 días	lun 11-05-26	vie 15-05-26	8
10			Modificaciones al proceso actual de prefactura por la carga de las bonificaciones y el manejo del inventario	5 días	lun 18-05-26	vie 22-05-26	9
11			Envío de bonificaciones aplicados hacia SAP utilizando la tabla intermedia	5 días	lun 25-05-26	vie 29-05-26	10
12			Reportes BOF análisis y desarrollo	5 días	jue 07-05-26	mié 13-05-26	7
13			Reportes PDA análisis y desarrollo	5 días	lun 01-06-26	vie 05-06-26	11
14			Pruebas interface	5 días	lun 08-06-26	vie 12-06-26	13,12
15			Pruebas integrales	5 días	lun 15-06-26	vie 19-06-26	14
16			Publicación	1 día	lun 22-06-26	lun 22-06-26	15
17			Soporte posterior a implementación	5 días	mar 23-06-26	lun 29-06-26	16

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: vie 12-12-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

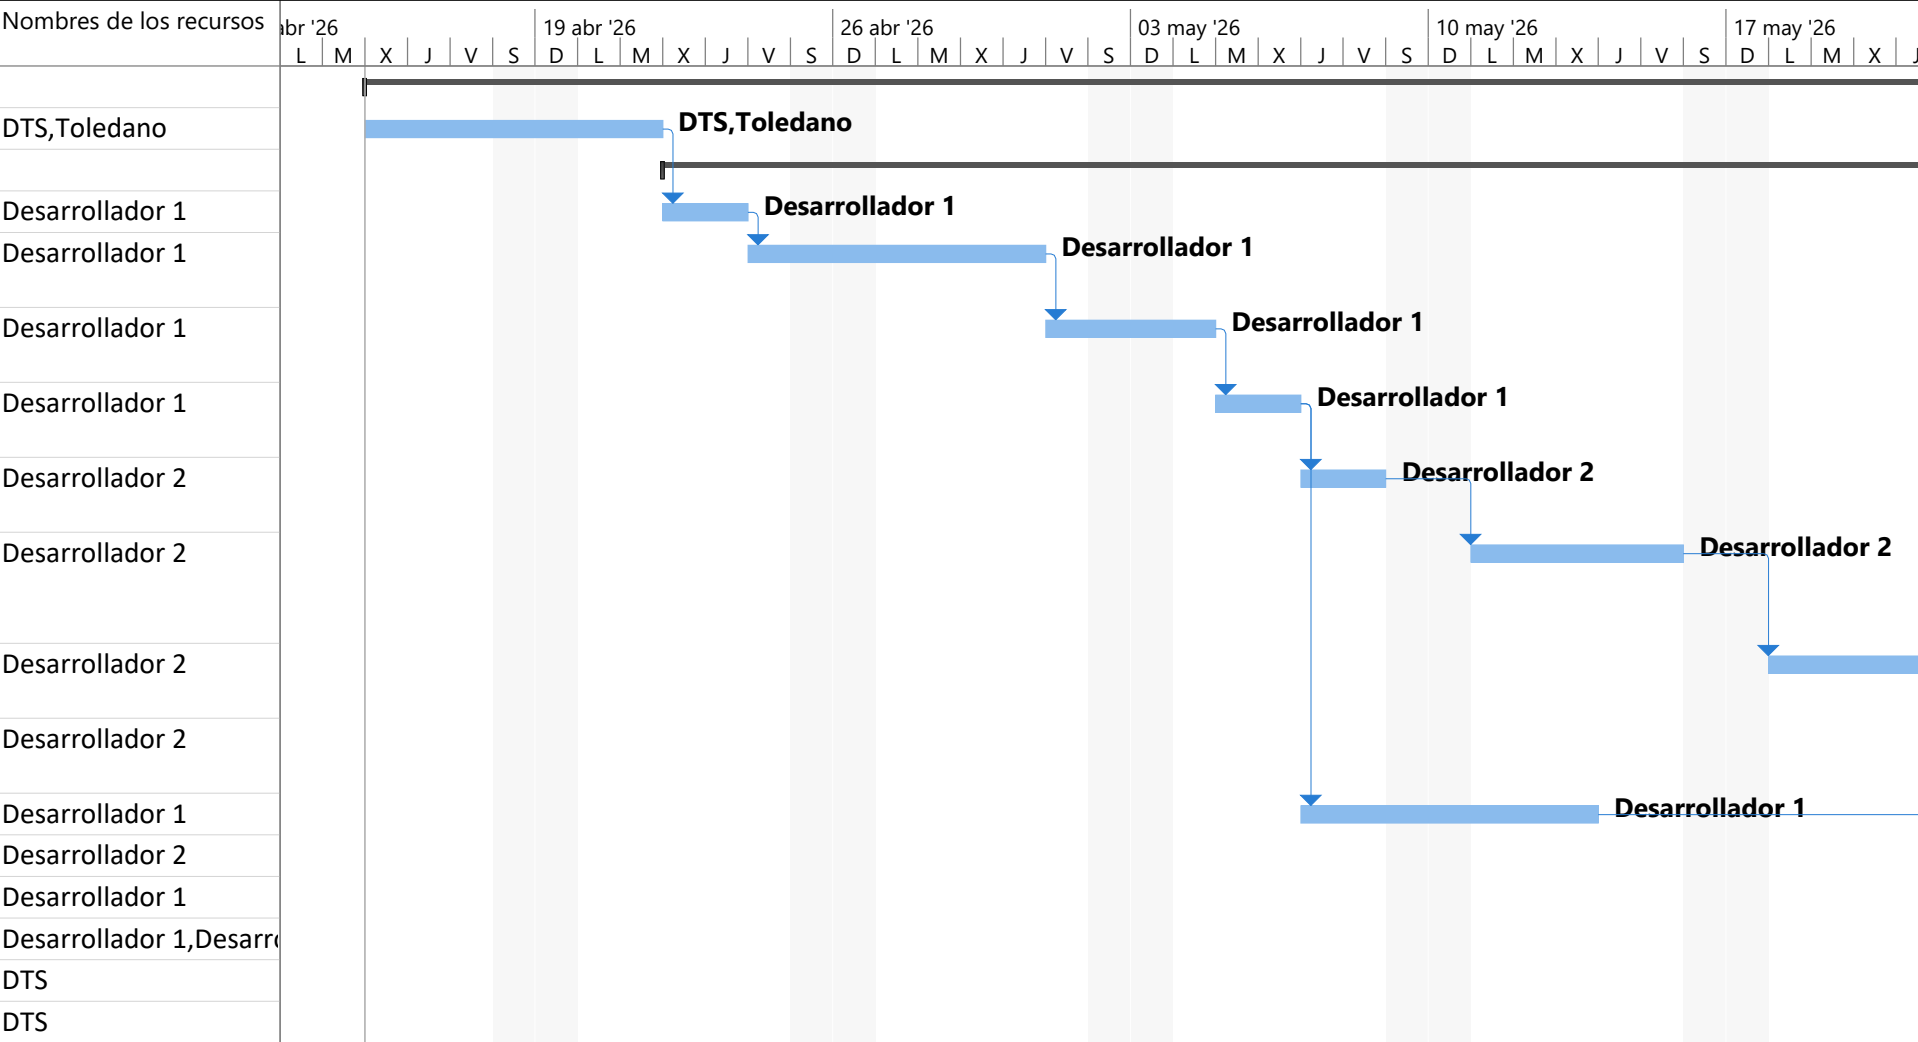

Proyecto: PDT_Toledano_Promo
Fecha: vie 12-12-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

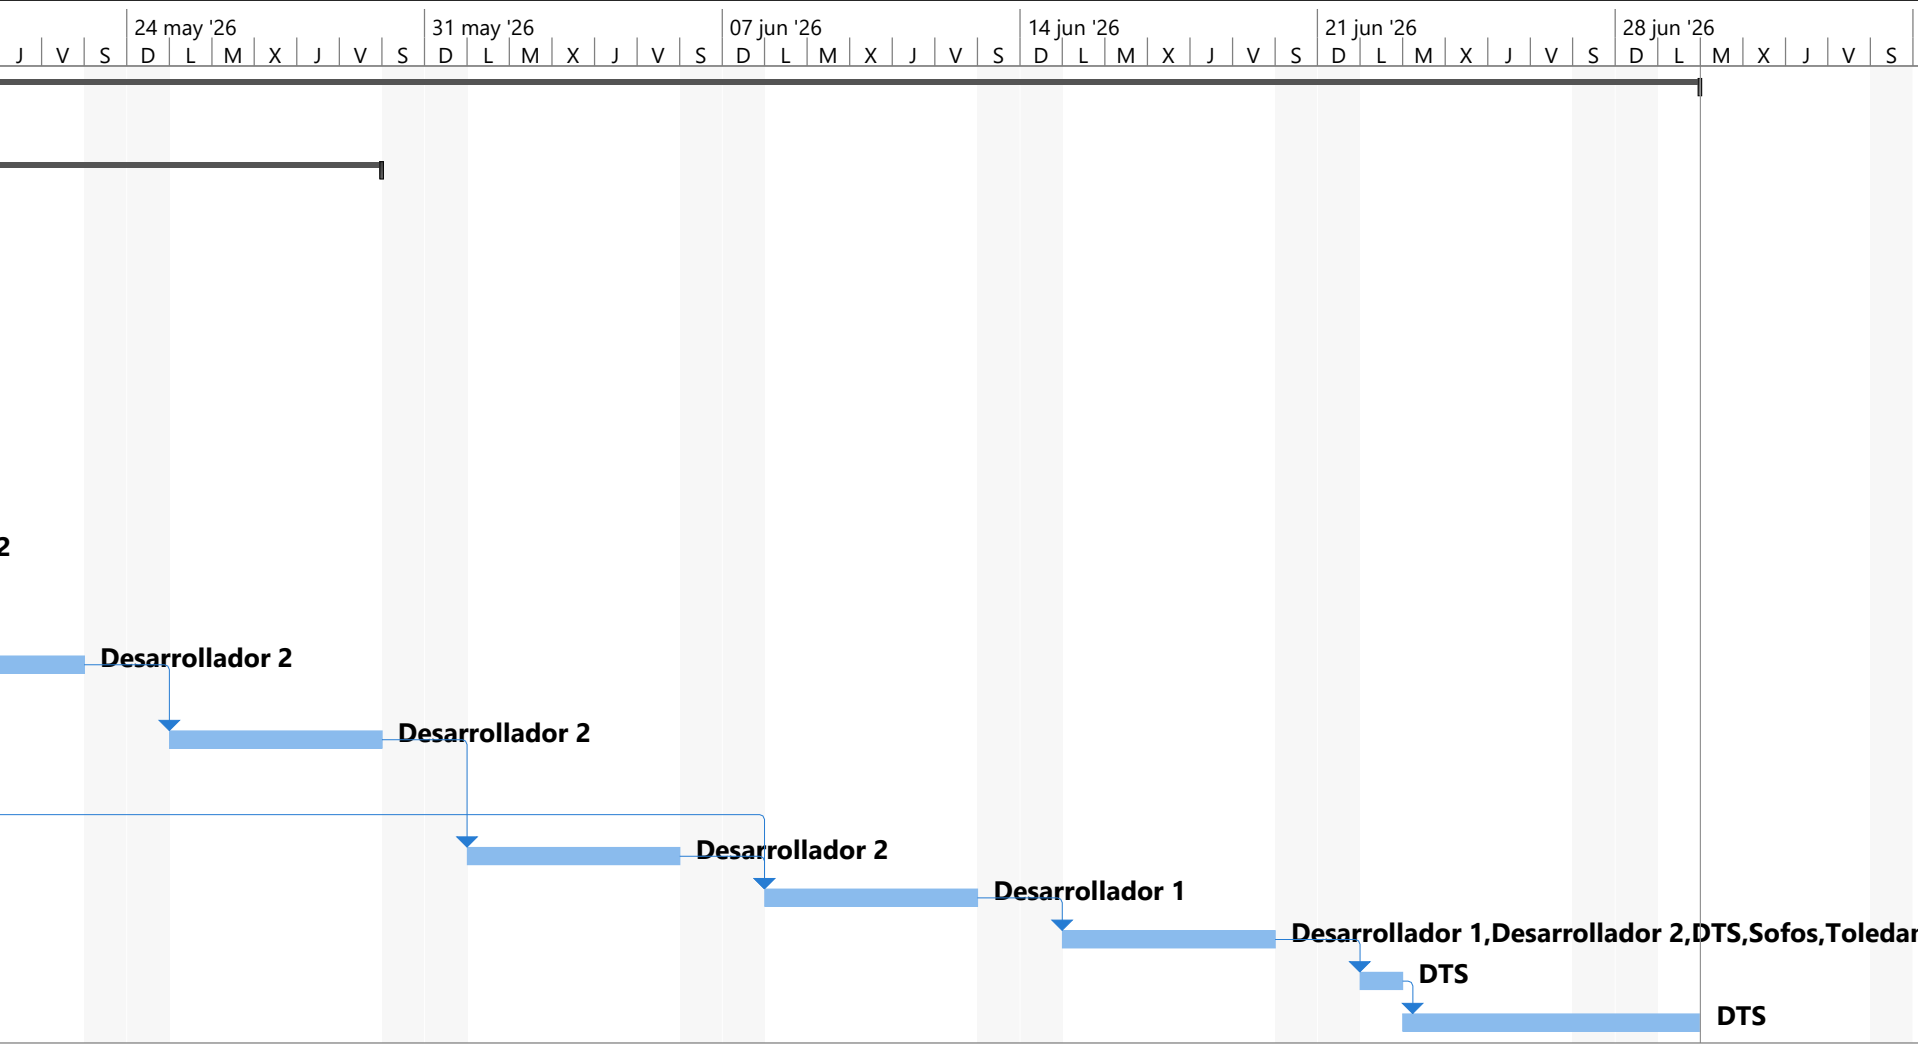

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: vie 12-12-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
