



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	M
1			Plan de trabajo rutas recolectoras	11 días	jue 21-08-25	jue 04-09-25			
2			Análisis y diseño	2 días	jue 21-08-25	vie 22-08-25			
3			BOF	4.5 días	lun 25-08-25	vie 29-08-25			
4			Agregar parámetro a nivel de ruta para definir si la ruta factura o no	4 horas	lun 25-08-25	lun 25-08-25	2		
5			Agregar validación para que el parámetro de ruta sin factura solo se muestre en rutas de autoventa	4 horas	lun 25-08-25	lun 25-08-25	4		
6			Modificar mantenimiento de la ruta	4 horas	mar 26-08-25	mar 26-08-25	5		
7			Modificar el proceso de liquidación en BOF para que permita liquidar la ruta sin facturas	3 días	mar 26-08-25	vie 29-08-25	6		
8			HH	4.5 días	lun 25-08-25	vie 29-08-25			
9			Agregar parámetro a nivel de ruta para definir si la ruta factura o no	1 hora	lun 25-08-25	lun 25-08-25	4		
10			Modificar carga de datos con nuevo parámetro	3 horas	lun 25-08-25	lun 25-08-25	9		
11			Agregar validación para no poder hacer notas de crédito a clientes de contado	4 horas	mar 26-08-25	mar 26-08-25	10		
12			Agregar validación para no cargar inventario en las rutas recolectoras	4 horas	mar 26-08-25	mar 26-08-25	11		


Proyecto: PDT_Toledano_Rutas_
Fecha: jue 21-08-25


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	M
13			Modificar el proceso de fin de día para que permita el cierre sin facturas en base al	3 días	mié 27-08-25	vie 29-08-25	12		
14			Pruebas integrales	3 días	lun 01-09-25	mié 03-09-25	13		
15			Publicación	1 día	jue 04-09-25	jue 04-09-25	14		

Proyecto: PDT_Toledano_Rutas_ Fecha: jue 21-08-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

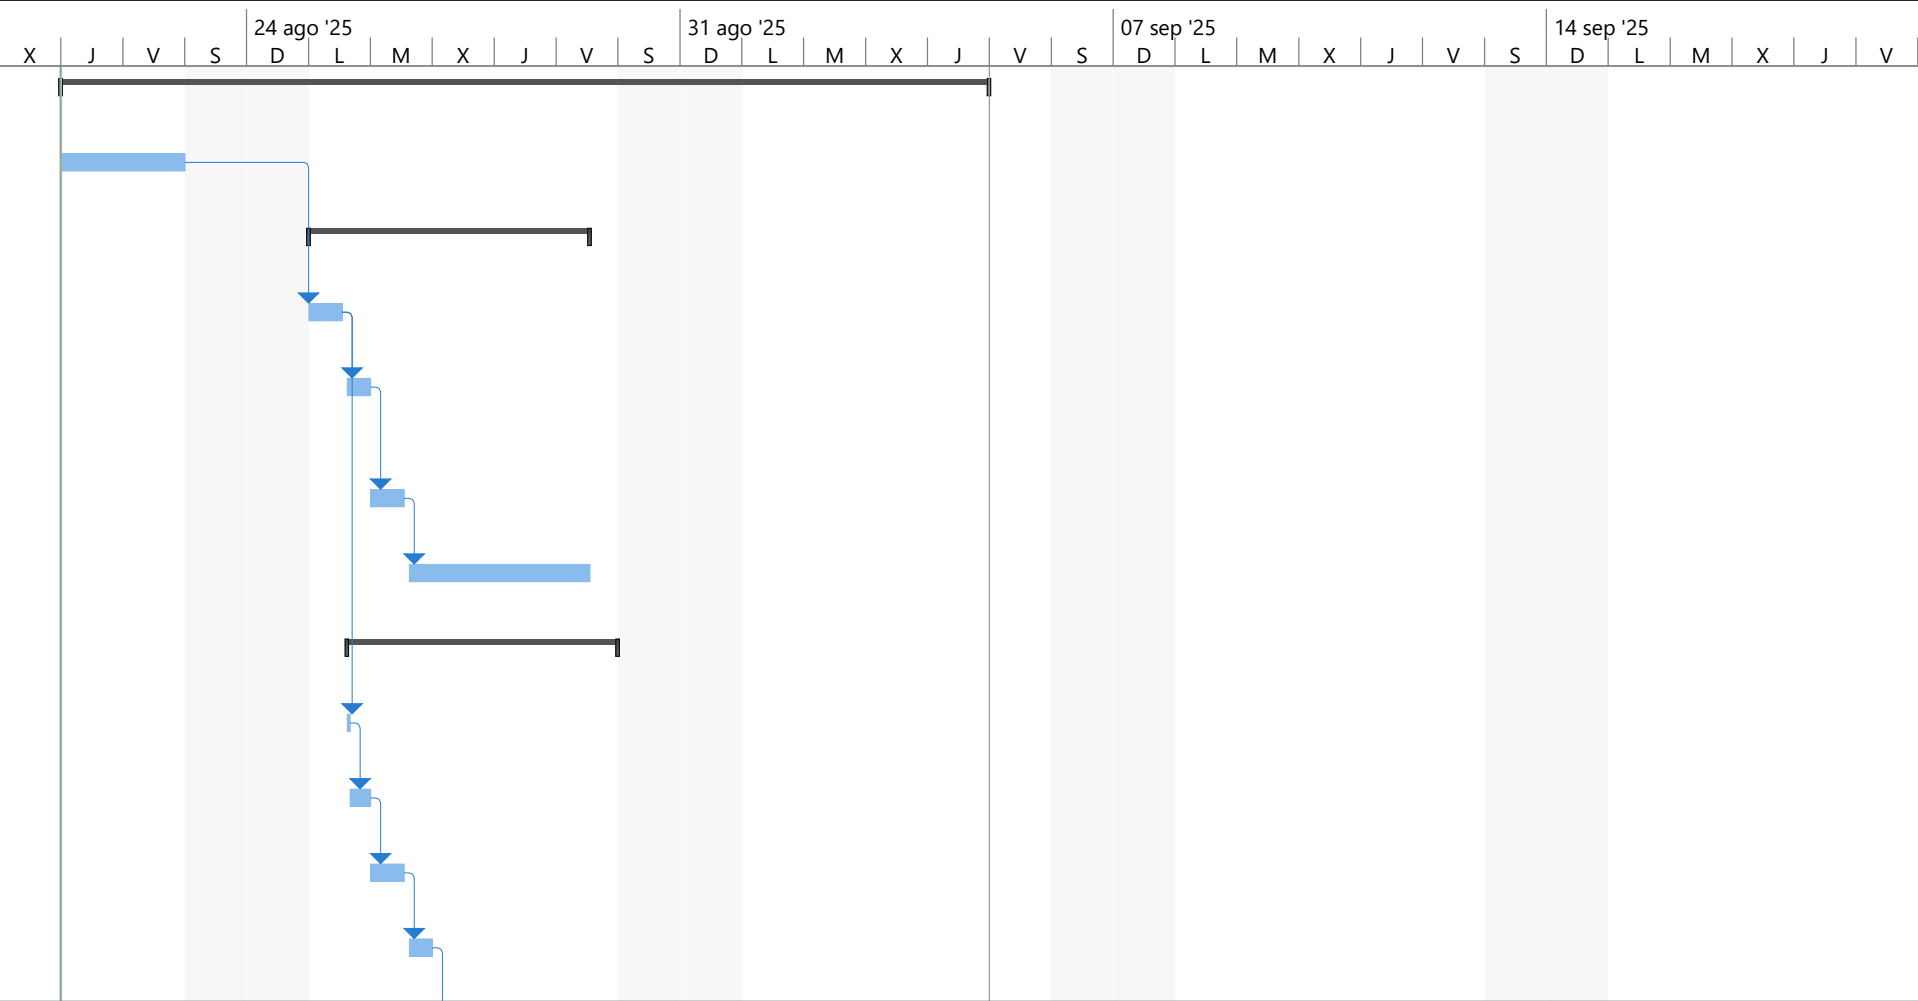

Proyecto: PDT_Toledano_Rutas_ Fecha: jue 21-08-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

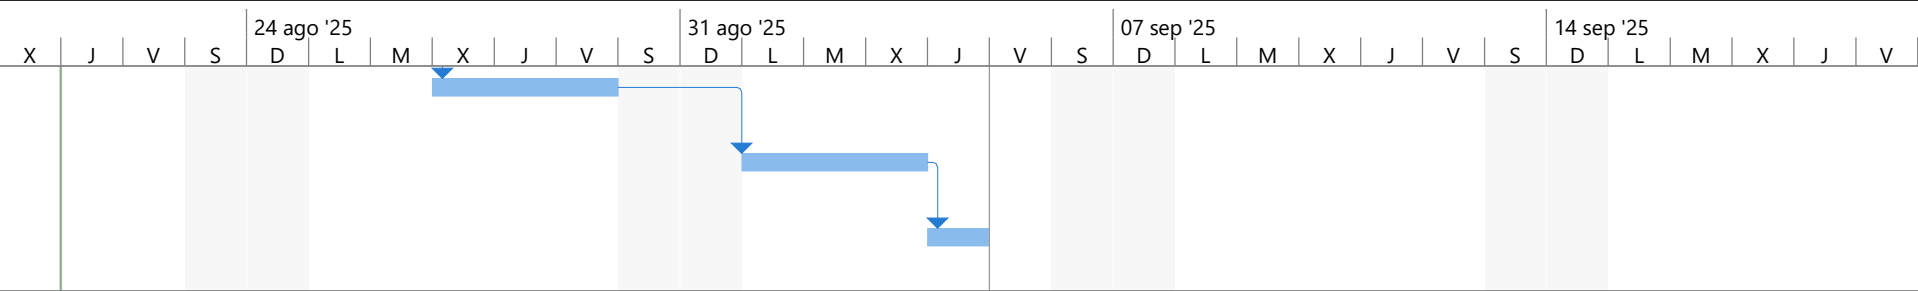

Proyecto: PDT_Toledano_Rutas_ Fecha: jue 21-08-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
